




รายงานความก้าวหน้า
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๖
ไตรมาสที่ ๑
(เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖)

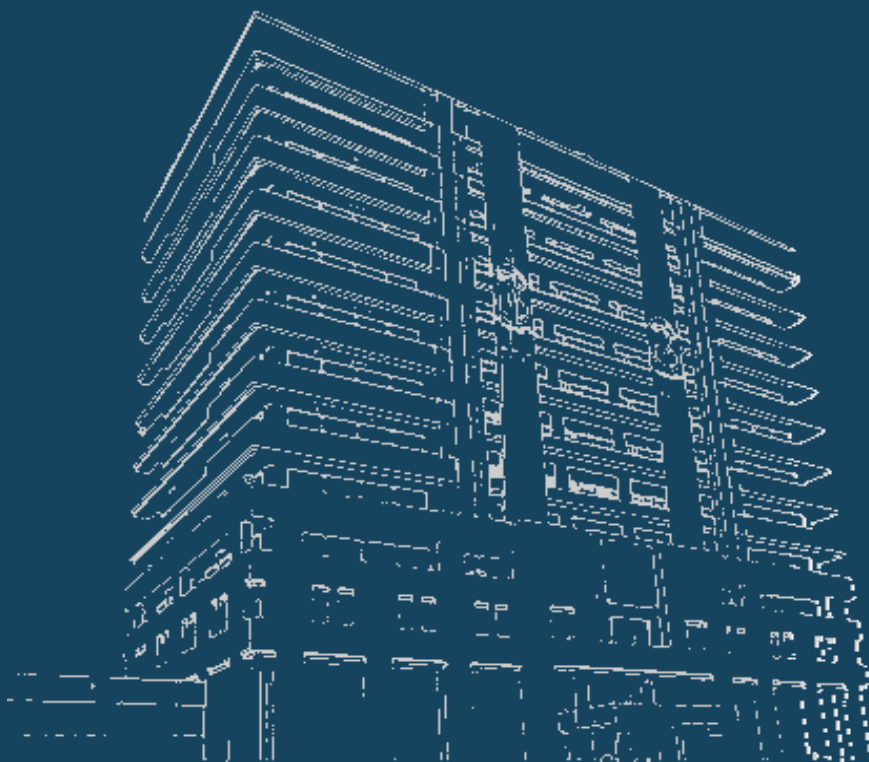

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)

รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๖


ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)

ไตรมาสที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖)

สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๖ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) ประจำปี ไตรมาสที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖) สรุปสาระสำคัญดังนี้

๑. แผนและผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการ ในภาพรวมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๖

แผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๖ กำหนดงบประมาณรายจ่ายรองรับจำนวนทั้งสิ้น ๖,๒๗๑.๒๕๐ ล้านบาท แบ่งเป็น งบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. จำนวน ๕,๑๖๓.๗๘๕ ล้านบาท^๑ รายจ่ายสำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) จำนวน ๙๗.๔๖๕ ล้านบาท และเงินจัดสรรเข้ากองทุนฯ จำนวน ๑,๐๑๐.๐๐๐ ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ ๑ ซึ่งสามารถจำแนกรายยุทธศาสตร์ โดยมีแผนงาน (งานประจำ) และโครงการสำคัญรองรับการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) ดังรายละเอียดปรากฏตามภาพที่ ๑ และแผนภูมิที่ ๑ - ๒

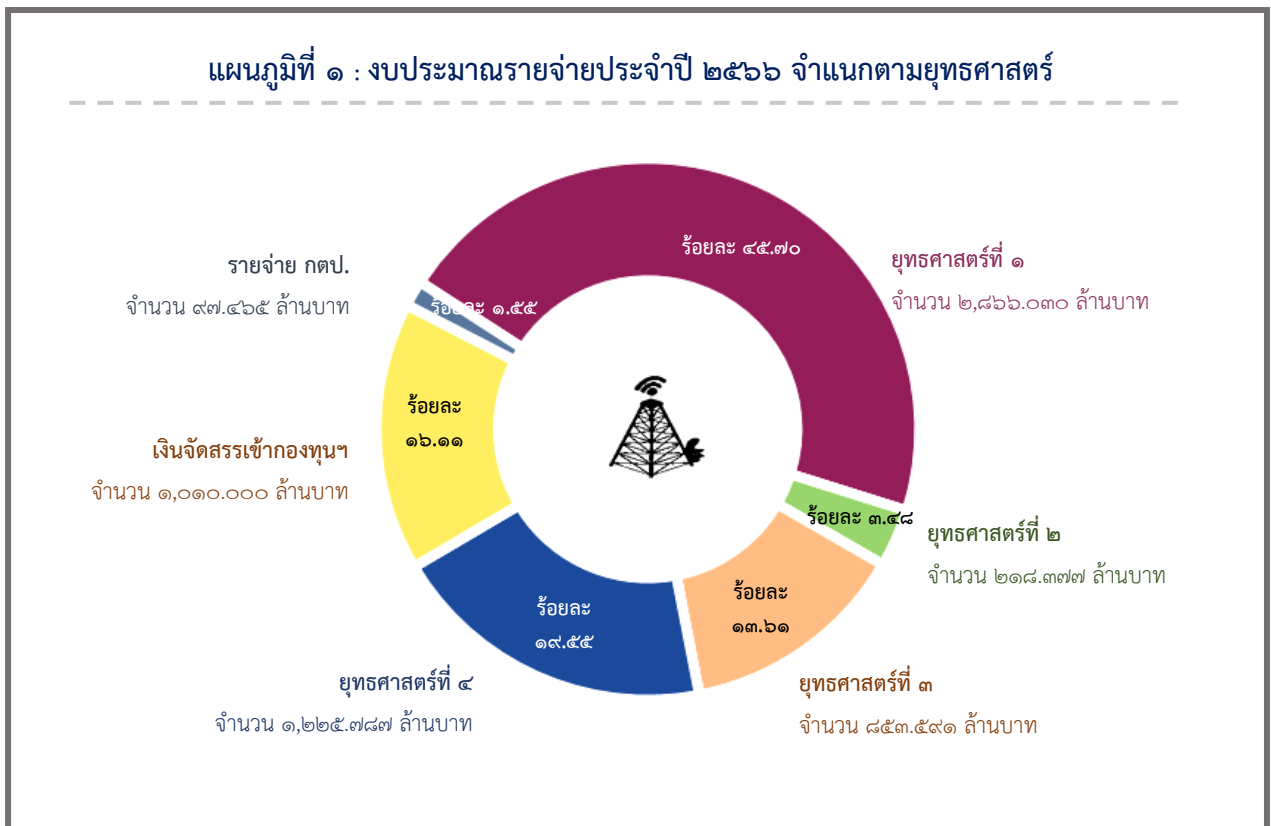


^๑ มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖ ตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ และปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยดำเนินการตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการงบประมาณของสำนักงาน กสทช.พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ภาพที่ ๑ : งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖ (จำแนกตามยุทธศาสตร์)

แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)



แผนภูมิที่ ๒ : แผนงาน/โครงการแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖)

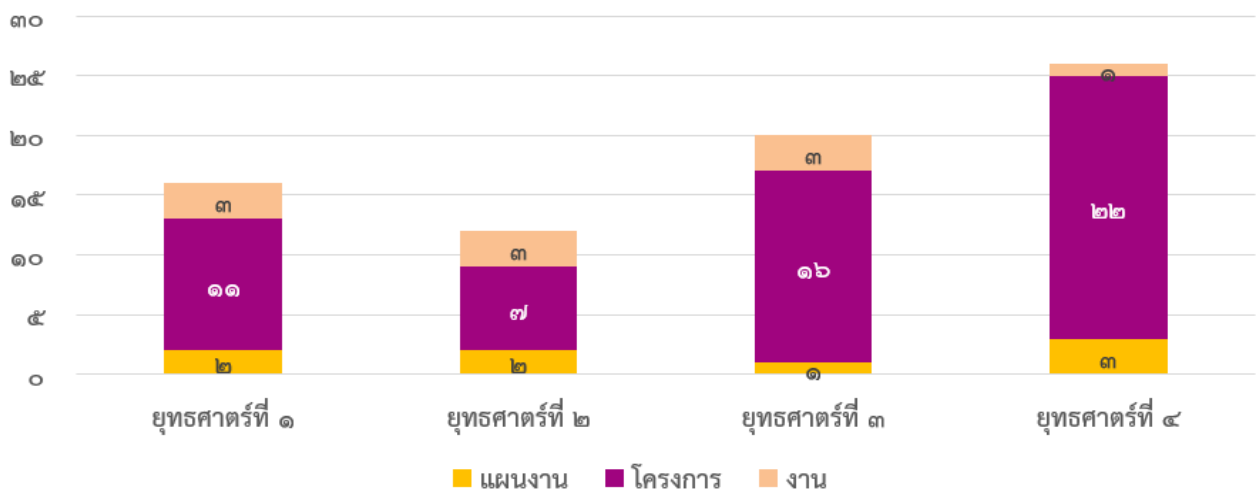


ณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖ มีผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๑ และแผนภูมิที่ ๓ - แผนภูมิที่ ๔ ดังนี้

ตารางที่ ๑ : ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๖
(ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖)


ยุทธศาสตร์	จำนวนแผนงาน/โครงการ/งานที่ติดตาม							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ
	แผนงาน (๑)	คิดเป็นร้อยละของแผนงานทั้งหมด	โครงการ (๒)	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	งาน (๓)	คิดเป็นร้อยละของงานทั้งหมด	รวมแผนงาน/โครงการ/งาน (๑)-(๓)					
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับการพัฒนาธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล	๒	๒๕.๐๐	๑๑	๑๙.๖๔	๓	๓๐.๐๐	๑๖	๐	๑๒	๔	๐	๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	๒	๒๕.๐๐	๗	๑๒.๕๐	๓	๓๐.๐๐	๑๒	๐	๘	๓	๐	๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาขีดความสามารถการบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน และยกระดับศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค เพื่อการกำกับดูแลและการบริการประชาชน	๑	๑๒.๕๐	๑๖	๒๘.๕๗	๓	๓๓.๓๓	๒๐	๑	๑๒	๗	๐	๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพในการกำกับดูแลและส่งเสริมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป	๓	๓๗.๕๐	๒๒	๓๙.๒๙	๑	๑๐.๐๐	๒๖	๐	๑๖	๙	๐	๑
รวมทั้งสิ้น	๘	๑๐๐.๐๐	๕๖	๑๐๐.๐๐	๑๐	๑๐๐	๗๔	๑	๔๘	๒๓	๐	๒

แผนภูมิที่ ๓ : ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖)

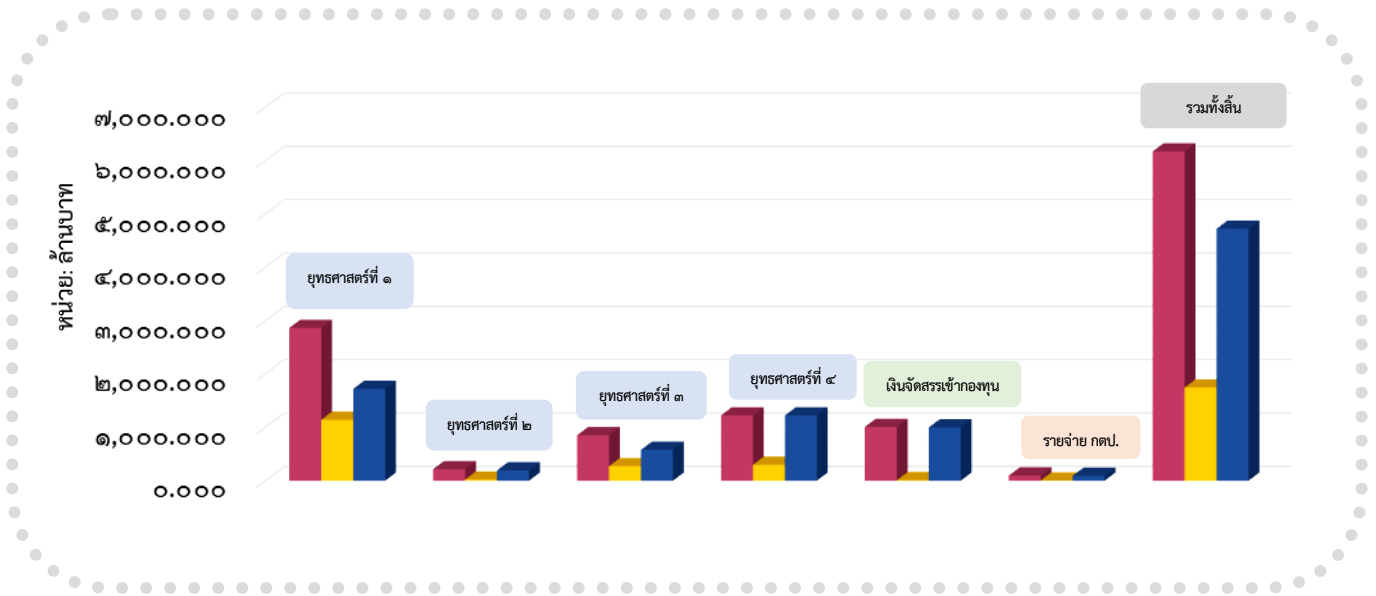

การใช้จ่ายงบประมาณ	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๔	เงินจัดสรรเข้ากองทุน	ใช้จ่าย กตป.	รวมทั้งสิ้น
งบประมาณที่ได้	๒,๘๖๖.๐๓๐	๒๑๘.๓๗๗	๘๕๓.๕๙๑	๑,๒๒๕.๗๘๗	๑,๐๑๐.๐๐๐	๙๗.๔๖๕	๖,๒๗๖.๒๕๐
ผลการใช้จ่าย	๑,๔๓๓.๕๔๓	๔๒.๐๘๙	๓๓๖.๒๕๖	๓๘๐.๕๓๙	๑๐.๐๐๐	๗.๑๘๖	๒,๒๐๙.๖๑๓
คงเหลือ	๑,๔๓๒.๔๘๗	๑๗๖.๒๘๘	๕๑๗.๓๓๕	๘๔๕.๒๔๘	๑,๐๐๐.๐๐๐	๙๐.๒๗๙	๔,๐๖๖.๖๓๗

แผนภูมิที่ ๔ : สถานะการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๖
ณ ไตรมาสที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖)

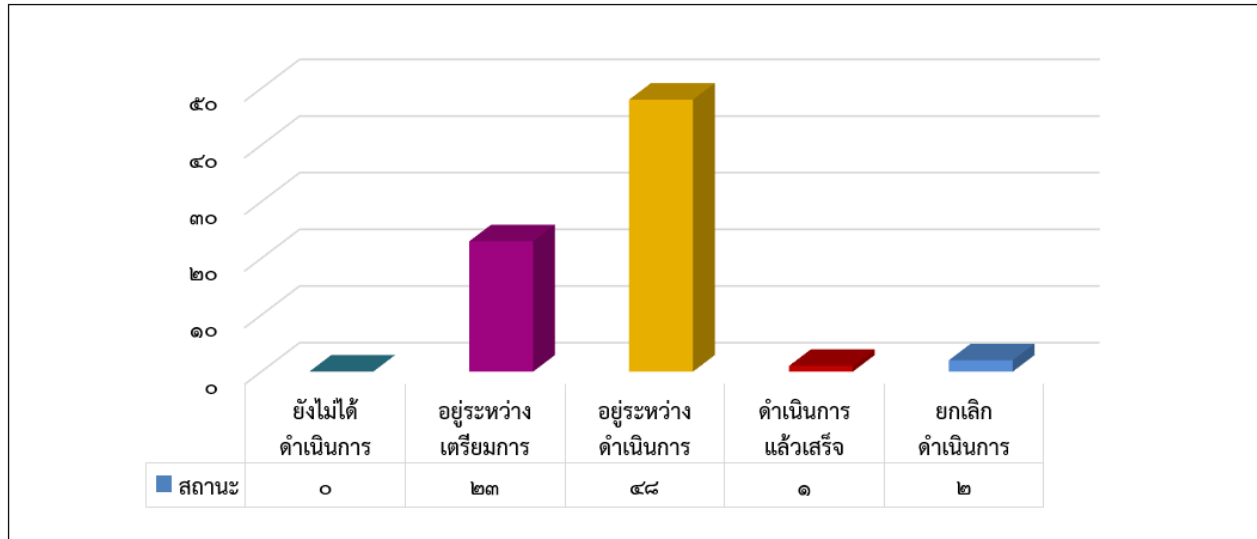

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖)

(๑) แผนงาน จำนวน ๘ แผนงาน ในภาพรวมสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด โดยสามารถเบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๔๔.๒๒

(๒) โครงการ จำนวน ๕๖ โครงการ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๘ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๓๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๓๖ อยู่ระหว่างเตรียมการ/กระบวนการทางพัสดุฯ จำนวน ๒๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๒๙ และยกเลิกโครงการ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๗

(๓) งาน/กิจกรรม จำนวน ๑๐ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๙ งาน/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ และอยู่ระหว่างเตรียมการ/กระบวนการทางพัสดุฯ จำนวน ๑ งาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐

๒. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ จำแนกตามยุทธศาสตร์

สำนักงาน กสทช. มีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ จำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับการพัฒนาธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล

มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๑๖ แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนกเป็น ๒ แผนงาน ๑๑ โครงการ ๓ งาน/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๘๖๖.๐๓๐ ล้านบาท เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนสำนักงาน กสทช. ให้เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลและสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน และก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ตลอดจนขับเคลื่อนแผนงานการบริหารองค์กร แผนงานการบริหารยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร โดยได้มีการดำเนินงานที่สำคัญ ๆ อาทิ

- ดำเนินการสนับสนุนการยกระดับธรรมาภิบาลของสำนักงาน กสทช. อย่างยั่งยืน เพื่อรักษาระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของสำนักงาน กสทช. ในระดับ AA ยกระดับธรรมาภิบาลของสำนักงาน กสทช. ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดการยอมรับและเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน โดยในปี ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการตามแผนที่กำหนด อาทิ ๑) ได้จัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้บุคลากรถือปฏิบัติ ๒) ได้จัดให้มีการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีแก่ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงาน และเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ซึ่งมีผู้แทนจาก สำนักงาน ป.ป.ช. และวิทยากรภายในสำนักงาน กสทช. มาร่วมบรรยายให้ความรู้แก่พนักงาน สำนักงาน กสทช. ๓) ได้นำเข้าข้อมูลจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงาน กสทช. ยังได้กำหนดให้หน่วยงานภายในสำนักงานฯ ให้ดำเนินการจัดทำข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ (OIT) บนเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ๔) ได้จัดทำประกาศ กสทช. เรื่อง ประมวลจริยธรรมของสำนักงาน กสทช. แล้วเสร็จ และนำเสนอต่อสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ต่อไป ๕) ได้นำส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการประเมินผลรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๖ และ ๗) ได้ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมไปสู่องค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization) เพื่อยกระดับกระบวนการประเมินผลการบริหารจัดการข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงาน กสทช. และพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่ดีของสำนักงาน กสทช. เพื่อไปสู่องค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เป็นต้น โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการส่งเสริมการยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางด้านธรรมาภิบาลตามแผน

- ดำเนินการสร้างการรับรู้และความเข้าใจของสาธารณะเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในภารกิจด้านการบริหารคลื่นความถี่และกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม และภารกิจอื่น ๆ แก่หน่วยงานภายในและภายนอกสำนักงาน กสทช. ผ่านการสื่อสารประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ภายในองค์กร จำนวน ๓ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ภายนอกองค์กร จำนวน ๒๕ เรื่อง และการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และดำเนินการสนับสนุนภารกิจการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร และเผยแพร่ข้อมูล การปฏิบัติงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนฯ

- ดำเนินการสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยได้ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการกองทุนวิจัยและพัฒนา อาทิ การดำเนินโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และบริหารจัดการการเงินและระบบติดตามงานของสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา รวมทั้งได้จัดทำแผนการจัดสรรทุนประเภทต่าง ๆ ประจำปีแล้วเสร็จ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา ตามแผน

- ดำเนินการพัฒนาระบบการทำงานของสำนักงาน กสทช. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการทำงานภายในสำนักงาน กสทช. ให้สามารถลดเวลาและขั้นตอนการดำเนินการ และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางด้านข้อมูล ยกระดับสำนักงาน กสทช. ก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ อาทิ ๑) การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศสำหรับการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One-Stop Service) ของสำนักงาน กสทช. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในส่วนงานบริการจัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรทุกประเภท ให้สามารถบริการข้อมูลแก่ประชาชนและบุคลากรภายในสำนักงาน กสทช. ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ๒) เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ สำนักงาน กสทช. ในระดับเครือข่ายจากผู้ไม่หวังดี ๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการการเข้าใช้งานแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On) ให้สามารถเข้าใช้งานระบบได้อย่างสะดวกและความปลอดภัยที่มากขึ้น ๔) การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบบริหารการเงินการบัญชี ระบบการจัดการรายได้ และระบบการบริหารสินทรัพย์และการพัสดุ ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

ณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖ มีภารกิจอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๑๒ แผนงาน/โครงการ/งาน และอยู่ระหว่างเตรียมการก่อนเข้าสู่กระบวนการทางพัสดุฯ จำนวน ๔ โครงการ โดยเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖๘๑.๗๗๙ ล้านบาท และสามารถก่องหนี่ผูกพันได้จำนวน ๗๕๑.๗๖๔ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๑,๔๓๓.๕๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๒ คงเหลือจำนวน ๑,๔๓๒.๕๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๙๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแล ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล

มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๑๒ แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนกเป็น ๒ แผนงาน ๗ โครงการ ๓ งาน/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณ ๒๑๘.๓๗๗ ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนแผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และแผนงานสร้างองค์ความรู้ของบุคลากรให้มีขีดความสามารถทางวิชาการ เพื่อรองรับการเป็นองค์กรชั้นนำในการกำกับดูแลที่มีความเป็นสากล ทั้งบุคลากรในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมและประชาชนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยได้ดำเนินงานสำคัญ ๆ อาทิ

- ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญตามภารกิจ มีความสามารถทางวิชาการ สามารถรองรับภารกิจต่าง ๆ และสามารถต่อยอดให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียมสื่อสาร อาทิ การดำเนินโครงการทุนการศึกษาให้แก่บุคลากรสำนักงาน กสทช. การสนับสนุนบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ในการจัดทำผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการฯ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับสายงานวิชาการ (Strategic Database System : SDS) เพื่อให้มีเครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูลด้านวิชาการที่จำเป็น สามารถเข้าถึงข้อมูลวิชาการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และพัฒนา

เว็บไซต์ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางวิชาการ กสทช. (NBTC Research Hub) สำหรับเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิจัย รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลด้านวิชาการ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นต่อการศึกษาเชิงวิชาการจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกสำนักงาน กสทช. ตลอดจน การพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และประชาชนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล อาทิ การจัดอบรมการใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ในการผลิตรายการโทรทัศน์ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย การจัดสัมมนาเรื่อง "สื่อสารอย่างไรให้สร้างสรรค์ และมีมาตรฐานในสื่อ" และการเตรียมการเพื่อจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมและอัตราค่าบริการโทรคมนาคม และการอบรมเรื่อง การวิเคราะห์การส่งผ่านต้นทุนส่วนเพิ่มไปสู่อัตราค่าบริการโทรคมนาคม เป็นต้น

- ดำเนินการสนับสนุนงานทางด้านวิชาการ การศึกษาและวิเคราะห์เศรษฐกิจ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายต่อระบบเศรษฐกิจ และเผยแพร่แก่ประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการศึกษาเพื่อจัดทำแบบจำลองดุลยภาพทั่วไป (Computable General Equilibrium Model) สำหรับการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงกว้าง (ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช. และ Victoria University ประเทศออสเตรเลีย) และการสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย

ณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖ มีภารกิจอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๘ แผนงาน/โครงการ/งาน และอยู่ระหว่างเตรียมการก่อนเข้าสู่กระบวนการทางพัสดุฯ จำนวน ๓ โครงการ/งาน และยกเลิกดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ โดยเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๘.๓๕๐ ล้านบาท และสามารถก่องหนี่ผูกพันได้จำนวน ๒๓.๗๓๙ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๔๒.๐๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๗ คงเหลือจำนวน ๑๗๖.๒๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๗๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาศักยภาพการบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน และยกระดับศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค เพื่อการกำกับดูแลและการบริการประชาชน

มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๒๐ แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนกเป็น ๑ แผนงาน ๑๖ โครงการ ๓ งาน/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณ ๘๕๓.๕๙๑ ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนภารกิจการบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียมของประเทศให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและแผนของชาติที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการบริหารคลื่นความถี่และกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค และเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและกำกับดูแลคลื่นความถี่ โดยได้มีการดำเนินงานที่สำคัญ ๆ อาทิ

- ดำเนินการสนับสนุนภารกิจบริหารคลื่นความถี่ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของชาติที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไป โดยอยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุมหารือกลุ่มย่อย (Focus group) เรื่อง การจัดทำ (ร่าง) ประกาศเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่ร่วมกันระหว่างกิจการดาวเทียม และกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) ย่านความถี่ 27.0 – 29.5 GHz และสนับสนุนการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ

- ดำเนินการสนับสนุนภารกิจบริหารกิจการดาวเทียม ในการสนับสนุนภารกิจด้านกิจการดาวเทียมสื่อสาร การบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน และเป็นไปตามข้อบังคับวิทยุของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ และพันธกรณีระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

- ดำเนินการยกระดับศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลและการบริการประชาชน ในด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการวิทยุคมนาคม โดยในปี ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการจัดหาเครื่องสแกนความถี่และค้นหาตำแหน่งสถานีส่งสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ แล้วเสร็จ ทำให้ สำนักงาน กสทช. ภาค สำนักงาน กสทช. เขต มีเครื่องสแกนความถี่และค้นหาตำแหน่งสถานีส่งสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบต้นแบบสำหรับการบริหารจัดการความถี่วิทยุและการตรวจสอบคลื่นความถี่ของศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่แห่งชาติ การจัดหาและพัฒนารถออกใบอนุญาตเคลื่อนที่ของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค การบูรณาการระบบตรวจสอบและควบคุมสถานีตรวจสอบความถี่ระยะไกล เพื่อพัฒนาปรับปรุงอุปกรณ์และระบบจัดเก็บบูรณาการระบบตรวจสอบและควบคุมสถานีตรวจสอบความถี่วิทยุระยะไกล และการบำรุงรักษาเครื่องมือ สถานีตรวจสอบ สามารถตรวจสอบเชิงป้องกันเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

ณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖ มีภารกิจที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน จำนวน ๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๑๒ แผนงาน/โครงการ/งาน และอยู่ระหว่างเตรียมการก่อนเข้าสู่กระบวนการทางพัสดุฯ จำนวน ๗ โครงการ โดยเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๔๔.๗๑๓ ล้านบาท และสามารถก่อกั้นผู้กักกันได้ จำนวน ๑๙๑.๕๔๓ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๓๓๖.๒๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๓๙ คงเหลือจำนวน ๕๑๗.๓๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๖๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาศักยภาพในการกำกับดูแลและส่งเสริมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๒๖ แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนก ๓ แผนงาน ๒๒ โครงการ ๑ งาน/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๒๒๕.๗๘๗ ล้านบาท เพื่อสนับสนุนภารกิจในการขับเคลื่อนแผนงานบริหารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมอย่างเสรีและเป็นธรรม ส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ รวมถึงคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยได้มีการดำเนินงานที่สำคัญ ๆ อาทิ

- ดำเนินการศึกษาแนวทางในการพัฒนาหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ไทยให้สอดคล้องกับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยได้ศึกษาหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ในปัจจุบันครอบคลุมทุกมิติที่สมควรปรับเปลี่ยน เพื่อให้ได้แนวทางในการกำกับดูแลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมและการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนรวบรวมความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ไทย

- ดำเนินการพัฒนาศักยภาพในการกำกับดูแลและส่งเสริมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม อาทิ การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อยกระดับข้อมูลของสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ไปสู่การเป็นสารสนเทศ (Information) ในรูปแบบ Data Visualization การติดตามประเมินผลงานในมิติเชิงสังคมโดยใช้ซีพีโมเดล (CIPP Model) สำหรับสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และติดตามประเมินผลโครงการในมิติทางสังคมฯ เสนอต่อระดับนโยบาย การปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพช่องทางติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนในด้านกิจการโทรคมนาคมร่วมกับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ให้สามารถดำเนินการเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง Web Portal ในการส่งเรื่องร้องเรียนพร้อมเอกสารหลักฐานที่

เกี่ยวข้อง รวมถึงการแจ้งเตือนผู้รับใบอนุญาตในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน และรายงานสถานะความคืบหน้าผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้สำนักงาน กสทช. ทราบ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด

- ดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

ณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖ มีภารกิจอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๑๖ แผนงาน/โครงการ อยู่ระหว่างเตรียมการก่อนเข้าสู่กระบวนการทางพัสดุฯ จำนวน ๙ โครงการ และยกเลิกดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ โดยเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๗๐.๗๕๓ ล้านบาท และสามารถก่องหนี่ผู้กพันได้ จำนวน ๒๐๙.๗๘๖ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๓๘๐.๕๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๔ คงเหลือจำนวน ๘๔๕.๒๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๙๖

๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการดำเนินงาน

๓.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบควรศึกษาและพิจารณาเกี่ยวกับการขอรับการจัดสรรงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้างก่อนขอรับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว และเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ควรบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ/งานตามยุทธศาสตร์และมีการใช้จ่ายงบประมาณหรือก่องหนี่ผู้กพันตั้งแต่ไตรมาสแรกของปีงบประมาณให้แล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

๓.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบควรให้ความสำคัญกับการกำกับ ติดตาม และบริหารงาน/โครงการให้เป็นไปตามแผนงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด โดยมีการกำหนดแนวทางในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ก่อนดำเนินโครงการ และมีการติดตามความก้าวหน้าระหว่างดำเนินโครงการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖ แล้วไม่สามารถก่องหนี่ผู้กพันได้เนื่องจากพบความเสี่ยงอันเกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรืออาจเกิดปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้การดำเนินงาน/โครงการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ ควรเร่งทบทวนและปรับแผนการดำเนินงานและแผนประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรไว้ไปใช้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และประโยชน์ที่ได้ภายหลังการดำเนินงาน/โครงการ โดยมีการถอดบทเรียนเพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงการดำเนินการต่อไป

สำนักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ
ส่วนวิชาการและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์

ภาคผนวก
ความก้าวหน้าของการดำเนินการฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับการพัฒนาธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	ร้อยละความก้าวหน้าในการดำเนินการฯ	หมายเหตุ
๑	แผนงานบริหารองค์กร	๔๗.๙๓	
๒	แผนงานบริหารยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร	๔๘.๐๓	
๓	งานสร้างการรับรู้และความเข้าใจของสาธารณะในการบริหารคลื่นความถี่และกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมและกิจการดาวเทียม	๔๕.๙๔	
๔	งานสนับสนุนการยกระดับธรรมาภิบาลของสำนักงาน กสทช. อย่างยั่งยืน	๓๑.๖๗	
๕	งานสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ	๓๗.๕๐	
๖	โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และบริหารจัดการการเงินและระบบติดตามงานของสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา	๐.๐๐	
๗	โครงการเตรียมความพร้อมไปสู่องค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization)	๕๐.๐๐	
๘	โครงการจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศสำหรับการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One-Stop Service) ของสำนักงาน กสทช.	๑๐.๐๐	
๙	โครงการป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ สำนักงาน กสทช. ในระดับเครือข่าย	๗๕.๐๐	
๑๐	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเข้าใช้งานแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On)	๙๐.๐๐	
๑๑	โครงการจ้างปรับปรุงระบบงาน ERP เพื่อรองรับการทำงานตามผังโครงสร้างองค์กรใหม่	๐.๐๐	
๑๒	โครงการจ้างปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและระบบ HRSS ของ สำนักงาน กสทช.	๐.๐๐	
๑๓	โครงการระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและระบบประกอบอาคาร อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่	๐.๐๐	
๑๔	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่	๘๗.๘๑	
๑๕	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจจับและติดตามความเคลื่อนไหวของครุภัณฑ์ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี RFID (ระยะที่ ๓)	๑๐.๐๐	
๑๖	โครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับผู้ใช้งานภายในสำนักงาน กสทช. (NBTC Employee Portal)	๕๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพให้มีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	ร้อยละความก้าวหน้าในการดำเนินการฯ	หมายเหตุ
๑	แผนงานบริหารสถาบันวิทยาการและการเสริมสร้างสำนักงาน กสทช. ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	๒๔.๕๘	
๒	แผนงานสร้างองค์ความรู้ของบุคลากรให้มีขีดความสามารถทางวิชาการ เพื่อรองรับการเป็นองค์กรชั้นนำในการกำกับดูแลที่มีความเป็นสากล	๒๓.๗๒	
๓	งานพัฒนาศักยภาพให้มีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	๒๔.๐๐	
๔	งานพัฒนาศักยภาพในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และประชาชนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	๗.๕๑	
๕	งานพัฒนาศักยภาพในกิจการโทรคมนาคมและประชาชน ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	๐.๐๐	
๖	โครงการพัฒนาระบบฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ของสำนักงาน กสทช.	-	ยกเลิกดำเนินการ
๗	โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ สำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๕	๖๐.๐๐	
๘	โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ สำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๖	๑๐.๐๐	
๙	โครงการระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์แบบสื่อสารหลากหลายช่องทาง Omni-Channel Contact Center	๕๐.๐๐	
๑๐	โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแบบจำลองดุลยภาพทั่วไป (Computable General Equilibrium Model) สำหรับการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงกว้าง (ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช. และ Victoria University ประเทศออสเตรเลีย)	๐.๐๐	
๑๑	โครงการจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับสายงานวิชาการ (Strategic Database System : SDS)	๐.๐๐	
๑๒	โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย	๑๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาขีดความสามารถการบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน และยกระดับศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค เพื่อการกำกับดูแลและบริการ

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	ร้อยละความก้าวหน้าในการดำเนินการฯ	หมายเหตุ
๑	แผนงานบริหารคลื่นความถี่ กำกับดูแลกิจการดาวเทียมและบริหารกิจการส่วนภูมิภาค	๔๒.๕๗	
๒	งานขับเคลื่อนภารกิจการบริหารคลื่นความถี่ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของชาติที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไป	๔๐.๐๐	
๓	งานขับเคลื่อนภารกิจกำกับดูแลกิจการดาวเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน	๑๖.๐๐	
๔	งานการประชุมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการบริหารคลื่นความถี่และกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม	๓๐.๐๐	
๕	โครงการจัดหาและพัฒนาเรือออกใบอนุญาตเคลื่อนที่ของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค จำนวน ๑ คัน	๖๐.๐๐	
๖	โครงการจัดเก็บและบูรณาการระบบตรวจสอบและควบคุมสถานีตรวจสอบความถี่ระยะไกล	๗๕.๐๐	
๗	โครงการจัดหาเครื่องสแกนความถี่และค้นหาตำแหน่งสถานีส่งสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๔ ชุด	๑๐๐.๐๐	
๘	โครงการพัฒนาระบบต้นแบบสำหรับการบริหารจัดการความถี่วิทยุและการตรวจสอบคลื่นความถี่ของศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่แห่งชาติ	๕๐.๐๐	
๙	โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์และถอดเสียงการออกอากาศวิทยุกระจายเสียง	๕๐.๐๐	
๑๐	โครงการจัดหาชุดสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกลจำนวน ๕ สถานี	๐.๐๐	
๑๑	โครงการจัดหาเครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นความถี่วิทยุ ชนิด Realtime Bandwidth แบบสเปซไทม์ ย่านความถี่ 10 MHz - 42 GHz จำนวน ๒๒ ชุด	๐.๐๐	
๑๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามและรายงานการตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้ความถี่ด้วยเทคโนโลยี Video Streaming	๐.๐๐	
๑๓	โครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๔๘ ชุด	๐.๐๐	
๑๔	โครงการเครื่องมือตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุในการตรวจสอบข่าวยสื่อสารการจัดงานพระราชพิธีของสำนักงาน กสทช. ภาค ๑ จำนวน ๕ สถานี	๒๐.๐๐	
๑๕	โครงการจัดทำต้นแบบศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่ของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค	๒๐.๐๐	
๑๖	โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ พร้อมอาคารประกอบ	๐.๐๐	
๑๗	โครงการบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒	๐.๐๐	
๑๘	โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒	๐.๐๐	
๑๙	โครงการก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรมพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงาน กสทช. เขต ๓๔	๑๐.๐๐	
๒๐	โครงการสถานีเฝ้าระวังการแพร่กระจายคลื่นเพื่อการกำกับดูแลของสำนักงาน กสทช. ภาค ๔	๓๕.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาศักยภาพในการกำกับดูแลและส่งเสริมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	ร้อยละความก้าวหน้าในการดำเนินการฯ	หมายเหตุ
๑	แผนงานบริหารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	๒๖.๖๗	
๒	แผนงานบริหารกิจการโทรคมนาคม	๓๙.๔๑	
๓	แผนงานสนับสนุนภารกิจกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียมสื่อสาร	๑๐.๐๐	
๔	งานสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เพื่อดำเนินการเกี่ยวเนื่องทางด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ โทรคมนาคม หรือด้านวิทยุคมนาคมที่จัดขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสาธารณกุศล	๒๕.๗๐	
๕	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์	๘๐.๐๐	
๖	โครงการศึกษาแนวทางในการพัฒนาหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ไทยให้สอดคล้องกับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป	๗๕.๐๐	
๗	โครงการติดตามประเมินผลงานในมิติเชิงสังคมโดยใช้ซีบีโมเดล (CIPP Model) สำหรับสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	๘๕.๐๐	
๘	โครงการจ้างพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อยกระดับข้อมูลในรูปแบบ Data Visualization สำหรับสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	๐.๐๐	
๙	โครงการปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอดสดและรายงานข่าวการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมที่สำคัญของประเทศไทย	๕๐.๐๐	
๑๐	โครงการพัฒนาระบบรองรับการเปลี่ยนผ่านการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	๗๕.๐๐	
๑๑	โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และตรวจสอบเนื้อหารายการ	๐.๐๐	
๑๒	โครงการความร่วมมือการผลิตข่าวในพระราชสำนัก และการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธี และรัฐพิธี สำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	๑๐.๐๐	
๑๓	โครงการสำรวจพฤติกรรมและวิเคราะห์ข้อมูลความนิยมของผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย	๐.๐๐	
๑๔	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการตรวจมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง	๐.๐๐	
๑๕	โครงการระบบตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายจากการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ระดับภูมิภาค ระยะที่ ๒	-	ยกเลิกดำเนินการ
๑๖	โครงการจ้างพัฒนาฐานข้อมูลกิจการโทรคมนาคม และระบบรายงานเชิงวิเคราะห์เพื่อการบริหารงานข้อมูลกิจการโทรคมนาคม	๑๐.๐๐	
๑๗	โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยออนไลน์ แอปพลิเคชัน (ปีที่ ๓)	๒๕.๐๐	
๑๘	โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	๐.๐๐	
๑๙	โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการแก้ไขสายสื่อสารเพื่อความปลอดภัยของประชาชน (p-safe)	๐.๐๐	

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	ร้อยละ ความก้าวหน้า ในการดำเนินการฯ	หมายเหตุ
๒๐	โครงการพัฒนาระบบการตรวจค้นและจับกุมตามกฎหมาย	๕๐.๐๐	
๒๑	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลบริการ ค้าส่งในกิจการโทรคมนาคม (Telecom Wholesale Roadmap)	๐.๐๐	
๒๒	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดย ทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม	๑๐.๐๐	
๒๓	โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อภาพยนตร์โฆษณาภารกิจภายใต้แผนการจัดให้มี บริการ USO ประจำปี ๒๕๖๖	๐.๐๐	
๒๔	โครงการปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพช่องทางติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ในด้านกิจการโทรคมนาคมร่วมกับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม	๐.๐๐	
๒๕	โครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ Any Registration	๔๐.๐๐	
๒๖	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม	๖๐.๐๐	

รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของการดำเนิน โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/ กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
๑	แผนงานบริหารองค์กร	บก.	๖๘๗.๕๑๘	๖๘๗.๕๑๘	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลของ สำนักงาน กสทช. อย่างยั่งยืน			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานบริหารองค์กร	๔๗.๙๓	✓		ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	-
๑	แผนงานบริหารยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร	ยก.	๑,๕๒๒.๑๐๒	๑,๕๒๒.๑๐๒	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาสำนักงาน กสทช. ให้เป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็ม รูปแบบ และยกระดับ กระบวนการทำงานและการ ให้บริการ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกและ ให้บริการแก่ประชาชน			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานบริหารยุทธศาสตร์ และกิจการองค์กร	๔๘.๐๓	✓		ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	-
๑	งานสร้างการรับรู้และความเข้าใจของ สาธารณะในการบริหารคลื่นความถี่และ กำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมและกิจการ ดาวเทียม	สบ.	๑๓๔.๒๘๖	๑๓๔.๒๘๖	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อสร้างการรับรู้และความ เข้าใจในภารกิจด้านการบริหาร คลื่นความถี่และกำกับดูแล กิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม และ ภารกิจอื่นๆแก่หน่วยงาน ภายในและภายนอกสำนักงาน กสทช. ผ่านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ ถูกต้องและเป็นไปในทิศทาง เดียวกัน			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการสร้างการรับรู้และความเข้าใจของ สาธารณะในภารกิจด้านการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์ สาธารณะ ตามแผนที่กำหนด ดังนี้ ๑. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ภายใน องค์กร จำนวน ๓ เรื่อง ๒. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ ภายนอกองค์กร จำนวน ๒๕ เรื่อง ๓. ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อ เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และดำเนินการสนับสนุนภารกิจการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร และเผยแพร่ข้อมูล การปฏิบัติงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช.	๔๕.๙๔	✓		๑. จำนวนแผนการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย ประจำปี ๒๕๖๖ ๑ แผน ๒. ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ๔. ร้อยละจำนวนเนื้อหาที่ สร้างการรับรู้ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	-	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของการดำเนิน โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/ กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนที่ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่ กำหนด			
๑	งานสนับสนุนการยกระดับธรรมาภิบาลของ สำนักงาน กสทช. อย่างยั่งยืน ๑. กิจกรรมส่งเสริมการยกระดับองค์กรสู่ ความเป็นเลิศทางด้านธรรมาภิบาล ๒. กิจกรรมการประเมิน ITA ของสำนักงาน กสทช. ๓. การสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการ ตรวจสอบภายใน	ตบ.	๖.๗๖๓	๖.๗๖๓	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อรักษาระดับผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงาน (ITA) ของ สำนักงาน กสทช. ในระดับ AA ในปี ๒๕๖๖ พร้อมทั้งยกระดับ ธรรมาภิบาลของสำนักงาน กสทช. ให้เป็นส่วนหนึ่งของ วัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืน โดยบุคลากรทุกระดับถือเป็น ส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน และพัฒนาการดำเนินงานด้าน คุณธรรมและความโปร่งใสของ สำนักงาน กสทช. ให้เกิดการ ยอมรับและเป็นที่ยอมรับต่อ สาธารณะ			✓			อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ดังนี้ ๑. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการยกระดับองค์กรสู่ความเป็น เลิศทางด้านธรรมาภิบาล ได้แก่ (๑) กิจกรรมการประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยสำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการนำส่งผลงานเข้า ประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๖ ปัจจุบันอยู่ใน ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ ประเมินผลงานรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๖ (๒) กิจกรรมการจัดทำประมวลจริยธรรม ของสำนักงาน กสทช. โดยได้จัดทำประกาศ กสทช. เรื่อง ประมวล จริยธรรมของสำนักงาน กสทช. แล้วเสร็จ และนำเสนอ ต่อสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนำลงประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ต่อไป โดยคาดว่าจะ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๖ ๒. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงาน กสทช. โดย สำนักงาน กสทช. ได้อนุมัติกรอบแนว ทางการดำเนินงานและหน่วยงานที่รับผิดชอบได้แจ้งให้ ทุกสำนักทราบดีและถือปฏิบัติ โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้ (๑) ได้จัดให้มีการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียภายใน (IT) โดยวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. และ วิทยากรภายในสำนักงาน กสทช. แล้วเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ สำนักงาน กสทช. โดยมีการวัดผลตามแบบประเมิน IT ด้วย และได้มีการนำเข้าสู่ข้อมูลจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วน เสียภายในเพื่อเตรียมการเข้าประเมินผ่านระบบ ITAS ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (๒) ได้จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจในการ ดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ และได้มีการนำเข้าสู่ข้อมูลจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วน เสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (๓) ได้กำหนดให้หน่วยงานภายในสำนักงาน กสทช. ดำเนินการจัดทำข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ (OIT) ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน บนเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ๓. การสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน ดังนี้ (๑) สนับสนุนงานฝ่ายเลขานุการและจัดการประชุม ให้กับคณะกรรมการตรวจสอบภายใน โดยมีการจัด ประชุมแล้วเสร็จ จำนวน ๓ ครั้ง (๒) สนับสนุนข้อมูลการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของสำนักงาน กสทช. จาก หน่วยงานรับตรวจ ได้แก่ สำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา (ทบ.) สำนักการคลัง (สย.) สำนักการพัสดุและบริหาร ทรัพย์สิน (ทย.) และสำนักยุทธศาสตร์และ การงบประมาณ (ยย.) และสำนักต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (๓) ดำเนินการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การ บัญชี และการพัสดุ ของสำนักงาน กสทช. และสอบทาน การดำเนินงานและประเมินผลการใช้จ่ายเงินโครงการ	๓๑.๖๗	✓	๑. ร้อยละผลคะแนนการ ประเมิน ITA ประจำปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ๒. จำนวนพนักงานที่ได้รับ รางวัล "the best of NBTC" ของแต่ละสายงาน ๖ คน ๓. จำนวนผลงานส่งเข้า ประกวดรางวัลเลิศรัฐ ๑ งาน ๔. จำนวนหลักสูตรส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรมของ สำนักงาน กสทช. ๕. จำนวนครั้งในการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ๑๒ ครั้ง ๖. จำนวนรายงานผลการ ตรวจสอบภายใน ๒ ฉบับ	๑. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และภายนอก มีความรู้ความ เข้าใจและการรับรู้ในตรงตาม เจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ ของการประเมิน ITA ซึ่งการ ประเมิน ITA เป็นเครื่องมือใน การพัฒนาและปรับปรุงการ ดำเนินงานของหน่วยงาน และ สามารถนำไปใช้ในการป้องกัน การทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การ ยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานที่ เพิ่มขึ้น โดยได้มีการเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจในประเด็น ว่าการประเมินมีใช้การจับผิด หรือตรวจสอบ แต่เพื่อให้ได้ ข้อมูลที่จะนำไปสู่การสร้างความ ร่วมมือและพัฒนา ปรับปรุงการทำงานที่เป็นระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และให้มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น ๒. ระยะเวลาการประเมิน ITA ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดนั้นเป็นไปตามปีปฏิทิน งบประมาณของราชการ (ค.ค.-ก.ย. ปีถัดไป) ซึ่งไม่ สอดคล้องกับปีปฏิทิน งบประมาณของสำนักงาน กสทช. มีผลกระทบต่อ แผนการดำเนินงานประจำปี และรายงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน กสทช. จึงต้อง วางแผนงานที่กระชับและปรับ รูปแบบรายงานให้สอดคล้อง กับหลักเกณฑ์เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของการประเมิน ITA	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของการดำเนิน โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/ กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
๑	งานสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหาร กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ	ทบ.	๑๖.๑๖๐	๑๖.๑๖๐	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ในการบริหารงาน และการจัดสรรเงินกองทุนตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนการกำหนดระเบียบต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางและกลไกการบริหารจัดการกองทุนวิจัยและพัฒนาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ ดังนี้ ๑. ได้จัดทำแผนการจัดสรรทุนประเภทต่างๆ จากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ประจำปี ๒๕๖๖ แล้วเสร็จ โดยที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ โดยเห็นชอบการกำหนดกรอบเงินการจัดสรรเงินจากกองทุน ประจำปี ๒๕๖๖ รวมทั้งได้ดำเนินการเผยแพร่แผนการดำเนินงานดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ https://btfp.nbt.go.th/Laws เรียบร้อยแล้ว ๒. ได้ติดตามผลของการนำผลการให้ทุนไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบายวิชาการเชิงการพัฒนาลังคม ชุมชน และเชิงเศรษฐกิจ/พาณิชย์ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลผลการให้ทุนไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบายวิชาการเชิงการ พัฒนาลังคม ชุมชน และเชิงเศรษฐกิจ/พาณิชย์ ๓. ได้ดำเนินการฝ่ายเลขานุการในการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะและคณะกรรมการที่อยู่ภายใต้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ รวมทั้งสิ้น ๘ คณะ โดย ณ ไตรมาสที่ ๑ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา จำนวน ๓ ครั้ง คณะอนุกรรมการลั่นกรองโครงการและงบประมาณที่ใช้จ่ายจากเงินกองทุนวิจัยและฯ (ชุดที่ ๒) จำนวน ๓ ครั้ง คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์กองทุนวิจัยและพัฒนา จำนวน ๑ ครั้ง คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนวิจัยและพัฒนา จำนวน ๓ ครั้ง และ คณะอนุกรรมการลั่นกรองงานของ กสทช. เกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนา จำนวน ๕ ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กำหนด ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดแผนการประเมินความพึงพอใจคณะกรรมการบริหารกองทุน และคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว ปีละ ๒ ครั้ง โดยกำหนดการประเมินผล ทุก ๖ เดือน	๓๗.๕๐	✓		๑. จำนวนนโยบายและแผนการจัดสรรกองทุนประเภทต่างๆ จากกองทุนวิจัยและพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๖ ๑ แผน ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ๓. ร้อยละความพึงพอใจของคณะกรรมการบริหารกองทุน และคณะอนุกรรมการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	-
๑	โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และบริหารจัดการการเงินและระบบติดตามงานของสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา	ทบ.	๒๓.๑๗๘	๔.๒๗๑	ปี ๒๕๖๗ (๑๓.๙๐๗)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการกองทุนวิจัยและพัฒนา สำนักงน กสทช.		✓			อยู่ระหว่างการประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และบริหารจัดการการเงิน และระบบติดตามงาน โดยมีกำหนดการยื่นข้อเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	-	
๑	โครงการเตรียมความพร้อมไปสู่องค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization)	บป.	๑๐.๔๓๔	๔.๖๑๖	ปี ๒๕๖๕ (๕.๘๑๘)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อยกระดับกระบวนการประเมินผลการบริหารจัดการข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงาน กสทช. และพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่ดีของสำนักงาน กสทช. เพื่อไปสู่องค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูล			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ได้แก่ งานพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานทางด้านธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Government) ของสำนักงาน กสทช. และศึกษา วิเคราะห์ การปรับปรุงกระบวนการบริหารและจัดการข้อมูลตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงาน กสทช.	๕๐.๐๐	✓		๑. จำนวนรายงานผลการศึกษา ๑ ฉบับ ๒. จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐	-	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของการดำเนิน โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/ กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
๑	โครงการจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศสำหรับการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One-Stop Service) ของสำนักงาน กสทช.	นบ.	๔.๔๗๒	๔.๔๗๒	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศสำหรับการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One-Stop Service) ของสำนักงาน กสทช. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในส่วนงานบริการจัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรทุกประเภท ในกิจการวิทยุคมนาคมให้สามารถบริการข้อมูลแก่ประชาชนและบุคลากรภายในสำนักงาน กสทช. ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ			✓			ได้รับอนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ ตามลำดับ และได้ดำเนินการจัดจ้างฯ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้วเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ และได้ลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖	๑๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบฯ (ระบบย่อย) ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	-
๑	โครงการป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ สำนักงาน กสทช. ในระดับเครือข่าย	นบ.	๑๗.๘๒๗	๔.๓๔๙	ปี ๒๕๖๓ (๒.๘๒๗) ปี ๒๕๖๔ (๔.๖๐๑) ปี ๒๕๖๕ (๖.๐๐๐)	ม.ค.-๖๓	ธ.ค.-๖๖	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ สำนักงาน กสทช. ในระดับเครือข่ายจากผู้ไม่หวังดี			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการตามขอบเขตของงานที่กำหนด ได้แก่ การจัดทำรายงานการให้บริการป้องกัน Website จากการโจมตีในระดับเครือข่าย (รายงวดเดือน) (ตามระยะเวลาในการดำเนินการทั้งสิ้น ๓๔ เดือน/งวด) โดยได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๒๔ ประจำเดือนกุมภาพันธ์แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจรับงานประจำงวดรายเดือนต่อไป	๗๕.๐๐	✓		๑. ร้อยละของการป้องกันระบบจากการโจมตีฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐	-	-	
๑	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเข้าใช้งานแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On)	นบ.	๓๓.๗๗๖	๑๑.๗๘๗	ปี ๒๕๖๕ (๒๑.๘๘๙)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการการเข้าใช้งานแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On) สำหรับเข้าใช้งานระบบงานภายในของสำนักงาน กสทช. ให้สามารถเข้าใช้งานระบบงานผ่านการ log-in เข้าสู่ระบบเพียงครั้งเดียว และระบบยืนยันตัวตน ๒ ชั้น ด้วยตัวเลข หรือ QR-Code (Username-Password และ OTP/QR Code Scan) โดยได้รับความสะดวกและความปลอดภัยที่มากขึ้น			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ตรวจรับงานงวดที่ ๒ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วยรายงานการศึกษา สักรวจ และวิเคราะห์ความต้องการของสำนักงาน กสทช. และจัดทำแผนการฝึกอบรมฯ ฯลฯ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามขอบเขตของงานประจำงวดที่ ๓ ในการพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์ ติดตั้งระบบที่ดำเนินการพัฒนาลงในระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนของสำนักงาน กสทช. และจัดฝึกอบรมการเข้าใช้งานและฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบฯ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องโดยละเอียด	๕๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐	-	-	
๑	โครงการจ้างปรับปรุงระบบงาน ERP เพื่อรองรับการทำงานตามผังโครงสร้างองค์กรใหม่	นบ.	๗.๒๕๔	๗.๒๕๔	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อปรับปรุงระบบบริหารการเงิน การบัญชี ระบบการวางแผนงบประมาณ ระบบการจัดการรายได้ และระบบบริหารสินทรัพย์และการพัสดุ (ระบบ ERP) ระบบโครงสร้างองค์กร และการเชื่อมโยงไปยังระบบ HRSS และส่วนที่เกี่ยวข้องให้ทำงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ตามโครงสร้างองค์กรใหม่ของสำนักงาน กสทช. ที่มีผลบังคับใช้		✓			ได้รับอนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามลำดับ โดยเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้ส่งเรื่องไปยังสำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.) แล้ว เพื่อดำเนินการจัดจ้างฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ต่อไป	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของการดำเนิน โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/ กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนที่ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่ กำหนด			
๑	โครงการจ้างปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และระบบ HRSS ของ สำนักงาน กสทช.	นบ.	๑๑.๙๐๐	๙.๕๒๐	ปี ๒๕๖๗ (๒.๓๘๐)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	เพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีในการออกแบบและระบบ HRSS ใหม่ให้ทันสมัย สะดวกรวดเร็วในการใช้งาน และมีความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศมากขึ้น และพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สามารถกำหนดเงื่อนไขในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประมวลผลสิทธิการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การเบิกจ่ายสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต และเงินเกษียณของพนักงานได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน		✓				อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	-
๑	โครงการระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและระบบประกอบอาคาร อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ ๑) งานระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ ๒) งานปรับปรุงระบบประกอบอาคาร ๓) งานจ้างผู้ควบคุมงานและดำเนินการอื่น ๆ	นบ.	๕๘๒.๗๐๕	๑๔๕.๖๗๖	ปี ๒๕๖๗ (๔๓๗.๐๒๙)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	เพื่อจัดหาอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานและระบบประกอบอาคารของสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ ให้รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Smart building)		✓				อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบฯ ๒ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	-
๑	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ ๑) งานก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ ๒) งานจ้างผู้ควบคุมงาน และดำเนินการอื่น ๆ ๓) งานออกแบบเพิ่มเติม	พย.	๒,๗๔๓.๐๐๐	๒๗๐.๘๒๓	ปี ๒๕๖๒ (๖๘๕.๗๕๐) ปี ๒๕๖๓ (๕๓๔.๑๓๓) ปี ๒๕๖๔ (๖๘๑.๓๒๔) ปี ๒๕๖๕ (๔๒๐.๘๕๑) ปี ๒๕๖๗ (๑๕๐.๕๑๙)	ม.ค.-๖๒	ธ.ค.-๖๗	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการ มีผลการดำเนินงานฯ แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้ ๑. งานก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ มีความคืบหน้าการดำเนินการฯ คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๕๗ ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากมีการปรับแก้ไขแบบอาคาร A แบบอาคาร G และแบบงานผังบริเวณ ให้มีความเหมาะสม ส่งผลให้ต้องปรับแก้แผนงานก่อนจะดำเนินการตามแผนต่อไป ๒. งานจ้างผู้ควบคุมงาน และตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น ๒ ระยะ ได้แก่ ระยะที่ ๑ การดำเนินการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ๓๓ เดือน โดยได้ปรับเพิ่มระยะเวลาการควบคุมงาน จำนวน ๔ เดือน และระยะที่ ๒ การดำเนินการตลอดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องของงานก่อสร้าง ๒ ปี โดยได้มีการแก้ไขสัญญา ครั้งที่ ๑ ให้เพิ่มระยะเวลาการควบคุมงานก่อสร้าง และขอให้แก้ไขรายละเอียดการจ่ายค่าจ้างควบคุมงาน โดยได้ดำเนินการเบิกจ่ายงวดที่ ๓๗ แล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๗ ๓. งานออกแบบเพิ่มเติม ได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานและดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๘๗.๘๑	✓		๑. จำนวนอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ๘ อาคาร ๒. ร้อยละความสำเร็จของงานดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากงานก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ต้องมีการปรับแก้ไขแบบอาคาร A แบบอาคาร G และแบบงานผังบริเวณ ทำให้ต้องมีการปรับแก้แผนงานก่อนจะดำเนินการตามแผนต่อไป	-
๑	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจจับและติดตามความเคลื่อนไหวของครุภัณฑ์ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี RFID (ระยะที่ ๓)	พย.	๕.๓๔๔	๕.๓๔๔	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับและติดตามความเคลื่อนไหวของครุภัณฑ์ของสำนักงาน กสทช. ให้มีความถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว และครอบคลุมพื้นที่ทั้งสำนักงาน กสทช. ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค			✓			ได้ลงนามในสัญญาจ้างฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามขอบเขตของงาน (TOR) ประจำปี ๒๕๖๖ ในการสำรวจ วิเคราะห์ และออกแบบพื้นที่การติดตั้งอุปกรณ์พร้อมส่งมอบแผนการดำเนินงานให้สำนักงาน กสทช. เห็นชอบต่อไป	๑๐.๐๐	✓		๑. จำนวนครุภัณฑ์ระบบรวมติดตั้ง ๑ ชุด ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	-

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของการดำเนิน โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนิน งาน/กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
๑	โครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับผู้ใช้งานภายในสำนักงาน กสทช. (NBTC Employee Portal)	ดย.	๑๔.๗๖๕	๑๐.๓๓๕	ปี ๒๕๖๕ (๔.๔๓๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับผู้ใช้งานภายในสำนักงาน กสทช. (NBTC Employee Portal) ให้มีเครื่องมือที่ช่วยบุคลากรในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ได้ด้วยตนเอง (Citizen Developer)			✓			๕๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐	-	-	
๒	แผนงานบริหารสถาบันวิทยาการและการเสริมสร้างสำนักงาน กสทช. ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	ยก.	๒๓.๓๔๒	๒๓.๓๔๒	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อสนับสนุนการบริหารสถาบันวิทยาการในการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้			✓			๒๔.๕๘	✓		ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	-	
๒	แผนงานสร้างองค์ความรู้ของบุคลากรให้มีขีดความสามารถทางวิชาการ เพื่อรองรับการเป็นองค์กรชั้นนำในการกำกับดูแลที่มีความเป็นสากล	วก.	๗๑.๕๗๖	๗๑.๕๗๖	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ให้มีขีดความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และการจัดทำนโยบายกำกับดูแลของ กสทช.			✓			๒๓.๗๒	✓		ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	-	
๒	งานพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	วย.	๔๑.๒๑๑	๔๑.๒๑๑	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ตามแผนที่กำหนด และศึกษา วิจัย จัดทำเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รวมทั้งเป็นศูนย์เสริมสร้างและแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลให้แก่บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ			✓			๒๔.๐๐	✓		๑. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	-	
๒	งานพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และประชาชนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	สท.	๒๓.๖๑๔	๒๓.๖๑๔	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีมาตรฐานการสื่อสาร ภายใต้จริยธรรมวิชาชีพ พร้อมทั้งส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล			✓			๗.๕๑	✓		๑. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕			

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของการดำเนิน โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนิน งาน/กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนที่ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่ กำหนด			
๒	งานพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม และประชาชน ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล	ทค.	๓.๒๕๔	๓.๒๕๔	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาบุคลากรในกิจการ โทรคมนาคมและประชาชนให้ มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมี ศักยภาพเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล		✓				อยู่ระหว่างการเตรียมการพัฒนาบุคลากรในกิจการ โทรคมนาคมและประชาชน ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล โดยภาพรวมเป็นไปตามแผนที่กำหนด ดังนี้ ๑. ได้ประสานงานและจัดเตรียมสถานที่ที่ใช้ในการจัด อบรมหลักสูตรการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบสังเคราะห์ คลื่นความถี่ สำหรับหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาค ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Synthesizer) เรียบร้อยแล้ว ๒. อยู่ระหว่างประสานงานและเตรียมการจัดการอบรม ได้แก่ การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ให้กับบุคลากรสำนักงาน กสทช. และการอบรมพัฒนาวិทยากรด้านวิทยุคมนาคม ให้กับบุคลากรสำนักงาน กสทช. (Train the Trainer) ๓. อยู่ระหว่างเตรียมการจัดการอบรม ได้แก่ การอบรม เชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการ กำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมและอัตราค่าบริการ โทรคมนาคม และการอบรมเรื่อง การวิเคราะห์การ ส่งผ่านต้นทุนส่วนเพิ่มไปสู่อัตราค่าบริการโทรคมนาคม	๐.๐๐	✓		๑. ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	-
๒	โครงการพัฒนาระบบฝึกอบรมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ของ สำนักงาน กสทช.	วย.	๓.๕๐๐	๓.๕๐๐	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	๑. เพื่อให้มีระบบฝึกอบรมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ของสำนักงาน กสทช. ๒. เพื่อฝึกอบรมพนักงานของ สำนักงาน กสทช. ที่จำเป็นใน การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ				✓	อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขออนุมัติยกเลิกการดำเนิน โครงการฯ ดังกล่าว	-	✓		๑. จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	รศทช. (ยก.) ได้อนุมัติยกเลิก การดำเนินโครงการพัฒนา ระบบฝึกอบรมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ของสำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เนื่องจาก เพื่อให้เกิดความซ้ำซ้อนใน การดำเนินการ โดยสำนัก ทรัพยากรบุคคล (บย.) จะทำ การจัดหาระบบการบริหาร จัดการและพัฒนาทรัพยากร บุคคล ซึ่งระบบดังกล่าวจะมี ความครอบคลุมระบบ ฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย	-	
๒	โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทใน ต่างประเทศ สำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๕	วย.	๓.๓๐๐	๐.๒๐๐	ปี ๒๕๖๕ (๓.๐๐๐) ปี ๒๕๖๗ (๐.๑๐๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๗	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงาน กสทช. ให้มีความ เป็นเลิศในด้านการกำกับดูแล ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและ สังคมดิจิทัล			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน โดยได้ดำเนินการเบิก ค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวก่อนการเดินทางไปศึกษาและ ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาให้กับสำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ รับฝากนักเรียนทุนไว้ในความดูแลเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบัน นักเรียนทุน ๑ ราย อยู่ระหว่างการศึกษาระดับ ปริญญาโทตามแผนที่กำหนด ซึ่งคาดว่าจะสำเร็จ การศึกษาในเดือนตุลาคม ๒๕๖๖	๖๐.๐๐	✓		๑. จำนวนทุนฯ ๒ ทุน ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐	-	-	
๒	โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทใน ต่างประเทศ สำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๖	วย.	๕.๐๐๐	๓.๘๐๐	ปี ๒๕๖๗ (๐.๕๐๐) ปี ๒๕๖๘ (๐.๓๐๐)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๘	เพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักงาน กสทช. ให้มีความรู้ ความสามารถในระดับสูง อัน จะช่วยขับเคลื่อน ภารกิจของสำนักงาน กสทช. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น			✓		อยู่ระหว่างการประชุมรับสมัครพนักงานขอรับ ทุนการศึกษา	๑๐.๐๐	✓		๑. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ในปี ๒๕๖๘ ตามแผนที่กำหนด ๒ คน ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐	-	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของการดำเนิน โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนิน งาน/กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด				
๒	โครงการระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์แบบ สื่อสารหลากหลายช่องทาง Omni-Channel Contact Center	บ.บ.	๑๗.๐๓๐	๑๐.๒๑๘	ปี ๒๕๖๕ (๖.๘๑๒)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อให้บริการการติดต่อสื่อสาร ของประชาชนหรือหน่วยงาน ภายนอกจากหลากหลาย ช่องทางให้เป็นหนึ่งเดียว (Omni-channel) ผ่านระบบ ของศูนย์ Call Center 1200 และเพิ่มประสิทธิภาพในการ ให้บริการแก่ประชาชนหรือ หน่วยงานภายนอก ทั้งในด้ การค้นหาข้อมูล การตอบสนอง การติดตามเรื่องคำร้องต่างๆ สร้างความพึงพอใจและ ประสบการณ์ที่ดีของประชาชน (Customer Experience)			✓				อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ตรวจรับงานประจำงวดที่ ๒ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้แก่ งานการ ติดตั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบฯ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง การดำเนินงานตามขอบเขตของงานประจำงวดที่ ๓ ใน การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และเชื่อมโยงข้อมูลตามคุณ ลักษณะเฉพาะด้านโปรแกรมประยุกต์ จัดทำคู่มือการ ออกแบบและพัฒนาระบบ ส่งมอบระบบพร้อมทดสอบ และติดตั้งใช้งาน ณ สำนักงาน กสทช. และจัดฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทดสอบ (UAT) การใช้ระบบงาน จริงที่ติดตั้ง พร้อมปรับแต่งระบบให้เหมาะสมและเกิด ประสิทธิภาพสูงสุด	๕๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐	-	-
๒	โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแบบจำลอง ดุลยภาพทั่วไป (Computable General Equilibrium Model) สำหรับการประเมินผล กระทบทางเศรษฐกิจในวงกว้าง (ภายใต้ ความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช. และ Victoria University ประเทศออสเตรเลีย)	ป.ว.	๗.๐๐๐	๗.๐๐๐	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อจัดทำแบบจำลองดุลยภาพ ทั่วไป (CGE Model) สำหรับ การวิเคราะห์ผลกระทบของ นโยบายต่อระบบเศรษฐกิจ และ เพื่อให้บุคลากรของสำนักงาน กสทช. สามารถใช้แบบจำลอง ดังกล่าวในการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงปริมาณได้		✓				อยู่ระหว่างเตรียมการ โดยได้มีการขอความเห็นจาก สำนักบริหารคดีและนิติการ (นย.) เพื่อหารือในการจัดทำ ร่างสัญญาโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแบบจำลองดุลยภาพ ทั่วไป (Computable General Equilibrium Model) สำหรับการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงกว้าง (ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช. และ Victoria University ประเทศออสเตรเลีย)	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนแบบจำลองฯ ๑ แบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	-	
๒	โครงการจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับ สายงานวิชาการ (Strategic Database System : SDS)	ศ.ว.	๙.๐๐๐	๙.๐๐๐	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล สำหรับสายงานวิชาการ (Strategic Database System : SDS) ให้เป็นเครื่องมือในการ บริหารจัดการข้อมูลด้าน วิชาการที่จำเป็น สามารถ เข้าถึงข้อมูลวิชาการได้อย่าง ถูกต้อง รวดเร็ว พร้อมทั้งพัฒนา เว็บไซต์ศูนย์วิจัยและพัฒนา ทางวิชาการ กสทช. (NBTC Research Hub) สำหรับเป็น ศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ระหว่างนักวิจัย รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลด้าน วิชาการ เพื่อให้เกิดการ เชื่อมโยงข้อมูลที่จำเป็นต่อ การศึกษาเชิงวิชาการจาก แหล่งข้อมูลภายในและ ภายนอกสำนักงาน กสทช.		✓				ได้รับอนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามลำดับ โดยเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้ส่งเรื่องไปยังสำนักการพัสดุและ บริหารทรัพย์สิน (พย.) แล้ว เพื่อดำเนินการจัดจ้างฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ต่อไป	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	-	
๒	โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึง สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย	ศ.ว.	๗.๐๐๐	๗.๐๐๐	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้าน พฤติกรรมการใช้งานและการ เข้าถึงสื่อประเภทต่าง ๆ ของ ประชาชน ได้แก่ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคม เพื่อใช้ในการ เผยแพร่แก่ประชาชนและภาค ส่วนที่เกี่ยวข้องในการนำไปใช้ ประโยชน์ต่อไป			✓			สำนักงาน กสทช. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อสร้างความร่วมมือในการ สนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการด้านสถิติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสำนักงาน กสทช. โดยปัจจุบัน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำชุดข้อมูลแบบสำรวจสำหรับ กิจกรรมกระจายเสียง กิจกรรมโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคม	๑๐.๐๐	✓		๑. จำนวนฐานข้อมูลฯ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของการดำเนิน โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/ กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด				
๓	แผนงานบริหารคลื่นความถี่ กำกับดูแล กิจการดาวเทียมและบริหารกิจการ ส่วนภูมิภาค และสนับสนุนการสร้างความ ร่วมมือระหว่างประเทศ	ภค. / บก.	๕๘๐.๕๓๗	๕๘๐.๕๓๗	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ บริหารคลื่นความถี่ และกิจการ ดาวเทียมของประเทศ ให้มี ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ นโยบายและแผนระดับชาติ ที่เกี่ยวข้อง พัฒนาศักยภาพ ของสำนักงาน กสทช. ส่วน ภูมิภาค และเพิ่มประสิทธิภาพ การตรวจสอบและกำกับดูแล คลื่นความถี่			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานบริหารคลื่นความถี่ กำกับดูแลกิจการดาวเทียมและบริหารกิจการส่วนภูมิภาค และสนับสนุนการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ	๔๒.๕๗	✓		ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	-	
๓	งานขับเคลื่อนการกิจการบริหารคลื่นความถี่ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของชาติที่ เกี่ยวข้องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไป	คป.	๓.๒๑๖	๓.๒๑๖	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการบริหารคลื่นความถี่ให้มี ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ นโยบายและแผนของชาติ ที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงไป			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการขับเคลื่อนการกิจการบริหารคลื่น ความถี่ โดยได้จัดประชุมหรือกลุ่มย่อย (Focus group) เรื่อง การจัดทำ (ร่าง) ประกาศเกี่ยวกับการใช้คลื่น ความถี่ร่วมกับระหว่างกิจการดาวเทียม และกิจการ โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) ย่านความถี่ 27.0 – 29.5 GHz แล้ว จำนวน ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ตามลำดับ ซึ่งเป็นการ จัดการประชุมในรูปแบบ online และ on-site ควบคู่กัน	๔๐.๐๐	✓		๑. จำนวนแผน กฏระเบียบ แนวทางที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารคลื่นความถี่ ๑ ฉบับ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	-	
๓	งานขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการ ดาวเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของ ประเทศชาติและประชาชน	คป.	๑.๙๖๔	๑.๙๖๔	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อสนับสนุนการกำกับ ดูแลกิจการดาวเทียม การ บริหารสิทธิในการใช้ช่อง โคจรดาวเทียมของประเทศ อย่างมีประสิทธิภาพและ โปร่งใส เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ประเทศชาติและ ประชาชน และเป็นไปตาม ข้อบังคับวิทยุของสหภาพ โทรคมนาคมระหว่างประเทศ และพันธกรณีระหว่างประเทศ			✓			ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกิจการ ดาวเทียมของปี ๒๕๖๖ แล้วจำนวน ๓ ครั้ง และจัดการ ประชุมเชิงปฏิบัติการแล้วเพื่อขับเคลื่อนการกำกับ ดูแลกิจการดาวเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของ ประเทศชาติและประชาชน จำนวน ๕ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ และ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖	๑๖.๐๐	✓		๑. จำนวนแผน กฏระเบียบ แนวทางที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารสิทธิในการใช้ช่อง โคจรดาวเทียม ๑ ฉบับ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	-	
๓	งานการประชุมและพัฒนาเครือข่ายความ ร่วมมือระหว่างประเทศในการบริหารคลื่น ความถี่และกำกับดูแลการประกอบกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการ โทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม	คย.	๑๒๕.๐๙๕	๑๒๕.๐๙๕	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการบริหารคลื่นความถี่และ กำกับดูแลการประกอบกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และ กิจการดาวเทียม			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างประเทศในการบริหารคลื่นความถี่และกำกับดูแล การประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม โดยได้ส่ง ผู้แทนเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศแล้ว จำนวน ๒๖ การประชุม และปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินการ อนุมัติการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระหว่างประเทศ จำนวน ๗ การประชุม ตามแผนการดำเนินงาน	๓๐.๐๐	✓		๑. จำนวนการประชุมระหว่าง ประเทศ ประจำปี ๒๕๖๖ ที่สำนักงาน กสทช. ส่งผู้แทน เข้าร่วมการประชุม ๓๕ ครั้ง ๒. จำนวนการเป็นเจ้าภาพการ ประชุมระหว่างประเทศใน ระดับทวิภาคี ประจำปี ๒๕๖๖ ๗ ครั้ง ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	เนื่องจากมีความไม่แน่นอน จากสถานการณ์การเกิดโรค ระบาดภัยธรรมชาติ และ นโยบายทางการเมือง ส่งผลให้ บางการประชุมต้องเลื่อน หรือ ยกเลิก ทั้งนี้ ได้มีการ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุม จากเดิมเป็นรูปแบบออนไลน์ และรูปแบบ Hybrid แทน	-	-
๓	โครงการจัดหาและพัฒนาออกใบอนุญาต เคลื่อนที่ของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค จำนวน ๑ คัน	ภก.	๑๔.๗๐๕	๑๔.๕๕๕	ปี ๒๕๖๕ (๑๒.๗๕๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	จัดหารถยนต์พร้อมออกแบบ ปรับปรุงและพัฒนาให้สามารถ ดำเนินการออกใบอนุญาต เคลื่อนที่ และใช้การกิจการ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ วิทยุคมนาคม รวมทั้งมีรถ ต้นแบบของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาคเพื่อบริการ ประชาชนในการออกใบอนุญาต เคลื่อนที่			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการประจำงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) ในการจัดทำเอกสารสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ (Software License) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย การส่งมอบรถ ออกใบอนุญาตและอุปกรณ์ต่างๆ การทดสอบเครื่อง อุปกรณ์ทั้งหมด เป็นต้น ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๖๐.๐๐	✓		๑. จำนวนรถยนต์สำหรับ ออกใบอนุญาตเคลื่อนที่ ๑ คัน ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐	-	มีการปรับแผนงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔	

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของการดำเนิน โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/ กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
๓	โครงการจัดเก็บและบูรณาการระบบตรวจสอบและควบคุมสถานีตรวจสอบความถี่ระยะไกล	กก.	๘.๙๒๕	๑.๓๓๓	ปี ๒๕๖๕ (๗.๕๘๖)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนา ปรับปรุงอุปกรณ์และระบบจัดเก็บบูรณาการระบบตรวจสอบและควบคุมสถานีตรวจสอบความถี่วิทยุระยะไกลและการบำรุงรักษาเครื่องมือ สถานีตรวจสอบสามารถตรวจสอบเชิงป้องกันเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ			✓			๗๕.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐	-	มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔	
๓	โครงการจัดหาเครื่องสแกนความถี่และค้นหาตำแหน่งสถานีส่งสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๔ ชุด	กก.	๒๘.๐๐๐	๗.๐๐๐	ปี ๒๕๖๕ (๒๑.๐๐๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อจัดหาเครื่องสแกนความถี่และค้นหาตำแหน่งสถานีส่งสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบของสำนักงาน กสทช. ภาค สำนักงาน กสทช. เขต มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน				✓		๑๐๐.๐๐	✓		๑. จำนวนครุภัณฑ์โครงการ ๔ ชุด ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐	-	มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔	
๓	โครงการพัฒนาระบบต้นแบบสำหรับการบริหารจัดการความถี่วิทยุและการตรวจสอบคลื่นความถี่ของศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่แห่งชาติ	กก.	๙.๕๖๑	๕.๒๐๓	ปี ๒๕๖๕ (๔.๒๕๘)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาระบบต้นแบบสำหรับการบริหารจัดการความถี่วิทยุและการตรวจสอบคลื่นความถี่ของศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่แห่งชาติ			✓			๕๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐	-	-	
๓	โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์และลดเสียงการรบกวนวิทยุกระจายเสียง	กก.	๙.๕๐๒	๕.๒๒๖	ปี ๒๕๖๕ (๔.๒๗๖)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาระบบการวิเคราะห์และลดเสียงการรบกวนวิทยุกระจายเสียง			✓			๕๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐	-	-	
๓	โครงการจัดหาชุดสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล จำนวน ๕ สถานี	กก.	๕๓.๓๗๕	๘.๙๐๗	ปี ๒๕๖๗ (๕๐.๔๖๘)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบคลื่นความถี่ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ		✓				๐.๐๐	✓		๑. จำนวนชุดสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล ๕ สถานี ในปี ๒๕๖๗ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	-	
๓	โครงการจัดหาเครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นความถี่วิทยุ ชนิด Realtime Bandwidth แบบสะพายถือ ย่านความถี่ 10 MHz - 42 GHz จำนวน ๒๒ ชุด	กก.	๕๓.๙๐๐	๑๓.๔๗๕	ปี ๒๕๖๗ (๔๐.๔๒๕)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	เพื่อจัดหาเครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นความถี่วิทยุ ชนิด Realtime Bandwidth แบบสะพายถือ ย่านความถี่ 10 MHz - 42 GHz จำนวน ๒๒ ชุด		✓				๐.๐๐	✓		๑. จำนวนเครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นความถี่วิทยุ (๖ ชุด ในปี ๒๕๖๖ และ ๑๖ ชุด ในปี ๒๕๖๗) ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของการดำเนิน โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/ กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามและ รายงานการตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้ ความถี่ด้วยเทคโนโลยี Video Streaming	กก.	๖.๒๔๗	๐.๙๓๗	ปี ๒๕๖๗ (๕.๓๑๐)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	เพื่อจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ติดตาม และรายงานการตรวจสอบและ กำกับดูแลการใช้ความถี่ด้วย เทคโนโลยี Video Streaming			✓				๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	-
๓	โครงการจัดหาอุปกรณ์เก็บข้อมูลสำหรับ การออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๔๘ ชุด	กก.	๒๒.๔๕๕	๓.๓๖๘	ปี ๒๕๖๗ (๑๙.๐๘๗)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	เพื่อจัดหาอุปกรณ์เก็บข้อมูล สำหรับการออกอากาศของ สถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๔๘ ชุด		✓					๐.๐๐	✓		๑. จำนวนอุปกรณ์ฯ (๙ ชุด ในปี ๒๕๖๖ และ ๓๙ ชุด ในปี ๒๕๖๗) ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	-
๓	โครงการเครื่องมือตรวจสอบการใช้ความถี่ วิทยุในการตรวจสอบข้อผิดพลาดการจัดงาน พระราชพิธีของสำนักงาน กสทช. ภาค ๑ จำนวน ๕ สถานี	ภก.๑	๓๐.๔๕๒	๒๒.๗๘๐	ปี ๒๕๖๕ (๗.๖๗๒)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อจัดหาเครื่องมือตรวจสอบ การใช้ความถี่วิทยุประเภท Cellular Technology แบบประจำที่และแบบเคลื่อนที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้ งานความถี่ของผู้ประกอบการ ชายสื่อสารของหน่วยงานต่างๆ ที่มีการใช้งานประเภท Cellular Technology			✓				๒๐.๐๐	✓		๑. จำนวนครุภัณฑ์โครงการฯ ๕ สถานี ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐	-	มีการปรับแผนงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
๓	โครงการจัดทำต้นแบบศูนย์ตรวจสอบ คลื่นความถี่ของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค	ภก.๑	๙.๗๗๒	๓.๔๐๖	ปี ๒๕๖๕ (๖.๓๖๖)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อจัดหาระบบวิดีโอวอลล์ (Video Wall) และระบบ ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล การใช้ความถี่วิทยุ สำหรับการ จัดทำศูนย์ตรวจสอบคลื่น ความถี่ในพื้นที่สำนักงาน กสทช. ภาค ๑ (ต้นแบบ)			✓				๒๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐	-	-
๓	โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ พร้อมอาคารประกอบ	ภก.๒	๖๙.๐๒๗	๔๘.๓๑๙	ปี ๒๕๖๕ (๒๐.๗๐๘)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อใช้เป็นศูนย์บริหารงานใน การกำกับดูแลกิจการกระจาย เสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมในพื้นที่ รับผิดชอบ สามารถรองรับ หน่วยงานภายในสังกัดอย่าง เพียงพอ สะดวก และเกิดความ คล่องตัวในการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการ		✓					๐.๐๐	✓		๑. จำนวนอาคารที่ทำการ สำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ ๑ หลัง ๒. จำนวนอาคารบ้านพัก ๕ หลัง ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐	การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด เนื่องจากใน ขั้นตอนการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พบว่า ประกาศและเอกสาร ประกวดราคาปรากฏ รายละเอียดที่ไม่ถูกต้อง จึง ต้องดำเนินการแก้ไขตาม ความเห็นให้ถูกต้องและ ครบถ้วน จึงทำให้การแก้ไข รายละเอียดล่าช้ากว่ากำหนด และไม่สามารถดำเนินการตาม แผนการจัดซื้อจัดจ้างได้ตาม กำหนด	-

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของการดำเนิน โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/ กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
๓	โครงการบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒	ภก.๒	๖.๖๓๖	๑.๙๙๑	ปี ๒๕๖๕ (๔.๖๔๕)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ ให้มีความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ปลอดภัยต่อทรัพย์สินของสำนักงานฯ พนักงาน ตลอดจนประชาชน ที่เข้ารับบริการ		✓				ได้ดำเนินการขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาประมาณของสำนักงาน กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อชี้แจงการขอปรับเพิ่มงบประมาณรายจ่ายโครงการบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาประมาณฯ ได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นว่าโครงการดังกล่าว ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของขอบเขตงานและราคากลาง รวมถึงแผนการดำเนินงานโครงการ อีกทั้งเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งยังไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงาน กสทช. และหากมีการปรับแก้ไขขอบเขตของงานต้องเสนอคณะทำงานกลั่นกรองร่างขอบเขตงานในการจัดทำพัสดุของสำนักงาน กสทช. พิจารณาก่อน จึงมีมติเห็นควรชะลอการจัดสรรงบประมาณโครงการดังกล่าว และให้ดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนตามแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาประมาณรายจ่ายฯ ให้เรียบร้อยก่อน จึงขอเสนอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายกลางปี ๒๕๖๖ ต่อไป	๐.๐๐		✓	๑. จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากสำนักงาน กสทช. ได้มีความเห็นให้ปรับแก้ไขรายละเอียดรายจ่ายขอซื้อจ้างโครงการบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามความเห็นให้ถูกต้องและครบถ้วน จึงทำให้ดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า และไม่สามารถดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างได้ตามกำหนด	-
๓	โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒	ภก.๒	๑๒.๑๐๒	๑๒.๑๐๒	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อก่อสร้างอาคารบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง) จำนวน ๕ หลัง (๙ ยูนิต)		✓			อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ขอความเห็นชอบการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ แล้วเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนบ้านพักพนักงานเสร็จสมบูรณ์พร้อมเข้าอยู่ ๕ หลัง ๒. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐	-	-	
๓	โครงการก่อสร้างภูมิสถาปัตย์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงาน กสทช. เขต ๓๔	ภก.๓	๓๐.๕๐๐	๙.๗๖๐	ปี ๒๕๖๕ (๒๐.๗๔๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อให้ภูมิสถาปัตย์ของสำนักงาน กสทช. เขต ๓๔ เกิดความสวยงาม สะดวกปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการทำงานรองรับภารกิจของสำนักงาน กสทช. เขต ๓๔			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการตามขอบเขตงานประจำงวดที่ ๒ ได้แก่ การก่อสร้างกำแพงกันดิน อย่างไรก็ตาม ได้พบปัญหาแบบขัดแย้งในงานก่อสร้างหลายรายการ ส่งผลให้งานก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการต่อได้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงมีมติให้ผู้รับจ้างหยุดงานก่อสร้างและให้รวบรวมปัญหาทั้งหมด โดยเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สำนักงาน กสทช. เขต ๓๔ ได้มีหนังสือหรือไปยังผู้รับจ้างกรณีเกิดแบบขัดแย้งดังกล่าว และต่อมาเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างได้ให้ความเห็นต่อการดำเนินการแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับในงานจ้างก่อสร้างได้ให้ผู้รับจ้างนำแบบเข้าพื้นที่ก่อสร้างเพื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบ BOQ เพื่อเปรียบเทียบงานเพิ่มเติม และคำนวณเงินเพิ่มลดเพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง ครั้ง ๑ ต่อไป	๑๐.๐๐		✓	๑. จำนวนสิ่งก่อสร้างและ/หรือระบบสาธารณูปโภคโดยรอบอาคารสำนักงานมีความครบถ้วนพร้อมใช้งาน ๑ หลัง/ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๓. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	เนื่องจากพบปัญหาแบบขัดแย้งในงานก่อสร้างหลายรายการ ส่งผลให้งานก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการต่อได้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงมีมติให้ผู้รับจ้างหยุดงานก่อสร้างและให้รวบรวมปัญหาทั้งหมด เพื่อเสนอขอแก้ไขแบบและนำไปประกอบการขออนุมัติจัดทำบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔	
๓	โครงการสถานีเฝ้าระวังการแพร่กระจายคลื่นเพื่อการกำกับดูแลของสำนักงาน กสทช. ภาค ๔	ภก.๔	๙.๙๔๐	๕.๔๔๐	ปี ๒๕๖๕ (๔.๕๐๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อจัดตั้งสถานีเฝ้าระวังการแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบตลอดเวลาพิเศษ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียนเด็ก และเฝ้าระวังการรบกวนทางสัญญาณต่อเครื่องมือทางการแพทย์ ที่อาจส่งผลกระทบต่อรักษาพยาบาลผู้ป่วยและผลกระทบต่อคลื่นแม่เหล็กในพื้นที่ของสำนักงาน กสทช. ภาค ๔		✓			อยู่ระหว่างดำเนินการตามขอบเขตของงาน ประจำงวดที่ ๒ โดยได้ประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดหาอุปกรณ์สถานีเฝ้าระวังการแพร่กระจายคลื่น เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ สำนักงาน กสทช. ภาค ๔ โดยเตรียมกำหนดส่งมอบงานตามสัญญา งวดที่ ๒ ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๓๕.๐๐		✓	๑. จำนวนสถานีเฝ้าระวังการแพร่กระจายคลื่นฯ ๑ สถานี ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากมีการปรับปรุงและแก้ไขขอบเขตของงาน (TOR) ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของโครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนที่ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่ กำหนด			
๔	แผนงานบริหารกิจการกระจายเสียงและ โทรทัศน์	สท.	๓๑๓.๗๕๔	๓๑๓.๗๕๔	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ กำกับดูแลและส่งเสริมกิจการ กระจายเสียง และกิจการ โทรทัศน์ และพัฒนากลไก ในการกำกับดูแลด้านเนื้อหา การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของ ประชาชน และคุ้มครอง ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง และโทรทัศน์			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานบริหารกิจการกระจาย เสียงและโทรทัศน์	๖๖.๖๗	✓		ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	-
๔	แผนงานบริหารกิจการโทรคมนาคม	ทค.	๔๘๗.๖๐๑	๔๘๗.๖๐๑	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ กำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม และเสริมสร้างความเข้มแข็ง และคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ โทรคมนาคม			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานบริหารกิจการ โทรคมนาคม	๓๙.๔๑	✓		ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	-
๔	แผนงานสนับสนุนการกิจการกำกับดูแล กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และกิจการ ดาวเทียมสื่อสาร	ยก.	๑๔๙.๙๘๗	๑๔๙.๙๘๗	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแล กิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมของ กสทช. ที่มีความเร่งด่วนที่จะต้อง ดำเนินการ สามารถแก้ไข ปัญหาตามสถานการณ์ที่อาจ เกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานสนับสนุนการกิจการ กำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียมสื่อสาร	๑๐.๐๐	✓		ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	-
๔	งานสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและ สนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และ สำนักงาน กสทช. เพื่อดำเนินการเกี่ยวเนื่อง ทางด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ โทรคมนาคม หรือด้านวิทยุคมนาคมที่จัดขึ้น เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสาธารณกุศล	อป.	๑๐๑.๑๖๐	๑๐๑.๑๖๐	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อสนับสนุนงบประมาณการ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและ สนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เพื่อดำเนินการเกี่ยวเนื่อง ทางด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ โทรคมนาคม และวิทยุคมนาคมเพื่อประโยชน์ สาธารณะหรือสาธารณกุศล			✓			ได้ดำเนินการสนับสนุนการกิจของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการสนับสนุนการจัด กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน กสทช. และสำนักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แก่ (๑) สนับสนุนการดำเนินโครงการสื่อเพื่อสร้างสำนึก พลเมือง ประจำปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ โดยสถาบัน พระปกเกล้า (๒) สนับสนุนการจัดงานออกจรรณณะกรียาทูต ประจำปี ๒๕๖๖ โดยสภาอากาศไทย (๓) สนับสนุนการจัดงานเฟสดีวิลมวยไทย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยกรมสวัสดิการ (๔) สนับสนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ "โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราช เพื่อประชาชน (๕) สนับสนุนงาน "๑๐๖ ปี คินเหยา ฟังเพลงเพลิน เดิน จุฬาฯ" โดยสมาคมนิสิตจุฬาฯ (๖) สนับสนุนการผลิตสื่อเผยแพร่ ชุด โครงการหลวงสู่ การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมูลนิธิโครงการหลวง (๗) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำภาพฉากหลัง เฉลิมพระเกียรติพร้อมประดับตกแต่ง และงานจัดจ้างทำ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พร้อมประดับตกแต่ง โดยได้ ดำเนินการจ้างและลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖	๒๕.๗๐	✓		๑. ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	-

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของการดำเนิน โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/ กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนที่ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่ กำหนด			
๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์	นบ.	๑๙.๓๒๐	๙.๓๒๐	ปี ๒๕๖๕ (๑๐.๐๐๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ รวบรวม วิเคราะห์ และจัดเก็บ ข้อมูลที่อยู่บนเครือข่ายเว็บและ โซเชี่ยลให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้นเท่าทันกับเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รองรับ การทำงานจากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาใช้งานพื้นที่เก็บข้อมูล เพิ่มขึ้น และมีจำนวนสิทธิ์การ ใช้งานเพียงพอรองรับกับความ ต้องการใช้งาน			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ดำเนินการตรวจรับงาน งวดที่ ๒ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้แก่ การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับ Collect Sever ๑ ชุด และเพิ่มความจุของ storage ของระบบ เดิมให้เพียงพอต่อการใช้งาน และดำเนินการติดตั้ง Collect Sever จำนวน ๑ ชุด พร้อมระบบปฏิบัติการ เป็นต้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามขอบเขต ของงานประจำงวดที่ ๓ ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Web Intelligence เพิ่มสิทธิ์การใช้ระบบ รวมทั้ง ดำเนินการรวมระบบที่เพิ่มประสิทธิภาพเข้ากับระบบ ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์เดิม และจัดหา ระบบตามขอบเขตของงาน เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลใน เชิงลึก	๘๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐	-	-
๔	โครงการศึกษาแนวทางในการพัฒนา หลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ ไทยให้สอดคล้องกับระบบนิเวศของ อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป	วส.	๔.๘๓๒	๐.๙๙๗	ปี ๒๕๖๕ (๓.๘๓๕)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์ในการ กำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ใน ปัจจุบันครอบคลุมทุกมิติ ที่สมควรปรับเปลี่ยน ตลอดจน รวบรวมความคิดเห็นจาก ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมา พัฒนาแนวทางกำกับดูแล กิจการโทรทัศน์ไทยและจัดทำ ชุดร่างหลักเกณฑ์สำหรับการ กำกับดูแลการให้บริการ แพร่ภาพและเสียงผ่าน โครงข่ายอื่นที่มีใช้โครงข่าย กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของ อุตสาหกรรมและการแข่งขันที่ เปลี่ยนแปลงไป			✓		อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามขอบเขตของงานประจำ งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) ในการจัดทำรายงานผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) บทสรุปผู้บริหาร และ จัดการประชุมเผยแพร่ผลการศึกษา อย่างน้อย ๑ ครั้ง ตามขอบเขตของงาน (TOR)	๗๕.๐๐	✓		๑. จำนวนรายงานผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ ๑ ฉบับ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐	-	-	
๔	โครงการติดตามประเมินผลงานในมิติเชิง สังคมโดยใช้ซีพีโมเดล (CIPP Model) สำหรับ สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	วส.	๔.๔๐๐	๐.๖๕๐	ปี ๒๕๖๕ (๓.๗๕๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อศึกษาวิเคราะห์และติดตาม ประเมินผลโครงการในมิติทาง สังคมของสายงานกิจการ กระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์ เสนอต่อระดับนโยบาย			✓		ได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๔ แล้วเสร็จ ได้แก่ รายงานผลการศึกษาขั้นกลาง (Interim Report) ในส่วนของประเมินแผนงานและโครงการของปี ๒๕๖๕ สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ ๓ ปี ๒๕๖๕ ปัจจุบันอยู่ ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๕ ที่จะจัดให้มีการจัดประชุม เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการติดตามประเมินผลงาน ในมิติเชิงสังคมโดยใช้ซีพีโมเดล (CIPP Model) สำหรับ สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ ณ สำนักงาน กสทช.	๘๕.๐๐	✓		๑. จำนวนรายงานและ ข้อเสนอแนะฯ ๑ ฉบับ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐	-	-	
๔	โครงการจ้างพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อยกระดับ ข้อมูลในรูปแบบ Data Visualization สำหรับสายงานกิจการกระจายเสียงและ โทรทัศน์	ศว.	๓.๕๐๐	๓.๕๐๐	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลของ สายงานกิจการกระจายเสียง และโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่ผ่าน ศูนย์ข้อมูลออนไลน์ และ เพื่อยกระดับข้อมูลของสายงาน กิจการกระจายเสียงและ โทรทัศน์ไปสู่การเป็น สารสนเทศ (Information) ในรูปแบบ Data Visualization โดย ครอบคลุมมิติหลักๆ อย่าง ครบถ้วน และนำเสนอต่อ สาธารณะผ่านศูนย์ข้อมูล ออนไลน์ของสายงานกิจการ กระจายเสียงและโทรทัศน์		✓		อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนชุดข้อมูล และขอบเขต การดำเนินงานใน (ร่าง) ขอบเขตของงานโครงการจ้าง พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อยกระดับข้อมูลในรูปแบบ Data Visualization สำหรับสายงานกิจการกระจายเสียงและ โทรทัศน์ ร่วมกับฝ่ายเลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อน ภารกิจสนับสนุนการให้บริการฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๒ (สำนักนโยบายและวิชาการ กระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) และ ผู้รับผิดชอบระบบ Data Center และการจัดทำ Data Visualization ของ สำนักงาน กสทช. (สำนักบริหารข้อมูลกลาง (บบ.)) ตาม ความเห็นของคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงานฯ	๐.๐๐		✓	๑. จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	คณะกรรมการจัดทำขอบเขต ของงานฯ มีความเห็นให้ฝ่าย เลขานุการฯ หรือร่วมกับฝ่าย เลขานุการคณะทำงาน ขับเคลื่อนภารกิจสนับสนุนการ ให้บริการฯ และผู้รับผิดชอบ ระบบ Data Center และการ จัดทำ Data Visualization ของสำนักงาน กสทช. เพื่อ พิจารณาทบทวนชุดข้อมูล และขอบเขตการดำเนินงานใน (ร่าง) ขอบเขตของงาน โครงการดังกล่าว เนื่องจาก การจัดทำขอบเขตของงาน โครงการดังกล่าวดำเนินการ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งปัจจุบันอาจจะมีการ รวบรวมชุดข้อมูลไว้ที่ระบบ Data Center อยู่แล้ว	-	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของการดำเนิน โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/ กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนที่ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่ กำหนด			
๔	โครงการปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอดสดและ รายงานข่าวการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมที่ สำคัญของประเทศไทย	ปส.	๗๖.๐๔๗	๓๘.๐๔๘	ปี ๒๕๖๕ (๓๘.๐๔๘)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอดสด และรายงานข่าวการแข่งขัน กีฬาและกิจกรรมที่สำคัญของ ประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลาง ในการจัดการถ่ายทอดสด และ รายงานข่าวการแข่งขันกีฬา และกิจกรรมที่สำคัญของ ประเทศไทย ได้อย่างสมบูรณ์ และทันสมัยรองรับเทคโนโลยี 4K และเตรียมความพร้อมใน การดำเนินการถ่ายทอดสดและ รายงานข่าวการแข่งขันกีฬา เอเชียนเกมส์ ๒๐๒๒			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ตรวจรับการส่งมอบงาน ประจำงวดที่ ๑ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้แก่ รายงานผลการศึกษารายงาน (Inception Report) ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๒ ในการปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอดสดฯ โดยได้พัฒนาอุปกรณ์ และเครื่องมือ ระบบด้านเทคนิคสำหรับการออกอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัยในศูนย์ถ่ายทอดสดฯ	๕๐.๐๐	✓		๑. จำนวนศูนย์ถ่ายทอดสดฯ ๑ ศูนย์ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐	-	-
๔	โครงการพัฒนาระบบรองรับการเปลี่ยนผ่าน การอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและ โทรทัศน์	ปส.	๙.๗๓๗	๒.๗๓๗	ปี ๒๕๖๕ (๗.๐๐๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาระบบรองรับการ เปลี่ยนผ่านการอนุญาต ประกอบกิจการกระจายเสียง และโทรทัศน์ สำหรับรองรับ กระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ การอนุญาตตามกฎหมาย ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้งาน คลื่นความถี่และประกอบ กิจการกระจายเสียงและ โทรทัศน์ เพื่อรองรับการบริการ ด้านการอนุญาตและการกำกับ ดูแลเกี่ยวกับการกระจาย เสียงและโทรทัศน์ ที่มุ่งสู่ความ เป็นดิจิทัล			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ตรวจรับการส่งมอบงาน ประจำงวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ ระบบตรวจสอบ และกำกับดูแลการออกอากาศด้านกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ที่ได้พัฒนาและปรับปรุง และได้ จัดทำรายงานผลการพัฒนาและปรับปรุงระบบตรวจสอบ ฯ ดังกล่าวตามเงื่อนไขที่กำหนดของงวดที่ ๓ แล้วเสร็จ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานตามขอบเขตของงาน ประจำงวดที่ ๔ ซึ่งมีเนื้อหาต่อเนื่องจากงวดงานที่ ๓	๗๕.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบรองรับการ เปลี่ยนผ่านการอนุญาต ประกอบกิจการกระจายเสียง และโทรทัศน์ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐	-	-	
๔	โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และตรวจสอบ เนื้อหารายการ	ปส.	๑๕.๗๒๗	๑๒.๕๘๒	ปี ๒๕๖๗ (๓.๑๔๕)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	เพื่อพัฒนาระบบวิเคราะห์และ ตรวจสอบเนื้อหารายการด้าน การโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร และยา และเพื่อให้มีเครื่องมือ ติดตามและกำกับดูแลผู้รับ ใบอนุญาตหรือผู้รับอนุญาตที่ ให้บริการแพร่ภาพกระจายเสียง ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ หลักเกณฑ์ และ เงื่อนไขการอนุญาตในด้านการ โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารและยา		✓		ได้รับอนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ ตามลำดับ ขณะนี้อยู่ระหว่าง ส่งเรื่องไปยังสำนักการพัฒนาระบบบริหารทรัพย์สิน (พย.) เพื่อดำเนินการจัดจ้างฯ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ต่อไป	๐.๐๐	✓		๑. ร้อยละของจำนวนสำนัก ที่เข้าใช้ฐานข้อมูลในระบบฯ ร้อยละ ๘๐ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	-		
๔	โครงการความร่วมมือการผลิตข่าวใน พระราชสำนัก และการถ่ายทอดสดงาน พระราชพิธี และรัฐพิธี สำหรับการให้บริการ กระจายเสียงหรือโทรทัศน์	ปส.	๑๕.๐๐๐	๑๕.๐๐๐	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	๑. เพื่อให้ผู้รับอนุญาตหรือผู้รับ ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สามารถเผยแพร่ข่าวใน พระราชสำนักโดยมีเนื้อหาและ รูปแบบเดียวกันอย่างเหมาะสม และสอดคล้องตามประกาศ กสทช. ๒. จัดให้มีหน่วยงานที่มีความ เหมาะสมในการผลิตข่าวใน พระราชสำนักที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนำเอาข่าวใน พระราชสำนักไปเผยแพร่ได้ อย่างทั่วถึง			✓		สำนักงาน กสทช. และ สำนักงานโทรทัศน์รวมการ เฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์ กองทัพบก ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) เรื่อง ความร่วมมือการผลิตข่าวในพระราชสำนัก และการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธี และรัฐพิธีสำหรับ การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ โดยปัจจุบันอยู่ ระหว่างดำเนินการปรับปรุงสัญญาเพิ่มเติมในเรื่อง กำหนดการชำระเงิน และรายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงิน จากกำหนดชำระเงินเดิม ณ ไตรมาสที่ ๑ ปรับแก้ให้ดำเนินการ ณ ไตรมาสที่ ๔	๑๐.๐๐	✓		๑. จำนวนการนำเสนอข่าวใน พระราชสำนักฯ ๕ เรื่อง ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของโครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนที่ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่ กำหนด			
๔	โครงการสำรวจพฤติกรรมและวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงของผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย	สส.	๖.๖๗๘	๖.๖๗๘	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อสำรวจพฤติกรรมและวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงของผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย จากการรับฟังผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ ช่องทางผ่านเครื่องรับวิทยุ ช่องทางออนไลน์ และนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงของผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย		✓				ได้รับอนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ ตามลำดับ ปัจจุบันอยู่ระหว่างส่งเรื่องไปยังสำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.) เพื่อดำเนินการจัดจ้างฯ ต่อไป	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนรายงานผลการศึกษา ๑ ฉบับ ๒. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	-
๔	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการตรวจมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง	รส.	๕.๓๐๐	๕.๓๐๐	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการการตรวจมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุกระจายเสียงตามแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม สถานีวิทยุกระจายเสียงตามแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มกำลังส่งต่ำ และสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตให้ทดลองออกอากาศตามหลักเกณฑ์ ให้เชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (BCS) ปัจจุบันของสำนักงาน กสทช.		✓			ได้รับอนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ ตามลำดับ ปัจจุบันอยู่ระหว่างส่งเรื่องไปยังสำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.) เพื่อดำเนินการจัดจ้างฯ ต่อไป	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	-	
๔	โครงการระบบตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายจากการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ระดับภูมิภาค ระยะที่ ๒	บส.	๑๓๐.๐๐๐	๒๐.๐๐๐	ปี ๒๕๖๕ (๖๕.๐๐๐) ปี ๒๕๖๗ (๔๕.๐๐๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๗	เพื่อเข้าระบบตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายจากการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ระดับภูมิภาค เพิ่มเติม เพื่อให้มีเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบเนื้อหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายที่มีการออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศน์				✓	อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการฯ ดังกล่าว	-	✓		๑. จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	โครงการระบบตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายจากการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ระดับภูมิภาค ระยะที่ ๒ เป็นโครงการที่มีลักษณะการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อนกับโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เก็บข้อมูลการตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด จึงเห็นสมควรให้ยกเลิกการดำเนินการดังกล่าว โดย ลสทช. ได้อนุมัติให้ยกเลิกการดำเนินการดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ พร้อมทั้งเห็นชอบให้ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๕ แล้วเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของการดำเนิน โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
๔	โครงการจ้างพัฒนาฐานข้อมูลกิจการ โทรคมนาคม และระบบรายงานเชิงวิเคราะห์ เพื่อการบริหารงานข้อมูลกิจการโทรคมนาคม	วท.	๑๐.๐๐๐	๓.๐๐๐	ปี ๒๕๖๕ (๗.๐๐๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลกิจการ โทรคมนาคมและระบบรายงาน เชิงวิเคราะห์เพื่อการบริหารงาน ข้อมูลกิจการ และปรับปรุง ฐานข้อมูลการกำกับดูแล เพื่อ จัดทำรายงานสถาปัตยกรรม และพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการติดตามและกำกับดูแล การประกอบกิจการ โทรคมนาคมแบบบูรณาการ (Single Profile) เดิมที่ใช้ บริการส่งข้อเสนอแนะในการ พัฒนาศักยภาพการให้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างเหมาะสม			✓			ได้ลงนามสัญญาจ้างโครงการจ้างพัฒนาฐานข้อมูลกิจการ โทรคมนาคม และระบบรายงานเชิงวิเคราะห์เพื่อการบริหารงาน ข้อมูลกิจการโทรคมนาคม เรียบร้อยแล้ว เมื่อ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง ดำเนินการตามขอบเขตของงานประจำงวดที่ ๑ ในการ จัดประชุมเริ่มงานโครงการ (Kick off Project) และ จัดทำแผนการดำเนินงานของโครงการ	๑๐.๐๐		✓	๑. จำนวนฐานข้อมูลฯ (ระบบ) ๑ ระบบ ๒. จำนวนระบบรายงาน เชิงวิเคราะห์เพื่อการบริหาร งานข้อมูลสายงานกิจการ โทรคมนาคม ๑ ระบบ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐	การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด เนื่องจากใน กระบวนการประกาศร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) และ ร่างเอกสารประกวดราคา มีผู้เสนอแนะความคิดเห็น (วิจารณ์) ต่อรายละเอียดและ ขอบเขตของงานข้างต้น ส่งผลให้ต้องแก้ไขปรับปรุงร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) และ ร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อขอความเห็นชอบใหม่ อีกครั้ง ก่อนนำร่างเอกสาร ประกวดราคาฯ ลงเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ต่อไป	-
๔	โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยออนไลน์แอปพลิเคชัน (ปีที่ ๓)	วท.	๘.๘๑๓	๔.๘๔๗	ปี ๒๕๖๕ (๓.๙๖๖)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อศึกษาและสำรวจพฤติกรรม ของผู้บริโภคในการใช้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และนำ ข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์และ เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง ในพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่าง ต่อเนื่องสำหรับการพัฒนา ศักยภาพการให้บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่อย่างเหมาะสม และ กำหนดนโยบายแผนและ มาตรการกำกับดูแลให้มี ประสิทธิภาพ			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ตรวจรับงานประจำงวดที่ ๑ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้แก่ รายงานผล การศึกษาขั้นต้นฯ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตาม ขอบเขตของงานประจำงวดที่ ๒ ในการจัดทำรายงานผล การศึกษาขั้นกลาง การสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้บริการ ของผู้บริโภค ตามขอบเขตงานที่กำหนด	๒๕.๐๐		✓	๑. จำนวนรายงานผลการ สำรวจฯ ๑ ฉบับ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	เนื่องจากในขั้นตอนประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า มีผู้ ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว จึง ต้องดำเนินการยกเลิกการ ประกวดราคา และดำเนิน ขั้นตอนประกวดราคาใหม่อีก ครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างฯ ส่งผลให้การ ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	-	
๔	โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสายสื่อสาร ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	วท.	๒๐.๔๗๗	๑๐.๒๓๙	ปี ๒๕๖๗ (๑๐.๒๓๘)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๗	เพื่อสำรวจและจัดเก็บข้อมูล สายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าหรือ เส้นทางในพื้นที่เพื่อจัดลำดับ เส้นทางที่มีความสำคัญหรือ มีความจำเป็นในการดำเนินการ นำระบบสื่อสารลงใต้ดินหรือ จัดระเบียบสายสื่อสาร และ นำข้อมูลที่ได้ลงระบบภูมิศาสตร์ สารสนเทศของสำนักงาน กสทช. เพื่อทำข้อมูลเส้นทางที่ อนุญาตและไม่อนุญาตให้ พาดสายสื่อสารในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งได้ดำเนินการประกวด ราคาครั้งที่ ๑ เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งในขั้นตอนการยื่นข้อเสนอประกวดราคา พบว่า ผู้ยื่น เสนอราคาไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงดำเนินการ ยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการประกาศประกวด ราคาครั้งที่ ๒ เพื่อให้ผลการประกวดราคาฯ เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ	๐.๐๐		✓	๑. จำนวนระบบฯ และรายงาน การสำรวจฯ ๑ ฉบับ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	เนื่องจากในขั้นตอนประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ผู้ยื่นเสนอราคาไม่ตรง ตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงต้อง ดำเนินการยกเลิกการประกวด ราคา และดำเนินขั้นตอน ประกวดราคาใหม่อีกครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างฯ ส่งผลให้การ ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	มีการปรับแผนงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕	
๔	โครงการจัดทาระบบบริหารจัดการแก้ไขสาย สื่อสารเพื่อความปลอดภัยของประชาชน (p-safe)	วท.	๔.๖๐๗	๒.๕๓๔	ปี ๒๕๖๗ (๒.๐๗๓)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๗	เพื่อจัดทาระบบบริหารจัดการ แก้ไขสายสื่อสารเพื่อความ ปลอดภัยของประชาชน (P-safe) ให้สามารถรับส่ง คำร้องของประชาชนไปยัง ผู้ประกอบกิจการได้โดยผ่าน ระบบบริหารจัดการด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์และตอบกลับ การแก้ไขผ่านระบบฯ ให้ผู้ร้อง รับทราบผลการดำเนินการโดย ไม่ล่าช้า รองรับนโยบายการ พัฒนาสำนักงาน กสทช. ให้ เป็นสำนักงานดิจิทัล			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และได้ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการทาง พัสดุเพื่อดำเนินการลงนามในสัญญาต่อไป	๐.๐๐		✓	๑. จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	เนื่องจากการจัดทำขอบเขต ของงานมีความซับซ้อน และ ต้องใช้ระยะเวลาในการ พิจารณา เพื่อให้ครอบคลุม ครบถ้วน ประกอบกับต้อง ดำเนินการในขั้นตอน กระบวนการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์รอบใหม่ เพื่อให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างฯ ส่งผลให้การดำเนินการ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	มีการปรับแผนงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕	

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของการดำเนิน โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/ กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนที่ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่ กำหนด			
๔	โครงการพัฒนาระบบการตรวจค้นและจับกุม ตามกฎหมาย	ตท.	๑๘.๙๙๗	๑๓.๒๙๘	ปี ๒๕๖๕ (๕.๖๙๙)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ ในการตรวจค้นและจับกุม ผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย และพัฒนาระบบฐานข้อมูลการ ใช้การตรวจค้นและจับกุมตาม กฎหมายของสำนักงาน กสทช. เพื่อประกอบการพิจารณาของ ผู้บริหารสำนักงาน กสทช. โดยมีการเชื่อมโยง ข้อมูลกับระบบต่าง ๆ ของ สำนักงาน กสทช. ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับสายงานและใน ระดับสำนักงาน กสทช. ตรวจสอบ และควบคุมการ ทำงานให้เป็นไปตามความ เหมาะสม สอดคล้องกับ แผนงานและสถานการณ์ปัจจุบัน			✓			อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามขอบเขตของงานประจำ งวดที่ ๓ ในการทดสอบระบบเบื้องต้นจากการจัดหา ซอฟต์แวร์ตามที่กำหนด และซอฟต์แวร์อื่นๆ เพื่อใช้ สำหรับการพัฒนา ทดสอบ และติดตั้งฐานข้อมูลและ แอปพลิเคชันต่างๆ และดำเนินการพัฒนาระบบตรวจค้น และจับกุมตามกฎหมาย ระยะที่ ๑	๕๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	-
๔	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนา และปรับปรุงการกำกับดูแลบริการค้าส่งใน กิจการโทรคมนาคม (Telecom Wholesale Roadmap)	ชท.	๘.๘๖๓	๒.๖๕๙	ปี ๒๕๖๗ (๖.๒๐๔)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	เพื่อจัดทำแผนพัฒนาและ ปรับปรุงการกำกับดูแลบริการ ค้าส่งในกิจการโทรคมนาคม (Telecom Wholesale Roadmap)		✓			ได้รับอนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางแล้ว เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ตามลำดับ พร้อมทั้งได้มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยคาดว่าจะลงนามในสัญญา ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนแผนพัฒนาและ ปรับปรุงการกำกับดูแลฯ ๑ แผน ๒. จำนวนคู่มือการส่งข้อมูล การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย โทรคมนาคม ๑ ฉบับ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	-	
๔	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดให้ มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและ บริการเพื่อสังคม	ถท.	๑๔๔.๖๓๐	๒๑.๖๙๔	ปี ๒๕๖๕ (๔.๓๓๙) ปี ๒๕๖๗ (๒๔.๕๘๗) ปี ๒๕๖๘ (๒๘.๙๒๖) ปี ๒๕๖๙ (๓๑.๘๑๙) ปี ๒๕๗๐ (๓๓.๒๖๕)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๗๐	เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงาน ของสำนักงาน กสทช. ในการ จัดทำรายละเอียดประกอบการ จัดทำแผนปฏิบัติการ ภายใต้ แผนการจัดให้มีบริการ โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม และ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำใน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับ ดูแลและบริหารแผนงาน/ โครงการภายใต้แผนการจัดให้ มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม			✓		อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยได้ดำเนินการตรวจรับการส่ง มอบงานประจำงวดที่ ๑ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้แก่ รายงานสรุปผลการดำเนินการภารกิจและ ขอบเขตของงานที่ปรึกษา (รอบ ๓ เดือน) ปัจจุบันอยู่ ระหว่างการดำเนินงานตามขอบเขตของงานประจำงวดที่ ๒ ในการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามภารกิจ และขอบเขตของงานที่ปรึกษา (รอบ ๖ เดือน)	๑๐.๐๐	✓		๑. จำนวน (ร่าง) แผนปฏิบัติการ/ แผนงาน/โครงการ ๑ ฉบับ ๒. จำนวนรายงานตรวจสอบ ควบคุม ติดตามความก้าวหน้าฯ ปีละ ๑ ฉบับ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	-	
๔	โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อภาพยนต์ โฆษณาภารกิจภายใต้แผนการจัดให้มีบริการ USO ประจำปี ๒๕๖๖	ถท.	๘.๐๐๐	๘.๐๐๐	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อจ้างผลิตสื่อภาพยนต์ โฆษณาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ภารกิจและโครงการภายใต้ แผนการจัดให้มีบริการ USO เพื่อส่งเสริมการรับรู้ ความ เข้าใจ หรือสร้างการตระหนักรู้ ในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้ง ส่งเสริมภาพลักษณ์ของ สำนักงาน กสทช. ในเชิงบวก ต่อสาธารณชน โดยใช้การ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่าน ช่องทางออนไลน์		✓			ได้รับอนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางแล้ว เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ตามลำดับ ปัจจุบันอยู่ระหว่างส่งเรื่องไปยังสำนัก การพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.) เพื่อดำเนินการจัด จ้างฯ ต่อไป	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนสื่อภาพยนต์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า ๑ เรื่อง ๒. จำนวนการเผยแพร่สื่อ ภาพยนต์โฆษณาผ่านช่องทาง ออนไลน์ ไม่น้อยกว่า ๑ เรื่อง ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของการดำเนิน โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/ กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนที่ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่ กำหนด			
๔	โครงการปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพช่องทางติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนในด้านการโทรคมนาคมร่วมกับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม	รท.	๐.๖๕๑	๐.๖๕๑	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาช่องทางติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนในด้านการโทรคมนาคมร่วมกับผู้รับใบอนุญาต โดยมีช่องทาง Web Portal ในการส่งเรื่องร้องเรียนพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแจ้งเตือนผู้รับใบอนุญาตในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนและรายงานสถานะความคืบหน้าผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้สำนักงาน กสทช. ทราบ		✓				ได้รับอนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ตามลำดับ ปัจจุบันอยู่ระหว่างส่งเรื่องไปยังสำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.) เพื่อดำเนินการจัดจ้างฯ ต่อไป ตามบันทึกที่ สทช ๒๕๑๓/๔๔๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	-
๔	โครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ Any Registration	คท.๑	๘.๘๘๐	๗.๕๔๘	ปี ๒๕๖๕ (๑.๓๓๒)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาระบบงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตในกิจการวิทยุคมนาคมเพิ่มเติมและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแบบออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ พัฒนาหรือปรับปรุงบริการของหน่วยงานให้ประชาชนสามารถขอรับบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากจุดให้บริการเดียว โดยมุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centric)			✓		อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามขอบเขตของงานประจำงวดงานที่ ๒ ในการจัดทำเอกสารข้อกำหนดความต้องการในการพัฒนาระบบ (SRS) การดำเนินการออกแบบและพัฒนาชุดโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ (Any Registration Source Code) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ Any Registration	๔๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐	-	-	
๔	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม	ขท.	๙.๒๐๐	๖.๒๙๐	ปี ๒๕๖๕ (๒.๙๑๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของสำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้ใช้และเชื่อมโยงโครงข่าย โดยให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบต่างๆ ของสำนักที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับสายงานและในระดับสำนักงาน กสทช. และเพื่อเป็นช่องทางในการประสานงานและกำกับดูแลระหว่างสำนักงาน กสทช. กับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง		✓			อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามขอบเขตของงานประจำงวดที่ ๓ ในการจัดหาซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และติดตั้งและทดสอบระบบงานที่ได้ดำเนินการปรับปรุง	๖๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐	-	-	
