




รายงานความก้าวหน้า
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๖
ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖

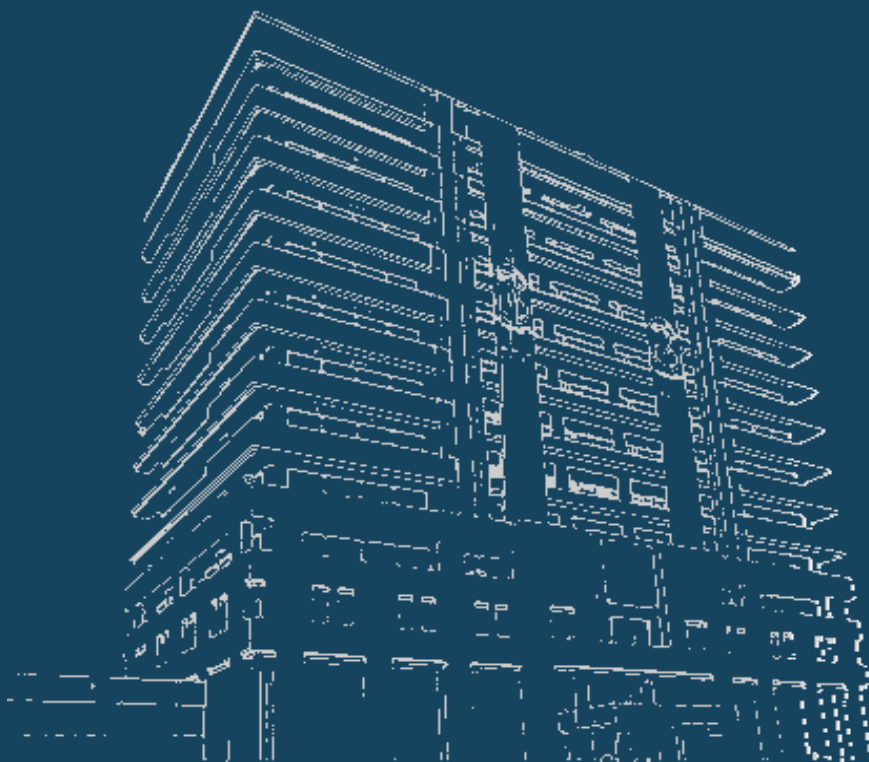


ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)

รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๖
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)
ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖

แผนและผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการ ในภาพรวมตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ๒๕๖๖

แผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๖ กำหนดงบประมาณรายจ่ายรองรับจำนวนทั้งสิ้น ๖,๒๗๑.๒๕๐ ล้านบาท แบ่งเป็น งบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. จำนวน ๕,๑๖๓.๗๘๕ ล้านบาท^๑ รายจ่ายสำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) จำนวน ๙๗.๔๖๕ ล้านบาท และเงินจัดสรรเข้ากองทุนฯ จำนวน ๑,๐๑๐.๐๐๐ ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ ๑

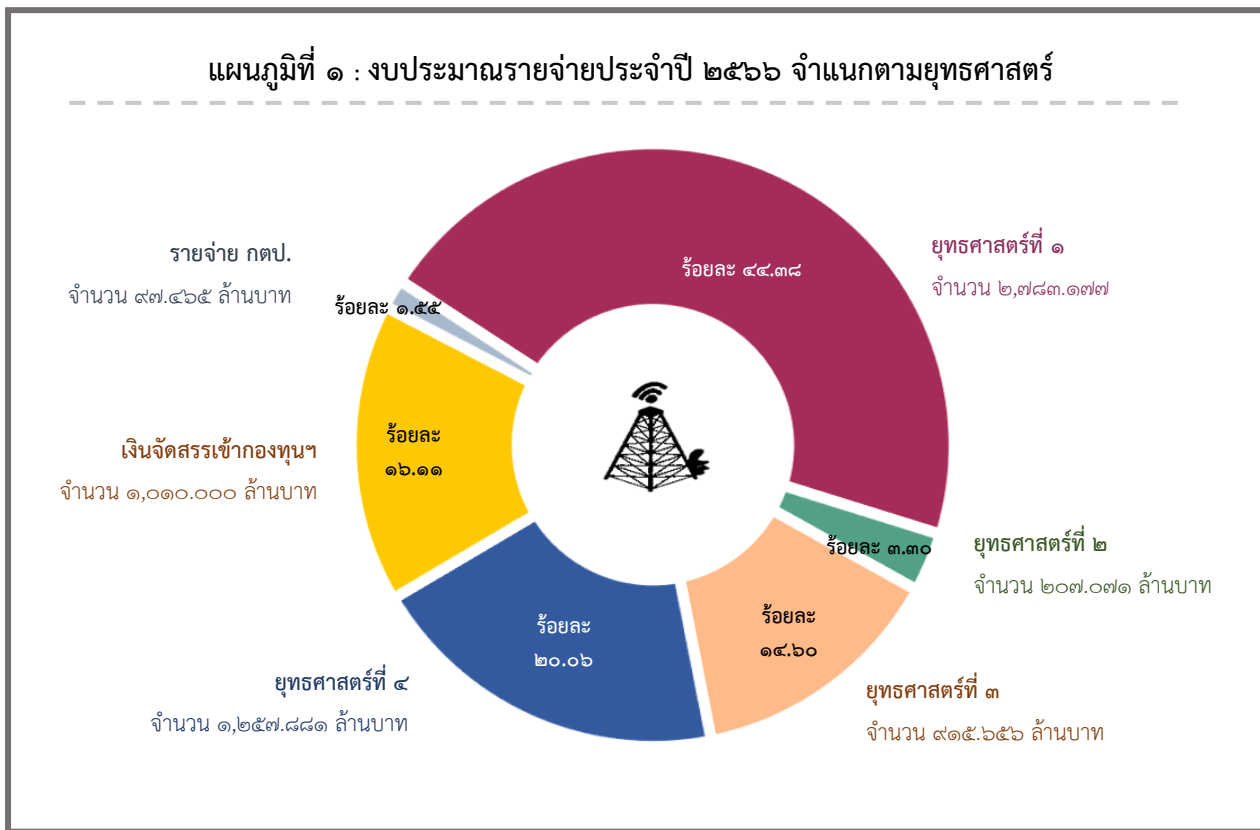

^๑ มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖ ตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ และปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยดำเนินการตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยกรางงบประมาณของสำนักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม


สามารถจำแนกรายยุทธศาสตร์ โดยมีแผนงาน (งานประจำ) และโครงการสำคัญรองรับการดำเนินการ
 ชั้นเคลื่อนนโยบายของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐)
 ดังรายละเอียดปรากฏตามภาพที่ ๑ และแผนภูมิที่ ๒

ภาพที่ ๑ : งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ (จำแนกตามยุทธศาสตร์)

แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๗๐)



แผนภูมิที่ ๒ : แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๖ ภายใต้ยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช.
(ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖)

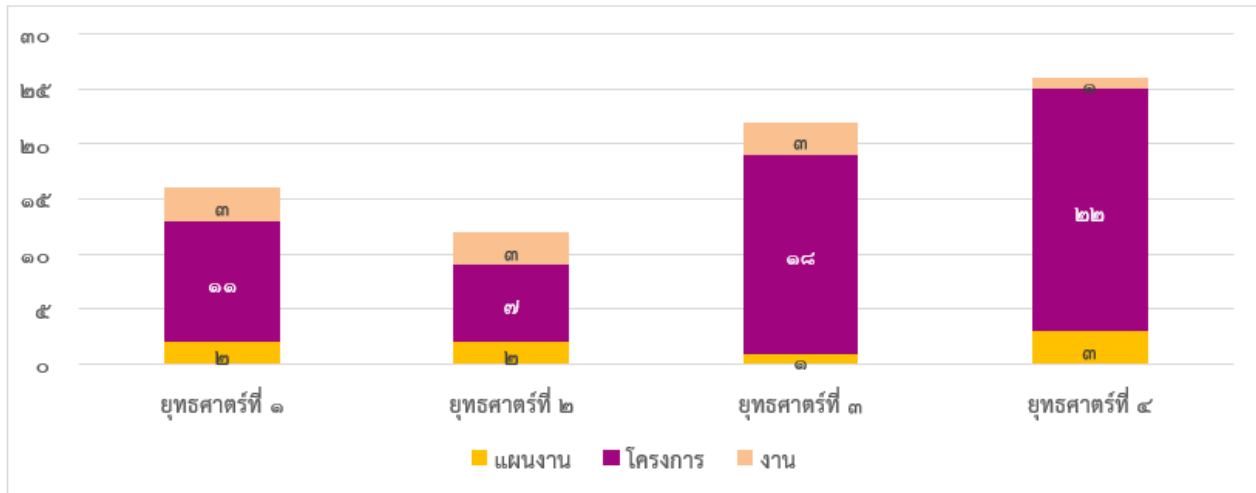


สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๖ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) ประจำปีไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖) โดยมีผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๑ และแผนภูมิที่ ๓ - แผนภูมิที่ ๔ ดังนี้

ตารางที่ ๑ : ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๖ ภายใต้ยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)
(ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖)


ยุทธศาสตร์	จำนวนแผนงาน/โครงการ/งานที่ติดตาม							ผลการดำเนินการ									
	แผนงาน (๑)	คิดเป็นร้อยละของแผนงานทั้งหมด	โครงการ (๒)	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	งาน (๓)	คิดเป็นร้อยละของงานทั้งหมด	รวมแผนงาน/โครงการ/งาน (๑) - (๓)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	คิดเป็นร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	คิดเป็นร้อยละ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ	ยกเลิกดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับการพัฒนาระบบราชการและเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล	๒	๒๕.๐๐	๑๑	๑๘.๙๗	๓	๓๐.๐๐	๑๖	๑๐	๖๒.๕๐	๓	๑๘.๗๕	๐	๐.๐๐	๐	๐	๓	๑๘.๗๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศ ในด้านการกำกับดูแลให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	๒	๒๕.๐๐	๗	๑๒.๐๗	๓	๓๐.๐๐	๑๒	๙	๗๕.๐๐	๒	๑๖.๖๗	๐	๐.๐๐	๐	๐	๑	๘.๓๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาขีดความสามารถการบริการ คลืนความถี่และกิจการดาวเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของ ประเทศไทยและประชาชน และ ยกระดับศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค เพื่อการกำกับ ดูแลและการบริการประชาชน	๑	๑๒.๕๐	๑๘	๓๑.๐๓	๓	๓๐.๐๐	๒๒	๙	๔๐.๙๑	๙	๔๐.๙๑	๓	๑๓.๖๔	๐	๐	๑	๔.๕๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพในการกำกับดูแลและ ส่งเสริมกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้เหมาะสมกับบริบท ที่เปลี่ยนแปลงไป	๓	๓๗.๕๐	๒๒	๓๗.๙๓	๑	๑๐.๐๐	๒๖	๑๕	๕๗.๖๙	๙	๓๔.๖๒	๐	๐.๐๐	๐	๐	๒	๗.๖๙
รวมทั้งสิ้น	๘	๑๐๐	๕๘	๑๐๐.๐๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	๗๖	๔๓	๕๖.๕๘	๒๓	๓๐.๒๖	๓	๓.๙๕	๐	๐	๗	๙.๒๑

แผนภูมิที่ ๓ : ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖

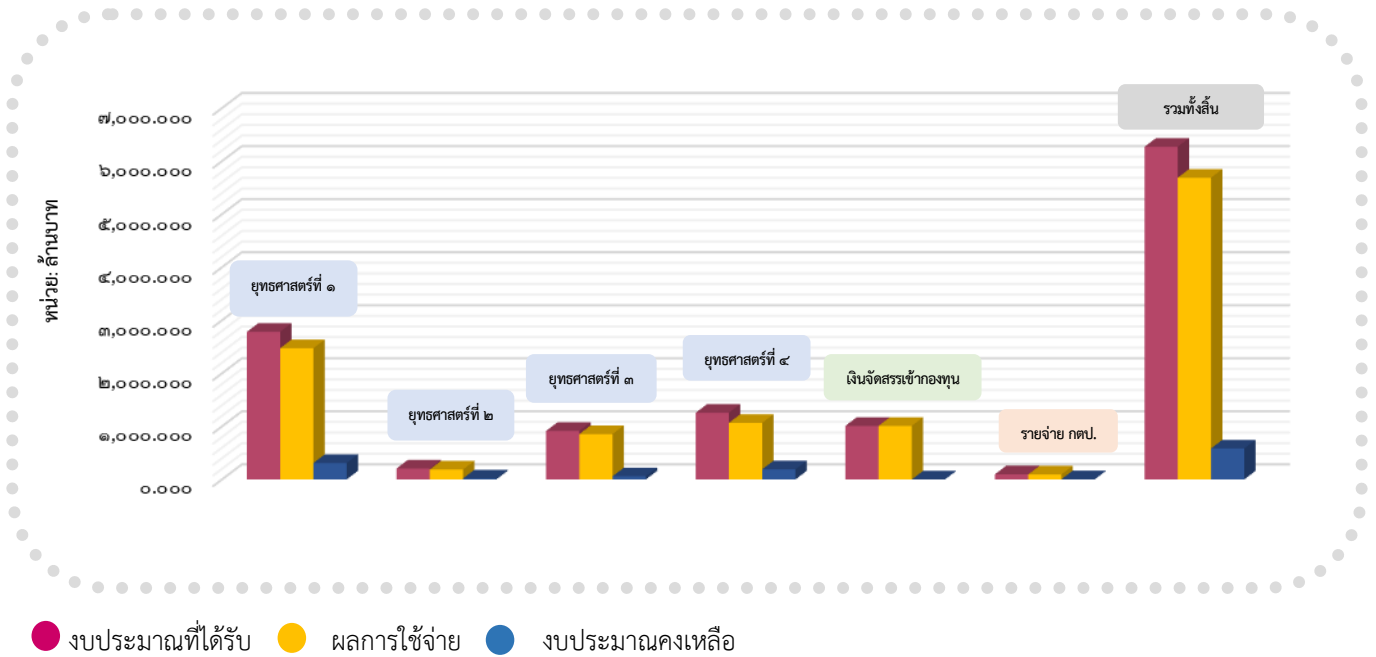

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณที่ได้ (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ (ล้านบาท)	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับการพัฒนาธรรมาภิบาลและเป็นองค์กร ที่มีสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล	๒,๗๘๓.๑๗๗	๒,๔๗๓.๗๙๔	๘๘.๘๘	๓๐๙.๓๘๓	๑๑.๑๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศ ในด้านการกำกับดูแล ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	๒๐๗.๐๗๑	๑๘๗.๔๙๓	๙๐.๕๔	๑๙.๕๗๘	๙.๔๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาขีดความสามารถการบริหารคลื่นความถี่และกิจการ ดาวเทียมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน และยกระดับศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค เพื่อการกำกับดูแลและการบริการประชาชน	๙๑๕.๖๕๖	๘๕๕.๖๗๒	๙๓.๔๕	๕๙.๙๘๔	๖.๕๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพ ในการกำกับดูแลและส่งเสริม กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป	๑,๒๕๗.๘๘๑	๑,๐๖๖.๙๙๙	๘๔.๘๒	๑๙๐.๘๘๒	๑๕.๑๘
รวม	๕,๑๖๓.๗๘๕	๔,๕๘๓.๙๕๘	๘๘.๗๗	๕๗๙.๘๒๗	๑๑.๒๓
เงินจัดสรรเข้ากองทุน	๑,๐๑๐.๐๐๐	๑,๐๑๐.๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
รายการ กตป.	๙๗.๔๖๕	๙๓.๖๖๒	๙๖.๑๐	๓.๘๐๓	๓.๙๐
รวมทั้งสิ้น	๖,๒๗๑.๒๕๐	๕,๖๘๗.๖๒๐	๙๐.๖๙	๕๘๓.๖๓๐	๙.๓๑

แผนภูมิที่ ๔ : สถานะการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๖ ภายใต้ยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช.
ณ ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖

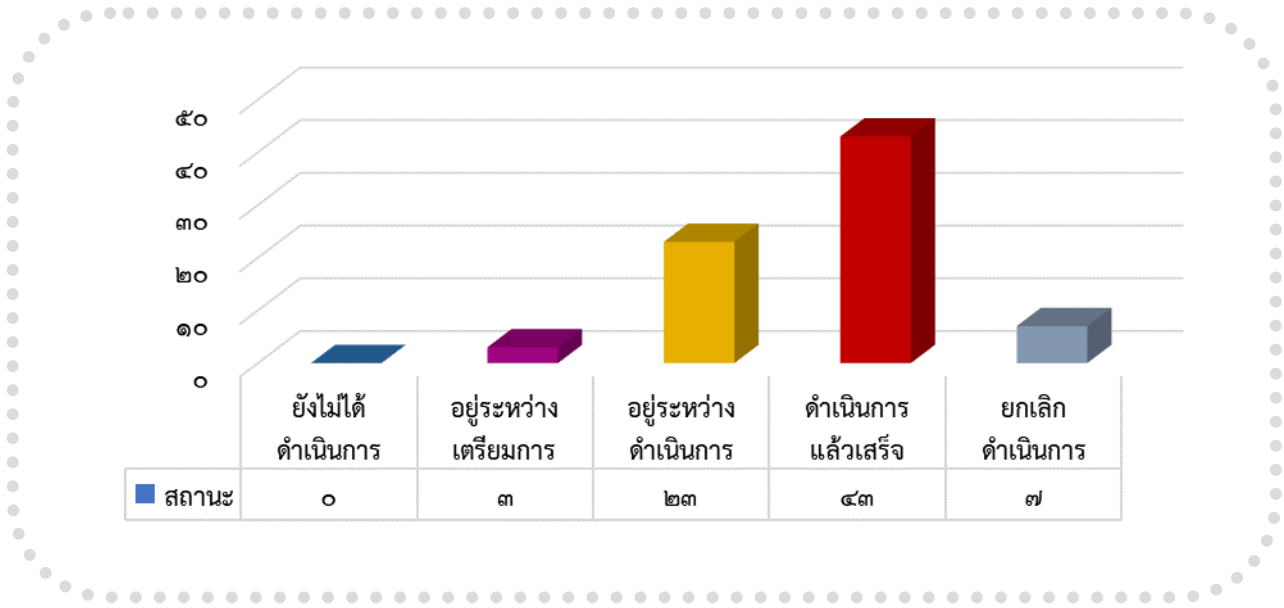

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๑๖ แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนกเป็น ๒ แผนงาน ๑๑ โครงการ ๓ งาน/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๗๘๓.๑๗๗ ล้านบาท ในภาพรวม ณ ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖ มีภารกิจที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน จำนวน ๑๐ แผนงาน/โครงการ/งาน อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๓ โครงการ และยกเลิกดำเนินการจำนวน ๓ โครงการ โดยเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๐๔๙.๓๖๓ ล้านบาท และสามารถก่อหนี้ผูกพันได้จำนวน ๔๒๔.๔๓๑ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๒,๔๗๓.๗๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๘ คงเหลือจำนวน ๓๐๙.๓๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๑๒ แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนกเป็น ๒ แผนงาน ๗ โครงการ ๓ งาน/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒๐๗.๐๗๑ ล้านบาท ในภาพรวม ณ ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖ มีภารกิจที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน จำนวน ๙ แผนงาน/โครงการ/งาน อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๒ โครงการ และยกเลิกดำเนินการจำนวน ๑ โครงการ โดยเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๗๕.๑๒๕ ล้านบาท และสามารถก่อหนี้ผูกพันได้จำนวน ๑๒.๓๖๘ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๑๘๗.๔๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๕๔ คงเหลือจำนวน ๑๙.๕๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๔๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๒๒ แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนกเป็น ๑ แผนงาน ๑๘ โครงการ ๓ งาน/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๙๑๕.๖๕๖ ล้านบาท ในภาพรวม ณ ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖ มีภารกิจที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน จำนวน ๙ แผนงาน/โครงการ/งาน อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๙ โครงการ อยู่ระหว่างเตรียมการก่อนเข้าสู่กระบวนการทางพัสดุฯ จำนวน ๓ โครงการ และยกเลิกดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ โดยเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗๐๙.๗๐๐ ล้านบาท และสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ จำนวน ๑๔๕.๙๗๒ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๘๕๕.๖๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๕ คงเหลือจำนวน ๕๙.๙๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๒๖ แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนก ๓ แผนงาน ๒๒ โครงการ ๑ งาน/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๒๕๗.๘๘๑ ล้านบาท ในภาพรวม ณ ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖ มีภารกิจที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน จำนวน ๑๕ แผนงาน/โครงการ/งาน อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๙ โครงการ และยกเลิกดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ โดยเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๙๑๓.๗๓๔ ล้านบาท และสามารถก่องหน้ผูกพันได้จำนวน ๑๕๓.๒๖๕ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๑,๐๖๖.๘๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๘๒ คงเหลือจำนวน ๑๙๐.๘๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑๘

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ณ ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับการพัฒนาธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล

ได้มีการดำเนินการเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนสำนักงาน กสทช. ให้เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลและสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน และก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ตลอดจนขับเคลื่อนแผนงานการบริการองค์กร แผนงานการบริหารยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร โดยในปี ๒๕๖๖ สำนักงาน กสทช. ได้รับรางวัลต่างๆ ที่แสดงถึงการขับเคลื่อนดำเนินการตามนโยบายในการยกระดับการขับเคลื่อนสำนักงานไปสู่สำนักงานดิจิทัล และเป็นองค์กรที่ปฏิบัติหน้าที่บนหลักธรรมาภิบาล อาทิ **๑) เกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรมสังกัดองค์กรอิสระภาครัฐและเอกชน รางวัลเชิดชูเกียรติ CHIEF INNOVATION OFFICER (CIO) จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมมหาชน) ที่เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมภายในองค์กร รวมถึงสร้างให้เกิดความภูมิใจในการเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนนวัตกรรมของประเทศไทยไปสู่การเป็น “ชาตินวัตกรรม”** **๒) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖** ด้วยคะแนน ๙๘.๔๘ ซึ่งเป็นอันดับที่ ๑ ของประเภทหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ที่เข้าร่วมการประเมิน **๓) รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี ๒๕๖๖ “DG Awards 2023” เป็นอันดับที่ ๑ ของประเทศไทย** ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) **๔) ประกาศนียบัตรรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) ๕) รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th) ๖) รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านบุคลากรดิจิทัล ๗) รางวัลชมเชย Cybersecurity Performance Excellence Awards 2023 ประเภทหน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล (Regulator) โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลเกียรติยศที่ทรงคุณค่าเพื่อมอบให้กับหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานสากล รวมถึงมีการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ๘) รางวัล ASOCIO 2023 ICT Award ในสาขา Digital Government Award โดยสมาพันธ์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และบริการแห่งภาคพื้นเอเชีย-โอเชียเนีย (Asian-Oceanian Computing Industry Organization: ASOCIO) และ ๙) รางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ระดับโล่มาตรฐานปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ จำนวน ๒ ปีซ้อน โดยโล่ประกาศเกียรติคุณดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) เป็นต้น โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ ๆ อาทิ**

๑) ดำเนินการสนับสนุนการยกระดับธรรมาภิบาลของสำนักงาน กสทช. อย่างยั่งยืน เพื่อรักษาระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของสำนักงาน กสทช. และยกระดับธรรมาภิบาลของสำนักงาน กสทช. ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืนให้บรรลุผลสำเร็จ เพื่อให้เกิดการยอมรับและเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน อาทิ

- จัดทำหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของสำนักงาน กสทช. สำหรับพนักงาน สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๗ หลักสูตร พร้อมจัดส่งผู้แทนเข้าร่วมอบรม/ศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับหน่วยงานภาครัฐในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน “ถอดบทเรียนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อสรุปปัจจัยความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข การปรับปรุงและพัฒนา รวมถึงวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีถัดไป โดยศึกษาจากปัจจัยความสำเร็จของหน่วยงาน ผลการประเมินของแต่ละตัวชี้วัด และนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกมีส่วนร่วมรับทราบและร่วมกันพัฒนาการปฏิบัติงาน/การให้บริการ/ขั้นตอนการดำเนินงานตามภารกิจให้ดีขึ้น

- จัดกิจกรรม The Best of NBTC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานสำนักงาน กสทช. ที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดี สามารถเป็นต้นแบบทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น The Best of NBTC ประจำปี ๒๕๖๖ รวมทั้งจัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น The Best of NBTC ประจำปี ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

- เข้าร่วมงานต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และจัดนิทรรศการของสำนักงาน กสทช. เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ในภารกิจต่อต้านการทุจริตด้วย และแสดงออกถึงการให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายนอกด้านการต่อต้านการทุจริต อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงาน กสทช. ผ่านการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดในการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตร่วมกันภายในงาน

- สร้างการรับรู้และความเข้าใจของสาธารณะในภารกิจด้านการบริหารคลื่นความถี่และกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม และภารกิจอื่น ๆ แก่หน่วยงานภายในและภายนอกสำนักงาน กสทช. ผ่านการสื่อสารประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ภายในองค์กร จำนวน ๓ เรื่อง อาทิ การจัดทำวารสารภายในองค์กร ประจำปี ๒๕๖๖ การผลิตสื่อ Infographic เพื่อการประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงาน กสทช. ๒๕๖๖ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประเภทต่างๆ อาทิ สื่อโซเชียลมีเดีย สื่อภาพยนตร์โฆษณาโทรทัศน์ สื่อภาพยนตร์สั้น ภาพยนตร์สารคดี ชุดละครสั้น สื่อวิทยุกระจายเสียง วิดีโอสั้น (Short Video) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) นิตยสาร หนังสือพิมพ์ สื่อนอกบ้าน (Out of home) ฯลฯ การจัดนิทรรศการ/งานสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจที่สำคัญขององค์กร การสร้างความตระหนักรู้การใช้งานเทคโนโลยีการสื่อสาร และเสริมสร้างองค์ความรู้ต่างๆ และการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และหนังสือพิมพ์ และการผลิตสื่อโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นต้น ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

- สนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยได้จัดทำแผนการจัดสรรทุนประเภทต่าง ๆ ประจำปีแล้วเสร็จ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ตามแผน รวมทั้งได้ดำเนินการโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และบริหารจัดการการเงินและระบบติดตามงานของสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา

๒) ดำเนินการสนับสนุนการยกระดับสำนักงาน กสทช. ให้มีสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล โดยได้พัฒนากระบวนการทำงานของสำนักงาน กสทช. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบปฏิบัติงานภายในสำนักงาน กสทช. เพื่อลดขั้นตอนและเวลาในการปฏิบัติภารกิจ การเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อยกระดับสำนักงาน กสทช. ไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยในปี ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการสำคัญ อาทิ

- ได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่ดีของสำนักงาน กสทช. แล้วเสร็จ ซึ่งส่งผลให้มีระบบบริหารจัดการข้อมูลของสำนักงาน กสทช. (NBTC Data Driven Portal) สำหรับการบริหารจัดการรายงานภายในระบบ เพื่อไปสู่องค์กรขับเคลื่อนและเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนด้วยข้อมูล

- ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับผู้ใช้งานภายในสำนักงาน กสทช. (NBTC Employee Portal) เพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับผู้ใช้งานภายในสำนักงาน กสทช. ให้มีเครื่องมือที่ช่วยบุคลากรในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ได้ด้วยตนเอง (Citizen Developer) แล้วเสร็จ ส่งผลให้สำนักงาน กสทช. มีโครงสร้างภาพรวมการเชื่อมโยงกระบวนการงานและระบบสารสนเทศของสำนักงาน กสทช. และสามารถเชื่อมโยงกลุ่มกระบวนการที่จะช่วยยกระดับกระบวนการทำงานให้สามารถเชื่อมโยงกันได้ในรูปแบบดิจิทัลส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น นำไปสู่วัฒนธรรมการทำงานดิจิทัล (Digital Culture) ของสำนักงาน กสทช.

- ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการการเข้าใช้งานแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On) แล้วเสร็จ ส่งผลให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบได้อย่างสะดวกและความปลอดภัยจากการใช้งานมากยิ่งขึ้น

- ได้เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ สำนักงาน กสทช. ในระดับเครือข่ายจากผู้ไม่หวังดีแล้วเสร็จ ส่งผลให้สำนักงาน กสทช. สามารถป้องกันการโจมตีเว็บไซต์และลดปริมาณการใช้งานทราฟฟิกขาเข้ามายังสำนักงาน กสทช.

- ได้ปรับปรุงระบบสารสนเทศสำหรับการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One-Stop Service) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นระบบในการบริหารสิทธิการเข้าถึงข้อมูลทั้งหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายใน ที่สามารถใช้ในการตรวจสอบสถานะการทำงานของระบบการทำงานได้แบบ Real time เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานส่วนงานบริการจัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรทุกประเภท ให้สามารถบริการข้อมูลแก่ประชาชนและบุคลากรภายในสำนักงาน กสทช. ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

- ได้ปรับปรุงการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 และจัดทำกระบวนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐาน ISO/IEC 27701:2019 โดยดำเนินการนำกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและกรอบมาตรฐานด้านข้อมูลส่วนบุคคลมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน ส่งผลให้สำนักงาน กสทช. ได้ผ่านการรับรองและได้รับใบรับรอง (CERTIFICATE) ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 และระบบบริหารจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลมาตรฐาน ISO/IEC 27701:2019 จากการตรวจประเมินจากบริษัท BSI Group ประเทศไทย จำกัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล

ได้มีการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนแผนงานพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และแผนงานสร้างองค์ความรู้ของบุคลากรให้มีขีดความสามารถทางวิชาการ

เพื่อรองรับการเป็นองค์กรชั้นนำในการกำกับดูแลที่มีความเป็นสากล ทั้งบุคลากรในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมและประชาชนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยได้ดำเนินงานสำคัญ ๆ อาทิ

๑) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะ **ความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญตามภารกิจ** มีความสามารถทางวิชาการ สามารถรองรับภารกิจต่าง ๆ และสามารถต่อยอดให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียมสื่อสารแล้วเสร็จ ได้แก่ การดำเนินโครงการทุนการศึกษาให้แก่บุคลากรสำนักงาน กสทช. และการพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน กสทช. ซึ่งได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานฯ ได้บรรลุผลสำเร็จ อาทิ

- จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานข่าว การจัดสัมมนาเรื่อง "สื่อสารอย่างไรให้สร้างสรรค์ และมีมาตรฐานในสื่อ" จัดค่ายฝึกอบรมเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกาศมืออาชีพ (Announcer Camp) ปีที่ ๖ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และตระหนักถึงความสำคัญของการทำหน้าที่สื่ออย่างมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

- จัดอบรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติการแปลสำหรับล่ามภาษามือในการบริการทางโทรทัศน์ ร่วมกับสมาคมล่ามภาษามือแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มืล่ามภาษามือ (Sign Language) และพัฒนาทักษะในการล่ามให้มีคุณภาพและคนพิการที่รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุด

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการออกแบบและติดตั้งระบบรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล เพื่อการป้องกันสัญญาณรบกวนจากเทคโนโลยี 5G สำหรับงานระบบอาคารและที่พักอาศัย ส่งผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล การเลือกใช้อุปกรณ์ในการติดตั้งภาครับเทคนิคการติดตั้งและดูแลระบบ รวมทั้งการป้องกันสัญญาณรบกวนจากเทคโนโลยี 5G

- จัดอบรมผู้ทดสอบการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างความเข้าใจ และแนะนำเทคนิคในการประยุกต์ใช้สำหรับการทดสอบการแพร่แปลกปลอม ให้สามารถใช้เครื่องวัดที่มีประสิทธิภาพสูงและประยุกต์ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ตโฟนร่วมกับระบบได้อย่างเหมาะสมกับงาน และเพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการกำกับดูแลของสำนักงาน กสทช. เป็นอย่างดี

- จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับผู้ประกอบกิจการหน่วยงานของรัฐและประชาชนทั่วไป และจัดอบรมการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน (ผู้ชมผู้ฟัง) ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำปี ๒๕๖๖ ส่งผลให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าฟังเฝ้าชมสื่อวิทยุและโทรทัศน์ และแจ้งข้อมูลให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ได้อย่างเป็นระบบ รวดเร็วมีประสิทธิภาพ

- จัดอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์คลื่นความถี่ สำหรับหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Synthesizer) เพื่อสามารถใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

- จัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นให้กับบุคลากรสำนักงาน กสทช. ทำให้บุคลากรของสำนักงาน กสทช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น

- จัดอบรมพัฒนาวิทยากรด้านวิทยุคมนาคมให้กับบุคลากรสำนักงาน กสทช. (Train the Trainer) เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ให้สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกได้

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการกำกับดูแลอัตรากิจการโทรคมนาคมและอัตราค่าบริการโทรคมนาคม รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในภารกิจของสำนักงาน กสทช. อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนผลกระทบและสิทธิที่ผู้บริโภคได้รับจากการกำกับดูแลที่โปร่งใสและเป็นธรรม

- จัดอบรมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ อาทิ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างแนวคิดเชิงบวกในการทำงานภายใต้ภาวะของการเปลี่ยนแปลง ประจำปี ๒๕๖๖ การจัดสัมมนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านโทรทัศน์ การจัดอบรมการใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ในการผลิตรายการโทรทัศน์ การจัดอบรม “เสริมทักษะการผลิตรายการพอดแคสต์อย่างมืออาชีพ” การจัดอบรมเขียนแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารสถานีวิทยุคดิจิทัล การจัดอบรมหลักสูตรด้านวิศวกรรมโทรทัศน์ ประจำปี ๒๕๖๖ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมกลไกการกำกับดูแลร่วมกัน เพื่อส่งเสริมกลไกการกำกับดูแลร่วมกันด้านการส่งเสริมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “มาตรฐานการสื่อข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้งสำหรับผู้สื่อข่าวในประเทศไทย” การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เป็นต้น โดยได้จัดทำรายการศึกษาวิจัยผลการอบรมบุคลากร ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรในการจัดอบรมบุคลากร ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต่อไป ซึ่งส่งผลให้บุคลากรในกิจการโทรทัศน์ได้ยกระดับมาตรฐานด้านการประกอบวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ รวมทั้งส่งเสริมกลไกการกำกับดูแลร่วมกันด้านการส่งเสริมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ

๒) **ศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ รวมทั้งสนับสนุนงานทางด้านวิชาการ** อาทิ ได้ดำเนินการการศึกษาและวิเคราะห์เศรษฐกิจ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายต่อระบบเศรษฐกิจและเผยแพร่แก่ประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยปัจจุบันได้ดำเนินการศึกษาเพื่อจัดทำแบบจำลองดุลยภาพทั่วไป (Computable General Equilibrium Model) สำหรับการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงกว้าง (ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช. และ Victoria University ประเทศออสเตรเลีย) แล้วเสร็จ โดยสามารถนำแบบจำลองดุลยภาพทั่วไปที่พัฒนาขึ้นมาใหม่มาใช้ในการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อนโยบายของ กสทช. ที่จะกำหนดขึ้นในอนาคต เพื่อให้ กสทช. ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจต่อไป และได้ร่วมมือกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย เพื่อสร้างความร่วมมือในการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการด้านสถิติ และร่วมมือสนับสนุนการปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและดำเนินงาน โดยดำเนินการจัดทำชุดข้อมูลแบบสำรวจสำหรับกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งผลให้สำนักงาน กสทช. ได้นำข้อมูลจากการสำรวจไปใช้ในการจัดทำดัชนีราคาในกิจการโทรทัศน์ นำไปใช้ในการจัดทำบทความวิชาการใน รวมทั้งอยู่ระหว่างการจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับสายงานวิชาการ (Strategic Database System : SDS) เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับสายงานวิชาการให้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูลด้านวิชาการที่จำเป็น สามารถเข้าถึงข้อมูลวิชาการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว พร้อมทั้งพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางวิชาการ กสทช. (NBTC Research Hub) สำหรับเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิจัย รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลด้านวิชาการ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นต่อการศึกษาเชิงวิชาการจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกสำนักงาน กสทช. เป็นต้น

๓) **การจัดทำและนำเสนอผลงานวิชาการเผยแพร่สาธารณะ** อาทิ (๑) ได้จัดทำวารสารวิชาการ “NBTC Telecom and Broadcasting Barometer” ประกอบด้วย บทความทางวิชาการ และบทวิเคราะห์สภาพตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ซึ่งได้ดำเนินการรวบรวม

ข้อมูล ศักยภาพวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบเป็นพื้นฐานในการจัดทำนโยบายผ่านการใช้อยู่หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based policy) และวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายและมาตรการอย่างรอบด้านก่อนการนำไปใช้จริง โดยข้อมูลที่นำเสนอในวารสารดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลงในทุกช่วงสถานการณ์ประจำปี สะท้อนให้เห็นภาพรวมของกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ซึ่งเป็นภาคส่วน (Sector) ที่สำคัญของประเทศไทย ทั้งในปัจจุบันและมากยิ่งขึ้นไปอีกในอนาคต ขณะเดียวกันยังเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะช่วยให้ กสทช. นำไปใช้ในการวางกฎกติกาในการกำกับดูแล Sector นี้ได้อย่างรอบด้านและรวดเร็ว (๒) ร่วมกับมหาวิทยาลัยวิกตอเรีย (Victoria University) : Centre of Policy Studies (CoPs) จัดทำแบบจำลอง Computable General Equilibrium (CGE) ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายต่อระบบเศรษฐกิจทั้งประเทศได้ อาทิ การวิเคราะห์อุตสาหกรรมใดได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์ การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) เป็นต้น โดยแบบจำลองดังกล่าวแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรมการผลิตจำนวน ๑๘๐ อุตสาหกรรม รวมถึงจำแนกกลุ่มประชาชนตามลำดับรายได้ ๕ ชั้น ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้จัดอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้แบบจำลองดังกล่าวให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจาก CoPs เป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว

๔) การสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับหน่วยงานระหว่างประเทศ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการในระดับนานาชาติ อาทิ

- จัดประชุม Regulatory Network Meeting (RNM 2023) ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมดุสิตธานี ลาгуนา ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านนโยบายการกำกับดูแลและข้อมูลเชิงลึกของผู้แทนหน่วยงานระดับสูง องค์กรกำกับดูแล และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศและในประเทศ ซึ่งการประชุมหรือ RNM 2023 ถือได้ว่าเป็นเวทีที่ Policy Stakeholders จากทั่วโลก ได้ขับเคลื่อนแนวทางในการกำกับดูแลด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีการสื่อสารร่วมกัน เพื่อนำไปสู่ความสมดุลด้านนโยบายที่การกำกับดูแลสามารถนำไปสู่การแข่งขันและเศรษฐกิจที่ดีขึ้น กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมในอุตสาหกรรม ในขณะที่ก็สามารถปกป้องประโยชน์ของผู้บริโภคและสังคมโดยรวม

- จัดประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๑๖ (The 16th International Telecommunications Society Asia - Pacific Regional Conference (ITS Asia - Pacific 2023) ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทล แอนด์ ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ หน่วยงานกำกับดูแล (Regulator) ผู้กำหนดนโยบาย (Policymaker) ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) นักวิชาการอิสระและภาคการศึกษา (Academic) ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและประเด็นความท้าทายทางด้านเทคโนโลยีและโทรคมนาคมผ่านเวทีการประชุมหลัก (Plenary session) ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงาน กสทช. กับ Ritsumeikan Asia Pacific University เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ สำนักงาน กสทช.

- จัดสัมมนานำเสนอผลงานวิชาการ “NBTC Academic and Futuristic Conference 2023” (NAFC 2023) ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ สำนักงาน กสทช. ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการสร้างคลังความรู้ในงานวิชาการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาขีดความสามารถการบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของประเทศชาติและประชาชน และยกระดับศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค
เพื่อการกำกับดูแลและการบริการประชาชน

ได้มีการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจการบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียมของประเทศให้มีความมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและแผนของชาติที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการบริหารคลื่นความถี่และกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค และเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและกำกับดูแลคลื่นความถี่ โดยได้มีการดำเนินงานที่สำคัญ ๆ อาทิ

๑) ได้จัดทำ (ร่าง) แนวทางการอนุญาตกิจการประจำที่ผ่านดาวเทียมในย่านความถี่ ๒๗ - ๒๗.๕ กิกะเฮิรตซ์ และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการประจำที่ผ่านดาวเทียม ย่านความถี่ ๒๗.๕ - ๓๑ กิกะเฮิรตซ์ แล้วเสร็จ พร้อมทั้งจัดประชุมหารือกลุ่มย่อย เรื่อง การจัดทำ (ร่าง) ประกาศเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่ ย่าน ๒๘ กิกะเฮิรตซ์ ทั้ง ๒ ฉบับ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว โดยประชุมคณะอนุกรรมการด้านคลื่นความถี่และมาตรฐานทางเทคนิค ได้มีมติรับทราบการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่ย่าน ๒๘ กิกะเฮิรตซ์ และเห็นชอบ (ร่าง) แนวทางการอนุญาตกิจการประจำที่ผ่านดาวเทียมในย่านความถี่ ๒๗ - ๒๗.๕ กิกะเฮิรตซ์ ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอเรียบร้อยแล้ววันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๒) ได้ดำเนินการสนับสนุนภารกิจบริหารกิจการดาวเทียม ในการสนับสนุนภารกิจด้านกิจการดาวเทียมสื่อสาร การบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน และเป็นไปตามข้อบังคับวิญญูของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ และพันธกรณีระหว่างประเทศ โดยได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกิจการดาวเทียมประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจกำกับดูแลกิจการดาวเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนแล้ว จำนวนทั้งสิ้น ๑๖ ครั้ง พร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความเห็นเฉพาะกลุ่ม (focus group) ต่อแนวทางการแก้ไขปรับปรุงประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศแล้วจำนวน ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตามลำดับ และได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศ โดยที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ได้มีมติเห็นชอบให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้ดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศ เพื่อนำความคิดเห็นที่ได้มาประกอบการพิจารณาก่อนออกประกาศที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป โดยสำนักงาน กสทช. ได้กำหนดระยะเวลารับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ - วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการปรับปรุงร่างประกาศหลังรับฟังความคิดเห็นและนำเสนอ กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศบังคับใช้ภายในไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๗ ต่อไป

๓) ได้ดำเนินการสนับสนุนภารกิจพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการบริหารคลื่นความถี่และกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ โดยได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ จำนวน ๗๕ การประชุม รวมทั้งเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระหว่างประเทศ จำนวน ๗ การประชุม อาทิ การประชุม Girls in ICT Day Thailand 2023 การประชุมหารือทวิภาคี ครั้งที่ ๓ ระหว่างสำนักงาน กสทช. และหน่วยงาน The President of the Office of Electronic Communications (UKE) สาธารณรัฐโปแลนด์ การประชุม International Symposium on Digital Inclusion การประชุมเชิงวิชาการ APT Symposium 2023 การประชุม ITU cademy Training Centre 2023 (ITU ATC

2023) การประชุมเชิงปฏิบัติการ Telecommunications Regulatory Policies and the Future of Digital Trade และ การประชุม NBTC International OTT Symposium in Digital Ecosystem เป็นต้น

๔) ได้ดำเนินการยกระดับศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลและการบริการประชาชน ในด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการวิทยุคมนาคม แล้วเสร็จ อาทิ

- จัดหาและพัฒนารถออกใบอนุญาตเคลื่อนที่ของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค ส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการการออกใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ นอกสถานที่ได้ อย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

- ดำเนินโครงการจัดเก็บและบูรณาการระบบตรวจสอบและควบคุมสถานีตรวจสอบความถี่ระยะไกล ส่งผลให้สำนักงาน กสทช. มีระบบตรวจสอบและควบคุมชุดอุปกรณ์ Sensor ติดตั้งประจำสถานีตรวจสอบความถี่ระยะไกลเพิ่มเติม เพื่อจัดเก็บข้อมูลและบูรณาการระบบตรวจสอบและควบคุมชุดสถานีตรวจสอบความถี่ระยะไกลระหว่างสำนักงาน กสทช. ส่วนกลาง และสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค

- จัดหาเครื่องสแกนความถี่และค้นหาตำแหน่งสถานีส่งสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ ส่งผลให้สำนักงาน กสทช. ภาค/เขต สามารถปฏิบัติหน้าที่ติดตามตรวจสอบฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีความพร้อมในด้านเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบคลื่นความถี่และสามารถรองรับเทคโนโลยีในปัจจุบันและในอนาคต

- จัดหาเครื่องมือตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุในการตรวจสอบข่ายสื่อสารการจัดงานพระราชพิธีฯ ส่งผลให้การตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุประเภทเทคโนโลยีสูงของสำนักงาน กสทช. ภาค ๑ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และสามารถนำข้อมูลตรวจสอบมาประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานได้รวดเร็ว

- พัฒนาระบบต้นแบบสำหรับการบริหารจัดการความถี่วิทยุและการตรวจสอบคลื่นความถี่ของศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่แห่งชาติ เพื่อสามารถบูรณาการข้อมูลการตรวจสอบจากทุกหน่วยงานของสำนักงาน กสทช. ผ่านกระบวนการตรวจสอบที่ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย และเชื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจสอบและบูรณาการเข้ากับระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคลื่นความถี่ที่สามารถนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจและวางนโยบายด้านการบริหารคลื่นความถี่ของประเทศได้อย่างยั่งยืน

- ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์และถอดเสียงการออกอากาศวิทยุกระจายเสียง ซึ่งจะส่งผลให้สำนักงาน กสทช. มีระบบวิเคราะห์และถอดเสียงการออกอากาศวิทยุกระจายเสียง ช่วยในการถอดเสียงและวิเคราะห์ข้อมูลประเภทเสียงที่มีใช้งานจากการบันทึกข้อมูล การออกอากาศวิทยุกระจายเสียง และยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเนื้อหารายการและโฆษณาของวิทยุกระจายเสียงให้สะดวก รวดเร็ว มีความเป็นอัตโนมัติ และสามารถลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้มากขึ้น

- ดำเนินโครงการสถานีเฝ้าระวังการแพร่กระจายคลื่นเพื่อการกำกับดูแลของสำนักงาน กสทช. ภาค ๔ ส่งผลให้สำนักงาน กสทช. มีชุดสถานีเฝ้าระวังการแพร่กระจายคลื่นที่เป็นสถานีเฝ้าระวังการแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบตลอดเวลา ในพื้นที่ที่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากการรบกวนทางสัญญาณต่ออุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่มีความไวต่อผลตอบสนองทางคลื่นความถี่และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ โรงพยาบาล โรงเรียน ย่านชุมชน เป็นต้น จำนวน ๓ สถานี เพื่อพัฒนาการเฝ้าระวังและการตรวจสอบการแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าให้ครอบคลุมในย่านความถี่เพิ่มขึ้น และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการกำกับดูแลด้านการแพร่กระจายคลื่นของสำนักงาน กสทช. ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม กทช. มท.๕๐๐๑ - ๒๕๕๐ รวมทั้งสอดคล้องตามพันธกิจตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์ จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาศักยภาพในการกำกับดูแลและส่งเสริมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

ได้มีการดำเนินการเพื่อสนับสนุนภารกิจในการขับเคลื่อนแผนงานบริหารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมอย่างเสรีและเป็นธรรม ส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียง และโทรทัศน์ รวมถึงคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยได้มีการ ดำเนินงานที่สำคัญ ๆ อาทิ

๑) ดำเนินการศึกษาแนวทางในการพัฒนาหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ไทยให้สอดคล้องกับ ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วเสร็จ โดยได้ศึกษาหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ ในปัจจุบันครอบคลุมทุกมิติที่สมควรปรับเปลี่ยน เพื่อให้ได้แนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุง หลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมและการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลง ไป พร้อมทั้งบทสรุปที่สำคัญจากงานวิจัยภายใต้โครงการฯ เป็นหนังสือ เรื่อง "นิเวศสื่อโทรทัศน์ไทยกับแนวทางการ กำกับดูแลในยุคสตรีมมิ่ง" ซึ่งได้จัดการประชุมเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา ณ สำนักงาน กสทช. แล้วตลอดจนรวบรวม ความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ไทย นำมาพัฒนา แนวทางการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ไทยให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมและ การแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป

๒) ดำเนินการพัฒนาศักยภาพในการกำกับดูแลและส่งเสริมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคม แล้วเสร็จ อาทิ การติดตามประเมินผลงานในมิติเชิงสังคมโดยใช้ซีบีโมเดล (CIPP Model) สำหรับสายงาน กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ส่งผลให้สำนักงาน กสทช. มีรายงานข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการในมิติทาง สังคมในภาพรวม ที่สามารถใช้เสนอต่อระดับนโยบายและประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการผลักดันงานมิติเชิงสังคม ให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นต่อไป การดำเนินการพัฒนาระบบรองรับการเปลี่ยนผ่านการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง และโทรทัศน์ ส่งผลให้สำนักงาน กสทช. มีระบบรองรับการเปลี่ยนผ่านการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและ โทรทัศน์ สำหรับรองรับกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้งานคลื่นความถี่ และประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพื่อรองรับการบริการด้านการอนุญาตและการกำกับดูแลเกี่ยวกับ กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ การพัฒนาระบบการตรวจค้นและจับกุมตามกฎหมาย ส่งผลให้ปัจจุบันสามารถ ใช้งานระบบฯ ได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ oneforall.nbtc.go.th ทำให้สามารถตรวจสอบและควบคุมการ ทำงานให้เป็นไปตามความเหมาะสม สอดคล้องกับแผนงานและสถานการณ์ปัจจุบัน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการใช้ และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม สามารถใช้เป็นช่องทางในการประสานงานและกำกับดูแลผู้รับใบอนุญาตประกอบ กิจการโทรคมนาคมให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง การจ้างพัฒนาฐานข้อมูลกิจการ โทรคมนาคม และระบบรายงานเชิงวิเคราะห์เพื่อการบริหารงานข้อมูลกิจการโทรคมนาคมส่งผลให้สำนักงาน กสทช. มีฐานข้อมูลกิจการโทรคมนาคมที่เกิดจากการเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากหลายๆ ระบบ รวมทั้งมีรายงานเชิงวิเคราะห์ เพื่อการบริหารงานข้อมูลสายงานกิจการโทรคมนาคม จากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งทำให้สำนักงาน กสทช. มีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายต่างๆ จากรายงานเชิงวิเคราะห์ เพื่อการบริหารงานข้อมูลกิจการ โทรคมนาคม การจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ Any Registration ส่งผลให้ สำนักงาน กสทช. มีระบบ Any Registration ที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพแล้ว พร้อมให้บริการประชาชน ซึ่งจะทำให้ ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการขอรับอนุญาตกับสำนักงาน กสทช.

๓) ดำเนินโครงการปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอดสดและรายงานข่าวการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมที่สำคัญของประเทศ ไทยแล้วเสร็จ ส่งผลให้สำนักงาน กสทช. มีการพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือระบบด้านเทคนิคสำหรับการออกอากาศ

และมีระบบป้องกันอัคคีภัยในศูนย์ถ่ายทอดสดฯ ซึ่งทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพร้อมในการทำงานของศูนย์ถ่ายทอดสดฯ ให้มากยิ่งขึ้น

๔) จัดทำระบบบริหารจัดการแก้ไขสายสื่อสารเพื่อความปลอดภัยของประชาชน (p-safe) เพื่อให้สำนักงาน กสทช. สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนและติดตามการดำเนินการของผู้ประกอบกิจการได้อย่างรวดเร็ว ลดโอกาสในการเกิดอันตรายต่อประชาชน ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากสายสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์ ที่ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีจำนวนสิทธิ์การใช้งานเพิ่มขึ้น เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก และเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวม วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลที่อยู่บนเครือข่ายเว็บและโซเชี่ยลของสำนักงาน กสทช. ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เท้าทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

๕) ปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพช่องทางติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนในด้านกิจการโทรคมนาคมร่วมกับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ให้สามารถดำเนินการเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง Web Portal ในการส่งเรื่องร้องเรียนพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแจ้งเตือนผู้รับใบอนุญาตในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน และรายงานสถานะความคืบหน้าผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้สำนักงาน กสทช. ทราบ

๖) ดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม

ทั้งนี้ รายละเอียดความก้าวหน้าของการดำเนินการฯ ตามแผนปฏิบัติการฯ ปรากฏในภาคผนวก

๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการดำเนินงาน

๓.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบควรศึกษาข้อมูลก่อนเริ่มดำเนินการจัดทำโครงการ และศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดจ้างตามกระบวนการพัสดุ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การยื่นเอกสารในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ เพื่อลดจำนวนการล่าช้าของการดำเนินงาน และการยกเลิกโครงการที่อาจเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากจำนวนผู้ยื่นข้อเสนอ/เอกสารไม่ตรงตามที่ระเบียบกำหนด หรือจากความซ้ำซ้อนของรายละเอียดตามขอบเขตงาน (TOR) โครงการ โดยในกรณีการยกเลิกการดำเนินโครงการ หรือเกิดความขัดข้องระหว่างดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้องใหม่โดยเร็วให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

๓.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบควรบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ/งานตามยุทธศาสตร์และเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยเร่งรัดติดตาม และบริหารโครงการให้เป็นไปตามแผนงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด รวมทั้ง เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน โดยมีการกำหนดแนวทางในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนดำเนินโครงการ และมีการติดตามความก้าวหน้าระหว่างดำเนินโครงการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการควรเตรียมความพร้อมต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินงาน หรือก่อนนี้ผูกพันได้ตั้งแต่ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ ทั้งนี้ไม่ควรเกินกว่าไตรมาสที่ ๑ เพื่อขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์ให้แล้วเสร็จ และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กำหนดในปีงบประมาณนั้น หากไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ภายในไตรมาสที่ ๒ เนื่องจากพบความเสี่ยงอันเกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรืออาจเกิดปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้การดำเนินงาน/โครงการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ ควรเร่งทบทวนและปรับแผนการดำเนินงานและแผนประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรไว้ไปใช้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๓.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบควรเริ่มวางแผนการดำเนินงานและขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีถัดไปอย่างมีประสิทธิภาพ และควรศึกษาแนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. เป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้

๓.๓ หน่วยงานผู้รับผิดชอบควรจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และประโยชน์ที่ได้ภายหลังการดำเนินงาน/โครงการ โดยมีการถอดบทเรียนเพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงการดำเนินการ

๓.๔ ทุกหน่วยงานควรมีการเตรียมความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน ตามภารกิจงานของแต่ละสำนัก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ที่อาจทำให้เกิดข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานตามปกติ ที่จะส่งผลให้การดำเนินงาน/โครงการไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

๓.๕ สำนักงานฯ ควรนำความเห็นและข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่ให้มีการกำหนดตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการฯ ให้ชัดเจน ในเชิงปริมาณเชิงคุณภาพ เชิงเวลา และเชิงค่าใช้จ่าย ให้ครบถ้วน และปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้เข้มข้นขึ้นสอดคล้องกับตัวชี้วัดระดับสำนักงานฯ

สำนักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ
ส่วนวิชาการและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์

ภาคผนวก
ความก้าวหน้าของการดำเนินการฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับการพัฒนาธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	แผน ร้อยละ	ความก้าวหน้า ดำเนินการฯ ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	แผนงานบริหารองค์กร	๑๐๐.๐๐	๗๗.๐๓	
๒	แผนงานบริหารยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร	๑๐๐.๐๐	๙๓.๑๑	
๓	งานสร้างการรับรู้และความเข้าใจของสาธารณะในการบริหารคลื่นความถี่และกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมและกิจการดาวเทียม	๑๐๐.๐๐	๙๕.๕๘	
๔	งานสนับสนุนการยกระดับธรรมาภิบาลของสำนักงาน กสทช. อย่างยั่งยืน	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๕	งานสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๖	โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และบริหารจัดการการเงินและระบบติดตามงานของสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา	๑๐๐.๐๐	๕๕.๐๐	
๗	โครงการเตรียมความพร้อมไปสู่องค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization)	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๘	โครงการจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศสำหรับการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One-Stop Service) ของสำนักงาน กสทช.	๑๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	
๙	โครงการป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ สำนักงาน กสทช. ในระดับเครือข่าย	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑๐	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเข้าใช้งานแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On)	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑๑	โครงการจ้างปรับปรุงระบบงาน ERP เพื่อรองรับการทำงานตามผังโครงสร้างองค์กรใหม่	๑๐๐.๐๐	-	ยกเลิก ดำเนินการ
๑๒	โครงการจ้างปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และระบบ HRSS ของ สำนักงาน กสทช.	๑๐๐.๐๐	-	ยกเลิก ดำเนินการ
๑๓	โครงการระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและระบบประกอบอาคาร อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่	๑๐๐.๐๐	-	ยกเลิก ดำเนินการ
๑๔	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่	๑๐๐.๐๐	๘๙.๗๗	
๑๕	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจจับและติดตามความเคลื่อนไหวของครุภัณฑ์ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี RFID (ระยะที่ ๓)	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑๖	โครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับผู้ใช้งานภายในสำนักงาน กสทช. (NBTC Employee Portal)	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
	เฉลี่ยรวม	๑๐๐.๐๐	๗๕.๐๓	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพให้มีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	แผน ร้อยละ	ความก้าวหน้า ดำเนินการฯ ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	แผนงานบริหารสถาบันวิทยาการและการเสริมสร้างสำนักงาน กสทช. ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	๑๐๐.๐๐	๙๒.๘๖	
๒	แผนงานสร้างองค์ความรู้ของบุคลากรให้มีขีดความสามารถทางวิชาการเพื่อรองรับการเป็นองค์กรชั้นนำในการกำกับดูแลที่มีความเป็นสากล	๑๐๐.๐๐	๙๓.๕๑	
๓	งานพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	๑๐๐.๐๐	๗๘.๘๒	
๔	งานพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และประชาชนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	๑๐๐.๐๐	๙๗.๑๑	
๕	งานพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคมและประชาชน ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	๑๐๐.๐๐	๙๒.๗๑	
๖	โครงการพัฒนาระบบฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ของสำนักงาน กสทช.	๑๐๐.๐๐	-	ยกเลิกดำเนินการ
๗	โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ สำหรับพนักงานประจำปี ๒๕๖๕	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๘	โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ สำหรับพนักงานประจำปี ๒๕๖๖	๑๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	
๙	โครงการระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์แบบสื่อสารหลากหลายช่องทาง Omni-Channel Contact Center	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑๐	โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแบบจำลองดุลยภาพทั่วไป (Computable General Equilibrium Model) สำหรับการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงกว้าง (ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช. และ Victoria University ประเทศออสเตรเลีย)	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑๑	โครงการจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับสายงานวิชาการ (Strategic Database System : SDS)	๑๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	
๑๒	โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
	เฉลี่ยรวม	๑๐๐.๐๐	๘๒.๐๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาขีดความสามารถการบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน และยกระดับศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค เพื่อการกำกับดูแลและการบริการ

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	แผน ร้อยละ	ความก้าวหน้า ดำเนินการฯ ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	แผนงานบริหารคลื่นความถี่ กำกับดูแลกิจการดาวเทียมและบริหารกิจการส่วนภูมิภาค	๑๐๐.๐๐	๙๐.๔๓	
๒	งานขับเคลื่อนภารกิจการบริหารคลื่นความถี่ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของชาติที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไป	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓	งานขับเคลื่อนภารกิจกำกับดูแลกิจการดาวเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน	๑๐๐.๐๐	๖๓.๑๑	
๔	งานการประชุมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการบริหารคลื่นความถี่และกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๕	โครงการจัดหาและพัฒนาารถออกไปอนุญาตเคลื่อนที่ของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค จำนวน ๑ คัน	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๖	โครงการจัดเก็บและบูรณาการระบบตรวจสอบและควบคุมสถานีตรวจสอบความถี่ระยะไกล	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๗	โครงการจัดหาเครื่องสแกนความถี่และค้นหาตำแหน่งสถานีส่งสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔ ชุด	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๘	โครงการพัฒนาระบบต้นแบบสำหรับการบริหารจัดการความถี่วิทยุและการตรวจสอบคลื่นความถี่ของศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่แห่งชาติ	๑๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	
๙	โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์และถอดเสียงการออกอากาศวิทยุกระจายเสียง	๑๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	
๑๐	โครงการจัดหาชุดสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล จำนวน ๕ สถานี	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๑	โครงการจัดหาเครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นความถี่วิทยุ ชนิด Realtime Bandwidth แบบสะพานยี่ห้อ ย่านความถี่ 10 MHz - 42 GHz จำนวน ๒๒ ชุด	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามและรายงานการตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้ความถี่ด้วยเทคโนโลยี Video Streaming	๑๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	
๑๓	โครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๔๘ ชุด	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๔	โครงการเครื่องมือตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุในการตรวจสอบข่ายสื่อสารการจัดงานพระราชพิธีของสำนักงาน กสทช. ภาค ๑ จำนวน ๕ สถานี	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑๕	โครงการจัดทำต้นแบบศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่ของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑๖	โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ พร้อมอาคารประกอบ	๑๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	
๑๗	โครงการบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒	๑๐๐.๐๐	-	ยกเลิก ดำเนินการ
๑๘	โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒	๑๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	แผน ร้อยละ	ความก้าวหน้า ดำเนินการฯ ร้อยละ	หมายเหตุ
๑๙	โครงการก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงาน กสทช. เขต ๓๔	๑๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	
๒๐	โครงการสถานีเฝ้าระวังการแพร่กระจายคลื่นเพื่อการกำกับดูแลของสำนักงาน กสทช. ภาค ๔	๑๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	
๒๑	โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๓๔ (เชียงใหม่)	๑๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	
๒๒	โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. ภาค ๓	๑๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	
	เฉลี่ยรวม	๑๐๐.๐๐	๖๒.๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาศักยภาพในการกำกับดูแลและส่งเสริมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	แผน ร้อยละ	ความก้าวหน้า ดำเนินการฯ ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	แผนงานบริหารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๘๘.๙๒	
๒	แผนงานบริหารกิจการโทรคมนาคม	๑๐๐.๐๐	๗๘.๙๗	
๓	แผนงานสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียมสื่อสาร	๑๐๐.๐๐	๑๐.๑๕	
๔	งานสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เพื่อดำเนินการเกี่ยวเนื่องทางด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ โทรคมนาคม หรือด้านวิทยุคมนาคมที่จัดขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือสาธารณกุศล	๑๐๐.๐๐	๙๙.๘๗	
๕	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๖	โครงการศึกษาแนวทางในการพัฒนาหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ไทยให้สอดคล้องกับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๗	โครงการติดตามประเมินผลงานในมิติเชิงสังคมโดยใช้ชิปโมเดล (CIPP Model) สำหรับสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๘	โครงการจ้างพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อยกระดับข้อมูลในรูปแบบ Data Visualization สำหรับสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	-	ยกเลิก ดำเนินการ
๙	โครงการปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอดสดและรายงานข่าวการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมที่สำคัญของประเทศไทย	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑๐	โครงการพัฒนาระบบรองรับการเปลี่ยนผ่านการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑๑	โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และตรวจสอบเนื้อหารายการ	๑๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	
๑๒	โครงการความร่วมมือการผลิตข่าวในพระราชสำนัก และการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธี และรัฐพิธี สำหรับการใช้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑๓	โครงการสำรวจพฤติกรรมและวิเคราะห์ข้อมูลความนิยมของผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย	๑๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	
๑๔	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการตรวจมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง	๑๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	
๑๕	โครงการระบบตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายจากการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ระดับภูมิภาค ระยะที่ ๒	๑๐๐.๐๐	-	ยกเลิก ดำเนินการ
๑๖	โครงการจ้างพัฒนาฐานข้อมูลกิจการโทรคมนาคม และระบบรายงานเชิงวิเคราะห์เพื่อการบริหารงานข้อมูลกิจการโทรคมนาคม	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑๗	โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยออนไลน์ แอปพลิเคชัน (ปีที่ ๓)	๑๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	
๑๘	โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	๑๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	แผน ร้อยละ	ความก้าวหน้า ดำเนินการฯ ร้อยละ	หมายเหตุ
๑๙	โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการแก้ไขสายสื่อสารเพื่อความปลอดภัยของประชาชน (p-safe)	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒๐	โครงการพัฒนาระบบการตรวจค้นและจับกุมตามกฎหมาย	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒๑	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลบริการค้าส่งในกิจการโทรคมนาคม (Telecom Wholesale Roadmap)	๑๐๐.๐๐	๕๒.๐๐	
๒๒	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม	๑๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	
๒๓	โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อภาพยนตร์โฆษณาภารกิจภายใต้แผนการจัดให้มีบริการ USO ประจำปี ๒๕๖๖	๑๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	
๒๔	โครงการปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพช่องทางติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนในด้านกิจการโทรคมนาคมร่วมกับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม	๑๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	
๒๕	โครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ Any Registration	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒๖	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
	เฉลี่ยรวม	๑๐๐.๐๐	๗๒.๑๑	

รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖																				
ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของารดำเนิน โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)		ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/ กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของงาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ			
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				ยกเลิก	เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด
๑	แผนงานบริหารองค์กร	กท.	๖๘๗.๕๑๘	๖๘๗.๕๑๘	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลของ สำนักงาน กสทช. อย่างยั่งยืน			✓									
๑	แผนงานบริหารยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร	กท.	๑,๕๒๒.๑๐๒	๑,๕๒๒.๑๐๒	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาสำนักงาน กสทช. ให้เป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็ม รูปแบบ และยกระดับ กระบวนการทำงานและการ ให้บริการ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกและ ให้บริการแก่ประชาชน												
๑	งานสร้างการรับรู้และความเข้าใจของ สาธารณะในการบริหารคดีความคดีและ กำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมและการ ความถี่	สท.	๑๑๔.๒๘๖	๑๑๔.๒๘๖	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ ในการจัดการบริหารคดี ความถี่และกำกับดูแลกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และการ กิจการโทรคมนาคม และกิจการ หน่วยงานภายในและภายนอก สำนักงาน กสทช. ผ่านการ สื่อสารประชาสัมพันธ์ ปฏิสัมพันธ์ของ กสทช. และ สำนักงาน กสทช. เพื่อให้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็น ไปในทิศทางเดียวกัน												
๑	งานสนับสนุนการยกระดับธรรมาภิบาลของ สำนักงาน กสทช. อย่างยั่งยืน ๑. กิจกรรมส่งเสริมการยกระดับองค์กร ความเป็นเลิศทางด้านธรรมาภิบาล ๒. กิจกรรมการประเมิน ITA ของสำนักงาน กสทช. ๓. การสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการ ตรวจสอบภายใน	สท.	๖.๗๖๓	๖.๗๖๓	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อรักษาระดับผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน (ITA) ของสำนักงาน กสทช. ในระดับ AA ในปี ๒๕๖๖ พร้อมทั้งยกระดับธรรมาภิบาลของ สำนักงาน กสทช. ให้เป็นส่วนหนึ่ง ของวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืน โดยบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม สำคัญในการขับเคลื่อนและ												
๑	งานสนับสนุนการยกระดับธรรมาภิบาลของ สำนักงาน กสทช. อย่างยั่งยืน	สท.	๖.๗๖๓	๖.๗๖๓	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อรักษาระดับผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน (ITA) ของสำนักงาน กสทช. ในระดับ AA ในปี ๒๕๖๖ พร้อมทั้งยกระดับธรรมาภิบาลของ สำนักงาน กสทช. ให้เป็นส่วนหนึ่ง ของวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืน โดยบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม สำคัญในการขับเคลื่อนและ												
๑	งานสนับสนุนการยกระดับธรรมาภิบาลของ สำนักงาน กสทช. อย่างยั่งยืน	สท.	๖.๗๖๓	๖.๗๖๓	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อรักษาระดับผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน (ITA) ของสำนักงาน กสทช. ในระดับ AA ในปี ๒๕๖๖ พร้อมทั้งยกระดับธรรมาภิบาลของ สำนักงาน กสทช. ให้เป็นส่วนหนึ่ง ของวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืน โดยบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม สำคัญในการขับเคลื่อนและ												

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเมือง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ เริ่มต้น	สิ้นสุด	วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
													<p>๑. ได้เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๖ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ITA Awards ๒๐๒๓) ด้วยคะแนน ๘๘.๔๘ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖</p> <p>๔. เข้าร่วมงานต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และจัดนิทรรศการของสำนักงาน กสทช. เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ในภารกิจด้านคุ้มครองผู้บริโภคและลดข้อกีดกันให้มีความสำคัญต่อการคุ้มครองผู้บริโภคและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายนอกด้านคุ้มครองผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักงาน กสทช. ผ่านการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดในการประกาศเจตนารมณ์การคุ้มครองผู้บริโภคภายในงาน</p> <p>๕. ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๖ รวมทั้งได้จัดบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรสำนักงาน กสทช. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๖ หัวข้อ "BEST MOVE : เลิศรัฐ สู่ความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครัฐ" โดยวิทยากรของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาและบริหารการ (ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖</p> <p>๖. กำนันสนับสนุนการให้ของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ดังนี้</p> <p>(๑) สนับสนุนงานฝ่ายเลขานุการและจัดการประชุมให้กับคณะกรรมการตรวจสอบภายใน โดยมีการจัดประชุมแล้วเสร็จ จำนวน ๑๓ ครั้ง</p> <p>(๒) ดำเนินการตรวจสอบภายใน และสนับสนุนข้อมูลการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของสำนักงาน กสทช. และสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๖ แล้วเสร็จ และได้จัดทำรายงานการตรวจสอบภายใน จำนวน ๒ ฉบับ ประกอบด้วย รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ (๘๘๐ วันหลัง) โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน โดยที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ ได้มีมติรับทราบรายงานฉบับดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ (๘๘๐ วันแรก) โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ได้เสนอแจ้งชี้ประมุขคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว</p>							
๑	งานสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ	ทท.	๑๖.๑๖๐	๑๖.๑๖๐	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ในการบริหารงาน และการจัดสรรเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนการกำหนดระเบียบต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางแก่ภาคีการบริหารจัดการกองทุนวิจัยและพัฒนาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย					✓	<p>ภาพรวมดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด โดยในปี ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะแล้วเสร็จ ดังนี้</p> <p>๑. ได้จัดทำแผนการจัดสรรทุนประเภทต่าง ๆ จากกองทุนวิจัยและพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๖ แล้วเสร็จ โดยที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ โดยเห็นชอบการกำหนดกรอบเงินอุดหนุนจากกองทุน ประจำปี ๒๕๖๖ รวมทั้งได้ดำเนินการเผยแพร่แผนการดำเนินงานดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ https://bfip.nbc.go.th/Laws แล้วเสร็จ</p> <p>๒. ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและลงนามการให้ทุนไปใช้ประโยชน์ (๑) เชิงนโยบายวิชาการ (๒) เชิงการพัฒนาสังคม ชุมชน และ (๓) เชิงเศรษฐกิจ/พาณิชย์ สำหรับใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับทุนจาก กทปส</p> <p>๓. ได้ดำเนินการฝ่ายเลขานุการในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะและคณะกรรมการที่อยู่ภายใต้คณะกรรมการบริหารกองทุน รวมทั้งสิ้น ๘ คณะ โดยในปี ๒๕๖๖ ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา จำนวน ๑๑ ครั้ง คณะกรรมการกึ่งกลางโครงการและงบประมาณที่ใช้จากเงินกองทุนฯ (ชุดที่ ๒) จำนวน ๗ ครั้ง คณะกรรมการชี้แจงและเปลี่ยนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์กองทุนวิจัยและพัฒนา จำนวน ๑๕ ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเงินกองทุนวิจัยและพัฒนา จำนวน ๑ ครั้ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนวิจัยและพัฒนา จำนวน ๑๒ ครั้ง และคณะกรรมการดำเนินงานของ กสทช. เกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนา จำนวน ๘ ครั้ง ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้รับผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการบริหารกองทุน และคณะกรรมการฯ โดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</p>	๑๐๐.๐๐	✓		<p>๑. จำนวนนโยบายและแผนการจัดสรรกองทุนประเภทต่าง ๆ จากกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๖ ๑ แผน</p> <p>๒. ร้อยละความเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕</p> <p>๓. ร้อยละความพึงพอใจของคณะกรรมการบริหารกองทุน และคณะกรรมการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕</p>	เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการกึ่งกลางโครงการและงบประมาณที่ใช้จากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (ชุดที่ ๑) ไม่ได้ดำเนินการอนุมัติจาก กสทช. และวาระการประชุมในปี ๒๕๖๖ ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา ทำให้ไม่ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการกึ่งกลางโครงการและงบประมาณที่ใช้จากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ทำให้ภาพรวมของการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๖	-

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ เริ่มต้น	สิ้นสุด	วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการ/แผนงาน	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
๑	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินและระบบติดตามงานของสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา	ทป.	๒๓.๑๙๘	๔.๒๗๒	ปี ๒๕๖๗ (๑๑.๙๐๗)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการกองทุนวิจัยและพัฒนา สำนักงาน กสทช.			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๑ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตามลำดับ ประกอบด้วย รายละเอียดในระดับต้นสังกัดพร้อมนำเสนอแนวทางที่แนะนำแก่สำนักงาน กสทช. เพื่อให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ รายงานสรุปผลการสำรวจ วิเคราะห์และออกแบบระบบงานตามความต้องการของสำนักงาน กสทช. โดยจัดทำ Blueprint พัฒนาระบบแอปพลิเคชัน Mobile แอปพลิเคชัน พัฒนาระบบปรับปรุงระบบ SAP และพัฒนาระบบติดตามงานของกองทุน (Task Management System) การปรับปรุงระบบ SAP เดิมของสำนักงาน กสทช. เพิ่มเดิมให้สามารถรองรับในส่วนของการบริหารเงินสด รับเข้าและจ่ายออก เฉพาะในส่วนของบัญชีกองทุน กสทช. โดยสามารถคำนวณได้ตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนต้องการและเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบบัญชีและการเงิน (ERP SAP) เป็นต้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๔ ในการพัฒนาระบบแอปพลิเคชัน พัฒนาระบบ Mobile แอปพลิเคชันติดตามงานกับหน้าโครงการที่ส่งมอบจากกองทุนวิจัยและพัฒนา สำนักงาน กสทช. ฯลฯ ตามขอบเขตของงานที่กำหนด	๕๕.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕		
๑	โครงการเสริมความพร้อมไปสู่องค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization)	บป.	๑๐.๔๙๔	๔.๖๖๖	ปี ๒๕๖๕ (๕.๘๑๔)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อยกระดับกระบวนการประเมินผลการบริหารจัดการข้อมูลตามระบบกับภาคข้อมูลภาครัฐของสำนักงาน กสทช. และพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลของสำนักงาน กสทช. เพื่อไปสู่องค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูล			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ (รวมสุดท้าย) แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตามลำดับ ประกอบด้วย เอกสารการทดสอบการยอมรับจากผู้ใช้งานระบบ (User Acceptant Test) รายงานสรุปผลการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน กสทช. คู่มือการติดตั้งระบบบริหารจัดการข้อมูลของสำนักงาน กสทช. สำหรับผู้ดูแลระบบ (Installation Manual) และคู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูลของสำนักงาน กสทช. (User Manual) และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ซึ่งส่งผลต่อซึ่งการดำเนินงานส่งผลให้ระบบบริหารจัดการข้อมูลของสำนักงาน กสทช. (NBTC Data Driven Portal) สำหรับการบริหารจัดการรายงานภายในระบบ เพื่อไปสู่องค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูล พร้อมเครื่องมือ ASTRO Big Data Platform สำหรับนำเข้าข้อมูล การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Integration) ของสำนักงาน กสทช. เครื่องมือ Power BI Premium สำหรับสร้างรายงานการวิเคราะห์ข้อมูล (Analytic Report) และรายงานเพื่อการตัดสินใจ (Executive Report) แบบ Interactive Dashboard และเครื่องมือKNIME สำหรับการประเมินคุณภาพข้อมูลและรายงานผลตรวจวัดคุณภาพข้อมูล (Data Quality) ของสำนักงาน กสทช.	๑๐๐.๐๐	✓		๑. จำนวนรายงานผลการศึกษาค่า ๑ ฉบับ ๒. จำนวนระบบ ๑ ระบบ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐			
๑	โครงการจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศสำหรับการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One-Stop Service) ของสำนักงาน กสทช.	บป.	๔.๔๗๒	๔.๔๗๒	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศสำหรับการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One-Stop Service) ของสำนักงาน กสทช. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในส่วนงานบริการจัดสรรและมอบบริการปรึกษาหารือแก่ประชาชนในบริการข้อมูลแก่ประชาชน บริการข้อมูลแก่ประชาชนและบุคลากรภายในสำนักงาน กสทช. ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๓ (รวมสุดท้าย) แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ ประกอบด้วย รายงานการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศสำหรับการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One-Stop Service) ของสำนักงาน กสทช. รายงานติดตั้งและทดสอบระบบสารสนเทศสำหรับการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One-Stop Service) ของสำนักงาน กสทช. ที่พัฒนาแล้วเสร็จ คู่มือการออกแบบ พัฒนาระบบและคู่มือการบริหารจัดการและดูแลระบบ ส่วนของและการกู้คืน รายงานผลการติดตั้งและทดสอบการใช้โปรแกรมที่เสนอ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของ Soft File และอุปกรณ์ Authentication & Log จำนวน ๑ ชุด เพื่อให้เป็นระบบในการบริหารจัดการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดหน่วยงานภายนอก และหน่วยงานภายใน อีกทั้งใช้ในการตรวจสอบสถานะการทำงานของระบบ แบบ Real time พร้อมทดสอบและติดตั้งใช้งาน และทดลองการใช้งานอุปกรณ์ ณ ห้องเครื่องแม่ข่าย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กสทช. ตามที่สำนักงาน กสทช. กำหนด ฯลฯ ทั้งนี้ ได้ขอขยายระยะเวลาตรวจรับงานจากแผนที่กำหนดเดิมออกไป ๑๕ วันทำการ เนื่องจากคณะกรรมการ มีความจำเป็นต้องพิจารณารายละเอียดของงาน ในด้านเทคนิคของซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศสำหรับการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One-Stop Service) ของสำนักงาน กสทช. ซึ่งจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการทดสอบการทำงานของระบบอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพจนมั่นใจว่าจะระบบสามารถใช้งานได้ในตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดย อนุ. รท. ผสทช. (บ.ป.) ปก. สทช. ได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาตรวจรับงานดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งจะครบกำหนดการตรวจรับงานในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ และจะดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป	๙๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบฯ (ระบบย่อย) ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากคณะกรรมการมีความจำเป็นต้องพิจารณาขยายระยะเวลาของงาน ในด้านเทคนิคของซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศสำหรับการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One-Stop Service) ของสำนักงาน กสทช. ซึ่งจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการทดลองทดสอบการทำงานของระบบอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพจนมั่นใจว่าจะระบบสามารถใช้งานได้ในตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตรวจรับงานได้ภายใน ๕ วัน ตามที่กำหนด จึงต้องขยายระยะเวลาตรวจรับงานออกไปอีก ๑๕ วันทำการ โดย อนุ. รท. ผสทช. (บ.ป.) ปก. สทช. ได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการตรวจรับงานดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งจะครบกำหนดการตรวจรับงานในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ และจะดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนและไม่สามารถเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖		

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเมือง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ เริ่มต้น	ระยะเวลา ดำเนินการ สิ้นสุด	วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
๑	โครงการป้องกันโรคโควิด-19 สำนักงาน กสทช. ในระดับเครือข่าย	นบ.	๑๗.๘๒๗	๔.๓๗๔	ปี ๒๕๖๓ (๒.๘๗๗) ปี ๒๕๖๔ (๔.๖๐๑) ปี ๒๕๖๕ (๖.๐๐๐)	ม.ค.-๖๓	ธ.ค.-๖๖	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน การโจมตีเว็บไซต์ สำนักงาน กสทช. ในระดับเครือข่ายจากผู้ไม่หวังดี				✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๑๖ (งวดสุดท้าย) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย รายงานการให้บริการป้องกัน Website จากการโจมตี ในระดับเครือข่าย (รายงานเดือน) ซึ่งส่งมอบต่อจากการดำเนินงานส่งมอบให้ สำนักงาน กสทช. สามารถป้องกันการโจมตีเว็บไซต์และลดปริมาณการโจมตีงาน ทราบพิชิตภัยภัยสำนักงาน กสทช. ได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ สำนักงาน กสทช. ในระดับเครือข่ายจากผู้ไม่หวังดี โดยมี การป้องกันภัยภัยสำนักงานโครงการแล้วเสร็จ โดยที่อยู่ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ พบว่า สำนักงาน กสทช. สามารถ ป้องกันระบบจากการโจมตีเว็บไซต์ สำนักงาน กสทช. ในระดับเครือข่าย คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๓	๑๐๐.๐๐	✓		๑. ร้อยละของการป้องกัน ระบบจากการโจมตี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐		
๑	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเข้าใช้ งานแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On)	นบ.	๑๓.๖๗๖	๑๑.๗๘๗	ปี ๒๕๖๕ (๒.๘๘๘)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ การเข้าใช้งานแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On) สำหรับ เข้าใช้งานระบบงานภายในของ สำนักงาน กสทช. ให้สามารถ เข้าใช้งานระบบงานผ่านการ Log-in เข้าสู่ระบบเพียงครั้งเดียว และระบบยืนยันตัวตน ๒ ชั้น ด้วยตัวเลข หรือ QR-Code (Username-Password และ OTP/OR Code Scan) โดยได้รับ ความสะดวกและความปลอดภัย ที่มากขึ้น				✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย พังง์เข้าใช้งานระบบแบบรวมศูนย์สำหรับองค์กร (Enterprise Single Sign-On - ESSO) ที่มีคุณสมบัติ พังง์เข้าใช้งานยืนยันตัวตน ๒ ชั้นชนิดรหัสผ่านแบบใช้ ครั้งเดียว (One-Time Password : OTP) และการติดตั้งระบบบริหารจัดการ การเข้าใช้งานแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On) พร้อมทั้งจัดฝึกอบรมการใช้งาน และฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งส่งมอบต่อจากการดำเนินงาน ส่งมอบให้สำนักงาน กสทช. สามารถเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการการเข้าใช้งาน แบบรวมศูนย์ (Single Sign-On) รวมทั้งสามารถใช้งานระบบงานผ่านการ Log-in เข้าสู่ระบบเพียงครั้งเดียว และระบบยืนยันตัวตนด้วยตัวเลข ซึ่งจะทำให้ ได้รับความสะดวกและผู้ใช้งานมีความปลอดภัยจากการใช้งานมากยิ่งขึ้น	๑๐๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐		
๑	โครงการจ้างปรับปรุงระบบงาน ERP เพื่อ รองรับการทำงานตามผังโครงสร้างองค์กรใหม่	นบ.	๗.๒๕๔	๗.๒๕๔	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อปรับปรุงระบบบริหารการเงิน การบัญชี ระบบการวางแผน งบประมาณ ระบบการจัดการ รายได้และระบบบริหารสินทรัพย์ และการพัสดุ (ระบบ ERP) ระบบ โครงสร้างองค์กร และการเชื่อมโยง ไปยังระบบ HRSS และส่วนที่ เกี่ยวข้องให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว ตามโครงสร้างองค์กร ใหม่ของสำนักงาน กสทช. ที่มี ผลบังคับใช้				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่ออนุมัติหลักการดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว	-	✓	๑. จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	สทช.(น.ก.) ปก.สทช. ได้อนุมัติให้ยกเลิกและยกเลิกการจัดซื้อ จัดจ้างปรับปรุงระบบงาน ERP เพื่อรองรับการทำงานตามผังโครงสร้าง องค์กรใหม่ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจน เรื่องผังโครงสร้าง สำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ ซึ่งหากดำเนินการต่อไป อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงาน กสทช. ในการปฏิบัติให้ เป็นไปตามสัญญา สำนักงาน กสทช. โดยีสารสนเทศ (นบ.) จึงเห็นควรขอ ยกเลิกการดำเนินโครงการจ้างปรับปรุงระบบงาน ERP เพื่อรองรับการ ทำงานตามผังโครงสร้างองค์กรใหม่ ดังกล่าว		
๑	โครงการจ้างปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และ ระบบ HRSS ของ สำนักงาน กสทช.	นบ.	๑๑.๙๐๐	๙.๕๒๐	ปี ๒๕๖๗ (๒.๓๘๐)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	เพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีในการ ออกแบบ และพัฒนาระบบ HRSS ใหม่ให้ทันสมัย สะดวกรวดเร็ว ในการใช้งาน และมีความมั่นคง ปลอดภัยด้านสารสนเทศ มากขึ้น และพัฒนาระบบบริหาร จัดการทรัพยากรบุคคลให้ สามารถกำหนดเงื่อนไขในการ พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประมวลผลสิทธิการได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การ เบิกจ่ายและคราะห์กรณีเสียชีวิต และเงินเกษียณของพนักงาน ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่ออนุมัติหลักการดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว	-	✓	๑. จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	สทช. (ทศ.) รก. สทช. ได้อนุมัติให้ยกเลิกและยกเลิกการ ประกาศแผนแม่บทในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างปรับปรุงและเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบ HRSS ของสำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เนื่องจากเป็น โครงการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการข้อมูลทรัพยากร บุคคล มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความทันสมัย รองรับภารกิจ ของสำนักงาน กสทช. ได้อย่างครอบคลุม และให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยตรงในการบริหารทรัพยากรบุคคล กล่าวคือ สำนักบริหารบุคคล (นบ.) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ และรับทราบปัญหาและความต้องการใช้งาน ระบบฯ อย่างละเอียด เป็นผู้ดำเนินการโครงการระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคล ที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อนของ โครงการฯ และเกิดความคุ้มค่าในการลงทุนระยะยาว สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ (นบ.) จึงเห็นควรขอยกเลิกการดำเนินโครงการจ้าง ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบ HRSS ของสำนักงาน กสทช. ดังกล่าว		
๑	โครงการระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ และระบบประกอบอาคาร อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ ๑) งานออกแบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ ๒) งานปรับปรุงระบบประกอบอาคาร ๑) งานจ้างผู้ควบคุมงานและดำเนินการอื่น ๆ	นบ.	๕๘๒.๗๐๕	๑๔๕.๖๖๗	ปี ๒๕๖๗ (๔๗.๐๒๕)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	เพื่อจัดทาสถูภัณฑ์โครงสร้าง พื้นฐานและระบบประกอบ อาคารของสำนักงาน กสทช. แห่ง ใหม่ ให้รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Smart building)				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่ออนุมัติหลักการดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว	-	✓	๑. จำนวนระบบฯ ๒ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	สทช. (กบ.) ปก. สทช. ได้อนุมัติให้ยกเลิกโครงการระบบโครงสร้าง พื้นฐานสารสนเทศและระบบประกอบอาคาร อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากปัจจุบันอยู่ระหว่าง การการตัดสินใจรับเปลี่ยนแปลงอาคารให้เสร็จสิ้น เพื่อไปปรับปรุง การออกแบบและจำนวนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ในการกำหนดขอบเขตของงานและการประเมินราคาากลาง รวมทั้ง โครงสร้างใหม่ของสำนักงานอยู่ระหว่างการพิจารณา หากมีการ ประกาศใช้แล้ว อาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของของงาน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการฯ ดังกล่าวได้ทันตามแผนที่ในปี ๒๕๖๖		

ยุทธศาสตร์ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)	งบประมาณที่มีผูกพันต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการมีความก้าวหน้าร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ	
								ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด				
๑	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน กทช. แห่งใหม่ ๑) งานก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กทช. แห่งใหม่ ๒) งานจัดซื้อตัวควบคุมงาน และดำเนินการยื่นใบ ๓) งานออกแบบเพิ่มเติม	ทช.	๒,๒๕๓.๐๐๐	๒๓๐.๕๒๓	ปี ๒๕๖๒ (๒๕๕.๓๕๐) ปี ๒๕๖๓ (๕๓๔.๑๓๓) ปี ๒๕๖๔ (๒๑๑.๑๒๐) ปี ๒๕๖๕ (๔๓๐.๕๒๕) ปี ๒๕๖๖ (๑๕๐.๕๑๗)	ม.ค.-๖๒	ธ.ค.-๖๗	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน กทช. แห่งใหม่			✓			๑. งานก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กทช. แห่งใหม่ มีความคืบหน้าการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๖๖ ๒. งานจัดซื้อตัวควบคุมงาน และตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กทช. แห่งใหม่ มีความคืบหน้าการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๖ โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น ๒ ระยะ ได้แก่ ระยะที่ ๑ การดำเนินการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ๓๓ เดือน โดยได้ปรับเพิ่มระยะเวลาการควบคุมงาน จำนวน ๔ เดือน และระยะที่ ๒ การดำเนินการตลอดระยะเวลา รับประกันความชำรุดบกพร่องของงานก่อสร้าง ๒ ปี โดยได้มีการแก้ไขสัญญา ครั้งที่ ๑ ให้เพิ่มระยะเวลาการควบคุมงานก่อสร้าง และขอให้แก้ไขรายละเอียดการจ่ายค่าจ้างควบคุมงาน ๓. งานออกแบบเพิ่มเติม ได้ดำเนินการตรวจการส่งมอบงานและดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๙๙.๖๗		✓	๑. จำนวนอาคารสำนักงาน กทช. แห่งใหม่ และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ๔ อาคาร ๒. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากงานก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กทช. แห่งใหม่ต้องมีการปรับแก้ไขแบบอาคาร A แบบอาคาร G และแบบงานผังบริเวณ รวมทั้งแบบงานเพิ่มเติมในส่วนของงาน ICT	-
๑	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจจับและติดตามความเคลื่อนไหวของครุภัณฑ์ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี RFID (ระยะที่ ๑)	ทช.	๕.๑๖๔	๕.๑๖๔	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖				✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๒ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ราชอาณาจักรการจัดการติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้สามารถทำงานบนระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี RFID เต็มของสำนักงาน กทช. ตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้สามารถทำงานบนระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี RFID เต็มของสำนักงาน กทช. พร้อมทั้งฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ และจัดการฝึกอบรมสำหรับผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลลัพธ์จากการดำเนินงานส่งผลให้สำนักงาน กทช. ได้ขยายขอบเขตการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับและติดตามความเคลื่อนไหวของครุภัณฑ์ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี RFID ณ สำนักงาน กทช. (สำนักงานใหญ่) สำนักงาน กทช. ๓ และสำนักงาน กทช. ๓๔ เพิ่มเติม สามารถตรวจจับและติดตามความเคลื่อนไหวของครุภัณฑ์ของสำนักงาน กทช. ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีความถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว และครอบคลุมพื้นที่ที่สำนักงาน กทช. ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค	๑๐๐.๐๐	✓		๑. จำนวนครุภัณฑ์ระบบรวมติดตั้ง ๑ ชุด ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	-	
๑	โครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศที่เป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับผู้ใช้งานภายในสำนักงาน กทช. (NBTC Employee Portal)	ตช.	๑๔.๗๖๕	๑๐.๓๓๕	ปี ๒๕๖๕ (๔.๔๓๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับผู้ใช้งานภายในสำนักงาน กทช. (NBTC Employee Portal) ให้มีเครื่องมือที่ช่วยบุคลากรในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ได้ด้วยตนเอง (Citizen Developer)			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๔ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ผู้ถือการใช้งานในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลและวิธีโอเพ่นซอร์สการใช้งานระบบ และการจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบให้แก่บุคลากร จำนวน ๑ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการใช้งานเครื่องมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับผู้ใช้งานภายในสำนักงาน กทช. (NBTC Employee Portal) หลักสูตรการบริหารจัดการ ตรวจสอบและดูแลรักษาระบบสารสนเทศเพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับผู้ใช้งานภายในสำนักงาน กทช. (NBTC Employee Portal) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล การสำรองและกู้คืนข้อมูล และการใช้งานเครื่องมือ Low code platform สำหรับผู้ดูแลระบบของสำนักงาน กทช. และหลักสูตรการใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับผู้ใช้งานภายในสำนักงาน กทช. (NBTC Employee Portal) เรียบร้อยแล้ว โดยปัจจุบันได้ดำเนินการนำระบบเข้าสู่ระยะการใช้งานจริงเพื่อให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้งานได้ รวมถึงได้รวบรวมความคิดเห็นเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การทำงานของระบบสามารถรองรับงานเชิงธุรกิจ (Business Workflow) ได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งผลลัพธ์จากการดำเนินงานส่งผลให้สำนักงาน กทช. มีโครงสร้างภาพรวมการเชื่อมโยงกระบวนการงานและระบบสารสนเทศของสำนักงาน กทช. (Blueprint (To be Architecture Blueprint)) และสามารถเชื่อมโยง ๔ กลุ่มกระบวนการงานและระบบโดยใช้เทคโนโลยี Low Code ได้แก่ ระบบบริหารจัดการเอกสารและการประชุม กทช. ระบบบริหารจัดการขออิม/คืนหรือรายชื่อสัญญาณ ระบบคัดกรองและเสนอรายชื่อรับพิจารณาขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และระบบสรรหาบุคลากรภายนอก ซึ่งช่วยยกระดับกระบวนการทำงานให้สามารถเชื่อมโยงกันในรูปแบบดิจิทัลส่งผลให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น พร้อมทั้งสร้างระบบนิเวศดิจิทัล (Digital Ecosystem) ซึ่งจะนำไปสู่วัฒนธรรมการทำงานดิจิทัล (Digital Culture) ของสำนักงาน กทช. อีกทั้งสามารถนำข้อมูลที่ได้จาก To be Architecture Blueprint มาใช้ในการออกแบบกระบวนการต่างๆ ของสำนักงานให้มีความกระชับและยืดหยุ่นมากขึ้น (Reprocess)	๑๐๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐	-	-	
๒	แผนงานบริหารสถาบันวิจัยการเสริมสร้างสำนักงาน กทช. ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	ยท.	๒๓.๑๓๒	๒๓.๑๓๒	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อสนับสนุนการบริหารสถาบันวิจัยการในการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน กทช. ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้			✓		ภาพรวมดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด โดยในปี ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการทั้งการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนงานบริหารสถาบันวิจัยการและการเสริมสร้าง สำนักงาน กทช. ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้แล้วเสร็จ	๙๒.๘๖	✓		ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	-	
๒	แผนงานสร้างองค์ความรู้บุคลากรให้มีขีดความสามารถทางวิชาการ เพื่อรองรับการเป็นองค์กรชั้นนำในการกำกับดูแลที่มีความเป็นสากล	วท.	๗๑.๕๗๖	๗๑.๕๗๖	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน กทช. ให้มีความสามารถในการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย เพื่อสนับสนุน ด้านวิชาการในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และการจัดทำนโยบายกำกับดูแลของ กทช.			✓		ภาพรวมดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด โดยในปี ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการทั้งการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนงานสร้างองค์ความรู้ของบุคลากรให้มีความสามารถทางวิชาการ เพื่อรองรับการเป็นองค์กรชั้นนำในการกำกับดูแลที่มีความเป็นสากลแล้วเสร็จ	๙๓.๕๑	✓		ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเมือง (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเมือง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ เริ่มต้น	ระยะเวลา ดำเนินการ สิ้นสุด	วัตถุประสงค์ของงานดำเนิน โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานการณ์ดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด เสนอผล ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
๒	งานพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในด้าน การกำกับดูแลให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและ สังคมดิจิทัล	วท.	๔๑.๒๑๑	๔๑.๒๑๑	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักงาน กสทช. ตามแผนที่กำหนด และ ศึกษา วิจัย จัดทำ แอปพลิเคชัน ผลงานวิชาการ รวมทั้งเป็น ศูนย์เสริมสร้างและแลกเปลี่ยน ข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารคลื่นความถี่ การ กำกับดูแลให้บุคลากรและผู้มีส่วน เกี่ยวข้องทั้งภายในและ ต่างประเทศ				✓		๗๕.๘๒	✓		๑. ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	เนื่องจากงานพัฒนาบุคลากรบางรายการ พบอุปสรรคบางข้อที่ ไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ ศูนย์ผลิตของผู้รับสัมปทานในการจัดซื้อ จัดจ้าง การเปลี่ยนแปลงสำนักงานการหรือดำเนินการยกเลิกการจัด ฝึกอบรมของหน่วยงานภายนอก จำนวนผู้เข้ารับทุนการศึกษา เป็นต้น ส่งผลให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายการได้ ทำให้การรวม ของค่าเบิกจ่ายไม่ไปเป็นตามแผนที่กำหนดให้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๖	-	
๒	งานพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และประชาชนให้พร้อมเข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	สท.	๒๓.๖๑๔	๒๓.๖๑๔	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาบุคลากรในกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมี มาตรฐานการสื่อสาร ภายใต้ จริยธรรมวิชาชีพ พร้อมทั้ง ส่งเสริมและสร้างความรู้ความ เข้าใจแก่ประชาชนให้พร้อมเข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล			✓		๘๗.๑๑	✓		๑. ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕		-		

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีผูกพัน ต่อเมือง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ เริ่มต้น	สิ้นสุด	วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการ/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ		
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด					
๒	งานพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคมและประชาชน ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	ทท.	๑.๒๕๕	๑.๒๕๕	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคมและประชาชนให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีศักยภาพเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล				✓						๑. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕				
๒	โครงการพัฒนาระบบฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ของสำนักงาน กสทช.	วช.	๑.๕๐๐	๑.๕๐๐	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	๑. เพื่อพัฒนาระบบฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ของสำนักงาน กสทช. ๒. เพื่อฝึกอบรมพนักงานของสำนักงาน กสทช. ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ				✓						๑. จำนวนระบบ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	รชช. (ก.) ได้อนุมัติหลักการดำเนินการพัฒนาระบบฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ของสำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากสำนักทรัพยากรบุคคล (บย.) มีแผนการยกเลิกระบบ HRSS ซึ่งเป็นระบบที่เข้าเป็นเวลานาน รวมถึงมีแผนที่จะจัดทำระบบการบริหารบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน กสทช. ในปี ๒๕๖๗ ซึ่งระบบดังกล่าว มีความครอบคลุมถึงระบบบริหารจัดการเรียนรู้ออนไลน์ (E-Learning) ที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้ได้ความเข้าช้อยในการดำเนินการสถาบันวิทยากร (บย.) จึงเห็นควรยกเลิกการดำเนินการพัฒนาระบบฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ของสำนักงาน กสทช. ดังกล่าว			
๒	โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ สำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๕	วช.	๑.๑๐๐	๐.๒๐๐	ปี ๒๕๖๕ (๑.๐๐๐) ปี ๒๕๖๖ (๐.๑๐๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงาน กสทช. ให้มีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล				✓						๑. จำนวนทุน ๒ ทุน ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	เนื่องจากในปี ๒๕๖๕ มีพนักงานที่ขอเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาโทในต่างประเทศ จำนวน ๒ ราย แต่ผ่านคุณสมบัติและได้รับอนุมัติให้เป็นผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษาเพียงรายเดียว ทำให้มีนักเรียนทุนที่ได้เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาโทในต่างประเทศ สำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๕ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ทั้งนี้ เนื่องจากมีพนักงานได้รับอนุมัติให้เป็นผู้มีสิทธิรับทุนจำนวน ๑ ราย จากจำนวนทุนที่ตั้งไว้ ๒ ทุน จึงได้ขอปรับลดงบประมาณ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ส่งผลให้งบประมาณที่เบิกจ่ายจริงลดลง ประกอบกับสถาบันวิทยากร (บย.) มีเงินกักไว้เบิกเพื่อปี ๒๕๖๕ ทั้งเพียงพลและครอบครัว ค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นในปี ๒๕๖๖ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในกรณีที่นักเรียนทุนไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติสามารถขอขยายระยะเวลาการศึกษาเพิ่มเติมโดยได้รับทุนการศึกษาอีกจำนวน ๖ เดือน			
๒	โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ สำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๖	วช.	๕.๐๐๐	๑.๘๐๐	ปี ๒๕๖๖ (๑.๕๐๐) ปี ๒๕๖๘ (๑.๑๐๐)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๘	เพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักงาน กสทช. ให้มีความรู้ความสามารถในระดับสูง ยังช่วยขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงาน กสทช. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น				✓							๑. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ในปี ๒๕๖๘ ตามแผนที่กำหนด ๒ คน ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	เนื่องจากในปี ๒๕๖๖ มีพนักงานที่ขอเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาโทในต่างประเทศเพียงรายเดียว ทำให้มีจำนวนนักเรียนทุนที่ได้เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาโทในต่างประเทศ สำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๖ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด		

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ เริ่มต้น	สิ้นสุด	วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
๒	โครงการระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์แบบ สื่อรวมหลายช่องทาง Omni-Channel Contact Center	บ.บ.	๑๗.๐๓๐	๑๐.๒๑๘	ปี ๒๕๖๕ (๖.๘๑๒)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อให้บริการการติดต่อสื่อสาร ของประชาชนหรือหน่วยงาน ภายนอกจากหลากหลายช่องทาง ให้เป็นหนึ่งเดียว (Omni- channel) ผ่านระบบของศูนย์ Call Center 1200 และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ ประชาชนหรือหน่วยงานภายนอก ทั้งในด้านการค้นหาข้อมูล การ ตอบสนทนา การติดตามเรื่อง คำร้องต่างๆ สร้างความพึงพอใจ และประสบการณ์ที่ดีของ ประชาชน (Customer Experience)				✓		๑๐๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐			
๒	โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแบบจำลอง ดุลยภาพทั่วไป (Computable General Equilibrium Model) สำหรับการประเมินผล กระทบทางเศรษฐกิจในวงกว้าง (ภายใต้ ความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช. และ Victoria University ประเทศออสเตรเลีย)	ป.บ.	๗.๐๐๐	๗.๐๐๐*	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อจัดทำแบบจำลองดุลยภาพ ทั่วไป (CGE Model) สำหรับการ วิเคราะห์ผลกระทบของนโยบาย ต่อระบบเศรษฐกิจ และเพื่อให้ บุคลากรของสำนักงาน กสทช. สามารถใช้แบบจำลองดังกล่าวใน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณได้				✓		๑๐๐.๐๐	✓		๑. จำนวนแบบจำลองฯ ๑ แบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕		ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้มีมติ อนุมัติปรับงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยปรับลดงบประมาณ รายจ่ายโครงการฯ จำนวน ๒,๗๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณ หลังปรับแผนที่เงิน ๕,๒๕๐,๐๐๐ บาท	
๒	โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลสำหรับ สายงานวิชาการ (Strategic Database System : SDS)	ศ.ว.	๕.๐๐๐	๕.๐๐๐*	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล สำหรับสายงานวิชาการ (Strategic Database System : SDS) ให้เป็น เครื่องมือในการบริหารจัดการ ข้อมูลด้านวิชาการที่จำเป็น สามารถเข้าถึงข้อมูลวิชาการได้ อย่างถูกต้อง รวดเร็ว พร้อมทั้ง พัฒนาเป็นไปคู่ศูนย์วิจัยและพัฒนา ทางวิชาการ กสทช. (NBIC Research Hub) สำหรับเป็น ศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ระหว่างนักวิจัย รวมถึง เผยแพร่ข้อมูลด้านวิชาการ เพื่อให้ เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งจำเป็น ต่อการศึกษาระดับวิชาการจาก แหล่งข้อมูลภายในและภายนอก สำนักงาน กสทช.			✓		๘๐.๐๐		✓	๑. จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	สำนักงาน กสทช. ได้มีการปรับลดงบประมาณของโครงการฯ งบประมาณเพื่อมูลค่าสำหรับสายงานวิชาการ (Strategic Database System : SDS) ลงเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการลงนามในสัญญาจ้างเกิดการล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ และได้ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนและไม่สามารถเบิกจ่ายได้เสร็จสิ้นได้ภายในงบประมาณ ๒๕๖๖	ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้มีมติ อนุมัติปรับงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยปรับลดงบประมาณ รายจ่ายโครงการฯ จำนวน ๕๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ งบประมาณหลังปรับแบบ ที่เงิน ๘,๔๘๐,๐๐๐ บาท		

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/ กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ	
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก	เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด								
๒	โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึง สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย	ศท.	๗.๐๐๐	๗.๐๐๐*	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อจัดทำฐานข้อมูลภาคีกรรม การใช้ระบบและการเข้าถึงสื่อ ประเภทต่าง ๆ ของประชาชน ได้แก่ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคม เพื่อใช้ในการ แยกแยะกับประชาชนและภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องในการนำไปใช้ ประโยชน์ต่อไป					✓					๑. จำนวนฐานข้อมูล ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเข้าถึงจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕		ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้มีมติอนุมัติปรับแผนงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยปรับลดงบประมาณ รายจ่ายโครงการฯ จำนวน ๗๘๗.๐๐๐ บาท คงเหลือ งบประมาณหลังปรับแผน ที่สิ้น ๖,๖๑๑.๐๐๐ บาท	
๓	แผนงานบริหารคดีความดี กำกับดูแล การค้าขายหิมนและบริหารกิจการ ส่วนภูมิภาค และสนับสนุนการสร้าง ความร่วมมือระหว่างประเทศ	ภค. / บก.	๕๘๐.๕๓๗	๕๘๐.๕๓๗	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการบริหารคดีความดี และกิจการ ความดีของประเทศ โดยมี ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ นโยบายและแผนระดับชาติ ที่เกี่ยวข้อง พัฒนาศักยภาพของ สำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค และเพิ่มประสิทธิภาพ การตรวจสอบและกำกับดูแลสินค้า ความดี				✓						ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕			
๓	งานขับเคลื่อนการให้บริการบริหารคดีความดี ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนองชาติที่ เกี่ยวข้องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไป	ศท.	๓.๒๑๖	๓.๒๑๖	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการบริหารคดีความดีให้มี ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ นโยบายและแผนองชาติ ที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงไป				✓						๑. จำนวนแผน กูรูระเบียบ แนวทางที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารคดีความดี ๑ ฉบับ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	๑. ปัจจุบันยังไม่มี Demand ที่ชัดเจนจาก IMT ซึ่งในอนาคตหาก มีการจัดสรรคดีความดีให้กับ IMT จึงจะกำหนดแนวทางการผูกมัด ให้ได้ศักยภาพที่ดีสำหรับบริการประจำที่ผ่านดาวเทียม รวมถึง กำหนดสิทธิคุ้มครองการรวบรวมคดีความดี และเงื่อนไขทางเทคนิค อื่นๆ ได้เพิ่มเติม ๒. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเห็นที่ไม่สอดคล้องกับ (ร่าง) ประกาศา ในหลายประเด็น อาทิ การกำหนดคดีความดี การแบ่งประเภทการ กำหนดนิยาม การแจ้งจดทะเบียน และมาตรการคุ้มครองการรวบรวม คดีกิจการอื่น เป็นต้น จึงจะต้องมีการหรือเพิ่มเติมอีกหลายครั้งในปี ถัดไป เพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกันที่ชัดเจน		

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ เริ่มต้น	สิ้นสุด	วัตถุประสงค์ของโครงการ/งาน โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน งาน/โครงการ/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
๓	งานขับเคลื่อนการวิจัยกับดูแลกิจการ ความเข้มแข็งเพื่อประโยชน์สูงสุดของ ประเทศไทยและประชาชน	ตบ.	๑.๙๖๔	๑.๙๖๔	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อสนับสนุนการวิจัยร่วมกับ ดูแลกิจการความเข้มแข็ง การบริหาร สิทธิในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ประเทศไทยและ ประชาชน และเป็นไปตาม ข้อบังคับวิญญูของสหภาพ โทรคมนาคมระหว่างประเทศ และพันธกรณีระหว่างประเทศ				✓		๖๓.๑๑	✓		๑. จำนวนแผน กฎระเบียบ แนวทางที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารสิทธิในการเข้าถึงโครง สร้างพื้นฐาน ๑ ฉบับ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	เนื่องจากความล่าช้า กฤษฎ. ที่ ๑๘/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะ อนุกรรมการดำเนินการจัดการความถี่เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีวาระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลา ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่คำสั่ง แต่งตั้งกล่าว ซึ่งได้ครบวาระเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ซึ่ง ยังอยู่ระหว่างพิจารณาการดำเนินการเพื่อให้มีการแต่งตั้งคณะ อนุกรรมการความถี่ชุดใหม่ ทำให้ไม่สามารดำเนินการจัดประชุมฯ ได้ตามแผน และส่งผลกระทบต่อวงเงินไม่เงินไปตามแผนที่กำหนด	-	
๓	งานการประชุมและพัฒนาเครือข่ายความ ร่วมมือระหว่างประเทศในการบริหารคลื่น ความถี่และกำกับดูแลการประกอบกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการ โทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม	ตบ.	๑๒๕.๐๔๕	๑๒๕.๐๔๕	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการบริหารคลื่นความถี่และ กำกับดูแลการประกอบกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการ ดาวเทียม				✓		๑๐๐.๐๐	✓		๑. จำนวนการประชุมระหว่าง ประเทศ ประจำปี ๒๕๖๖ ที่สำคัญงาน กฤษฎ. ส่งผู้แทน เข้าร่วมการประชุม ๑๕ ครั้ง ๒. จำนวนการเป็นเจ้าภาพการ ประชุมระหว่างประเทศใน ระดับทวิภาคี ประจำปี ๒๕๖๖ ๗ ครั้ง ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	เนื่องจากมีความไม่แน่นอนจากสถานการณ์การเกิดโรคระบาดกึ่ง ธรรมชาติ และนโยบายทางการเมือง ส่งผลให้การประชุมต้องเลื่อน หรือยกเลิก ทั้งนี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมจากเดิมเป็น รูปแบบออนไลน์ และรูปแบบ Hybrid แทน	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ เริ่มต้น	ระยะเวลา ดำเนินการ สิ้นสุด	วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
๓	โครงการจัดหาและพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค จำนวน ๑ คัน	กท.ก.	๑๔,๗๑๕	๑,๕๕๕	ปี ๒๕๖๕ (๑๒,๗๕๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	จัดหายอดหรือมอบแบบปรับปรุงและพัฒนาให้สามารถดำเนินการออกใบอนุญาตเคลื่อนที่ และใช้การบริการประชาชนที่ทันสมัยพร้อมความรู้ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมถึงมีวัตถุประสงค์ของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค เพื่อบริการประชาชนในการออกใบอนุญาตเคลื่อนที่				✓			๑๐๐.๐๐	✓		๑. จำนวนยอดคำสั่งซื้อที่ออกใบอนุญาตเคลื่อนที่ ๑ คัน ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐	-	มีการรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
๓	โครงการจัดเก็บและบูรณาการระบบตรวจสอบและควบคุมสถานีตรวจสอบความถี่ระยะไกล	กท.ก.	๘,๗๒๕	๑,๓๑๙	ปี ๒๕๖๕ (๗,๕๕๖)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนา ปรับปรุงอุปกรณ์และระบบจัดเก็บบูรณาการระบบตรวจสอบและควบคุมสถานีตรวจสอบความถี่ระยะไกล และการบำรุงรักษาเครื่องมือสถานีตรวจสอบ สามารถตรวจสอบเชิงป้องกันเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ				✓			๑๐๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐	-	มีการรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
๓	โครงการจัดหาเครื่องเล่นความถี่และค้นหาตำแหน่งสถานีส่งสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔ ชุด	กท.ก.	๒๘,๐๐๐	๗,๐๐๐	ปี ๒๕๖๕ (๒๑,๐๐๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อจัดหาระยะแรกความถี่และค้นหาตำแหน่งสถานีส่งสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบของสำนักงาน กสทช. ภาค สำนักงาน กสทช. เขต มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน				✓			๑๐๐.๐๐	✓		๑. จำนวนชุดที่โครงการ ๔ ชุด ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐	-	มีการรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
๓	โครงการพัฒนาระบบต้นแบบสำหรับการบริหารจัดการความถี่วิทยุและการตรวจสอบคลื่นความถี่ของศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่แห่งชาติ	กท.ก.	๙,๔๖๑	๕,๒๐๔	ปี ๒๕๖๕ (๔,๒๕๘)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาระบบต้นแบบสำหรับการบริหารจัดการความถี่วิทยุและการตรวจสอบคลื่นความถี่ของศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่แห่งชาติ				✓			๙๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐	-	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากในขั้นตอนประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์พบว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอแต่ถูกตัดราคา และดำเนินการแก้ไขจนกระทั่งสามารถดำเนินการจัดซื้อได้ เป็นไปตามระเบียบการตรวจการคลังด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และเนื่องจากผลการตรวจการฯ มีความจำเป็นต่อพิจารณาเรื่องยื่นคัดค้านการขอเสนอราคา มีความจำเป็นต่อพิจารณาเรื่องยื่นคัดค้านการขอเสนอราคาทั้งระบบของระบบอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจึงสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์โครงการ ซึ่งจำเป็นต่อของมูลนิธิเพื่อขยายระยะเวลาตรวจรับพัสดุออกไปเป็นวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดย ผศช. (กค.) ปก. สทช. โดยมูลนิธิเพื่อขยายระยะเวลาการตรวจรับพัสดุฯ ดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
๓	โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์และ ถอดเสียงการออกอากาศวิทยุกระจายเสียง	กท.	๙.๕๐๒	๕.๒๒๖	ปี ๒๕๖๕ (๔.๒๗๖)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาระบบการวิเคราะห์ และถอดเสียงการออกอากาศ วิทยุกระจายเสียง			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ดำเนินการตรวจรับระบบงานงวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ชุด โปรแกรมประยุกต์ระบบการวิเคราะห์ถอดเสียงฯ ที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ รายงานการติดตั้งและทดสอบโปรแกรมฯ อุปกรณ์พร้อมทดสอบและติดตั้ง คู่มือ การออกแบบ พัฒนาระบบ คู่มือการบริหารจัดการและดูแลระบบสำรอง และการกู้คืน หรือที่เชื่อมโยงงานฯ ที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงาน กสทช. ทั้งนี้ โดยขอขยายระยะเวลาตรวจรับงานจากแผนที่กำหนดเดิมออกไปเป็นวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากคณะกรรมการฯ มีความจำเป็นต้องพิจารณา รายละเอียดด้านเทคนิคของซอฟต์แวร์วิเคราะห์และถอดเสียง ซึ่งต้องใช้ ระยะเวลาในการทดสอบการทำงานของระบบอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพจนมั่นใจว่าสามารถใช้งาน ได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดย ร.ก. ผสทช. (กท.) ปก. สทชช. ได้อนุมัติ ให้ขยายระยะเวลาการตรวจรับพัสดุฯ ดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ ซึ่งสัมพันธ์จากการดำเนินการแล้วเสร็จจริงแล้วได้ดำเนินการ กสทช. มีระบบวิเคราะห์และถอดเสียงการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงซึ่งใช้ในการ ถอดเสียงและวิเคราะห์ข้อมูลประเภทเสียงที่มีใช้งานจากการบินที่ข้อมูล การออกอากาศวิทยุกระจายเสียง และยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเนื้อหารายการและโฆษณาของวิทยุกระจายเสียง ให้สะดวก รวดเร็ว มีความเป็นอัตโนมัติ และสามารถลดภาระการทำงานของ เจ้าหน้าที่ได้มากขึ้น	๙๐.๐๐		✓	๑. จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากใบข้อเสนอ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่พบว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอแต่ถูกตัดตาม เงื่อนไขข้อกำหนดของรายชื่อบริษัท จึงต้องดำเนินการยกเลิกการประกวด ราคา และดำเนินการเปิดซองประกวดราคาใหม่อีกครั้ง (ครั้งที่ ๒) เพื่อให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ และ เนื่องจากคณะกรรมการฯ มีความจำเป็นต้องพิจารณารายละเอียดด้าน เทคนิคของซอฟต์แวร์วิเคราะห์และถอดเสียง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา ในการทดสอบการทำงานของระบบอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้ ระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพจนมั่นใจว่าสามารถ ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ จึงจำเป็นต้องดำเนินการต้อง ขออนุมัติเพื่อขยายระยะเวลาตรวจรับพัสดุออกไปเป็นวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดย ร.ก. ผสทช. (กท.) ปก. สทชช. ได้อนุมัติให้ ขยายระยะเวลาการตรวจรับพัสดุฯ ดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด	-
๓	โครงการจัดหาชุดสถานีตรวจสอบการใช้ ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล จำนวน ๕ สถานี	กท.	๕๙.๑๗๕	๕.๘๐๗	ปี ๒๕๖๗ (๕๐.๔๖๘)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ตรวจสอบคลื่นความถี่ให้ ครอบคลุมทั่วประเทศ		✓			ได้รับอนุมัติของเขตของงาน (TOR) และราคากลางโครงการจัดหาชุดสถานี ตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล จำนวน ๕ สถานี แล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตามลำดับ ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้ประกาศว่าประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยกำหนดให้ ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ และเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้พิจารณา ตรวจสอบคุณสมบัติของบริษัทผู้ยื่นข้อเสนอฯ แล้วพบว่า ผู้ยื่นข้อเสนอฯ ได้ มีการลงทะเบียนประกาศจากทำทุกส่วนจำกัด เป็น บริษัทจำกัด จึงต้องมี หนังสือหรือใบยื่นเอกสารการวินิจฉัยปัญหาการจัดจ้างภาครัฐ (กรอ.) กรมบัญชีกลาง ซึ่งมีอำนาจหน้าที่วินิจฉัยเรื่องดังกล่าว ตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง (ง) ประกอบกับมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การพิจารณา คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอเป็นไปด้วยความถูกต้องและรอบคอบ โดย สทชช. ได้ลงนามในหนังสือถึงประธานคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐ เพื่อขอความอนุเคราะห์ต่อบริษัทหรือ กรณีผู้ประกอบกิจการจดทะเบียน แปรสภาพนิติบุคคล และส่งหนังสือดังกล่าวไปกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ และเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการวินิจฉัยฯ ได้มีหนังสือตอบกลับสำนักงาน กสทช. ตอบข้อหรือ ดังกล่าวเรื่อง การแปรสภาพจากทำทุกส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัดขึ้น ย่อม นำไปทั้งทรัพย์สิน หนังสือและความรับผิดชอบของทั้งส่วนร่วมเดิมทั้งหมด ดังนั้น หากคณะกรรมการพิจารณาฯ ตรวจสอบงบการเงินแล้วพบว่า แสดงบัญชีค่าภาษีเป็นบวก คณะกรรมการพิจารณาฯ ย่อมสามารถพิจารณา ให้เป็นผู้ผ่านคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิข้อจำกัดการ เป็น ผลให้สามารถดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป ขณะนี้จึงอยู่ ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาฯ รายงานผลการพิจารณาฯ ดังกล่าวได้รับ ข้อหรือจาก กรอ. เสนอต่อผู้มีอำนาจก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป	๐.๐๐		✓	๑. จำนวนชุดสถานีตรวจสอบ การใช้ความถี่วิทยุระบบควบคุม ระยะไกล ๕ สถานี ในปี ๒๕๖๗ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๕	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากในกระบวนการ จัดจ้างฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ข้อหรือ ประเด็นคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ กรณีจดทะเบียนแปรสภาพจาก ทำทุกส่วนจำกัด เป็นบริษัท จำกัด ทั้งนี้ เพื่อให้คุณสมบัติของผู้ยื่น ข้อเสนอเป็นไปด้วยความถูกต้องและรอบคอบ สำนักบริหารคดีและนิติ การ (นย.) จึงเร่งทบทวนใบสำคัญกิจการนิติภาค (กท.) หรือไปยัง คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (กรอ.) กรมบัญชีกลาง ก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ส่งผลให้การจัดซื้อจัด จ้างล่าช้าไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ในปี ๒๕๖๖	-	
๓	โครงการจัดหาเครื่องตรวจวิเคราะห์ คลื่นความถี่วิทยุ ชนิด Realtime Bandwidth แบบสหพายอี ย่านความถี่ 10 MHz - 42 GHz จำนวน ๒๒ ชุด	กท.	๕๓.๓๐๐	๑๓.๘๗๕	ปี ๒๕๖๗ (๔๐.๔๒๕)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	เพื่อจัดหาเครื่องตรวจวิเคราะห์ คลื่นความถี่วิทยุ ชนิด Realtime Bandwidth แบบสหพายอี ย่าน ความถี่ 10 MHz - 42 GHz จำนวน ๒๒ ชุด		✓			ได้รับอนุมัติของเขตของงาน (TOR) และราคากลางโครงการจัดหาเครื่องตรวจ วิเคราะห์คลื่นความถี่วิทยุ ชนิด Realtime Bandwidth แบบสหพายอีย่าน ความถี่ 10 MHz - 42 GHz จำนวน ๒๒ ชุดแล้ว เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามลำดับ โดยมีเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้ส่งเรื่องไปยังสำนักงานพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (สย.) เพื่อดำเนินการจัดจ้างฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งได้ประกาศประกวด ราคา ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ โดยมีกำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยในขั้นตอนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พบว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอจำนวน ๒ ราย แต่ถูกตัดตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดใน เอกสารประกวดราคาฯ เพื่อยุติการพิจารณาฯ จึงต้องดำเนินการยกเลิกการประกวด ราคา และดำเนินการยื่นซองประกวดราคาใหม่อีกครั้ง โดยประกาศประกวดราคาฯ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ได้กำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ซึ่งในการประกวดราคา ครั้งที่ ๒ พบว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอ ที่ถูกตัดตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อยุติการ โดยเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการพิจารณาฯ จึงได้รายงาน ผลการพิจารณาฯ เห็นควรให้ยกเลิกการประกวดราคาฯ ครั้นนี้ และให้ทบทวน ขอบเขตของงาน ก่อนดำเนินการประกวดราคาใหม่อีกครั้ง	๐.๐๐		✓	๑. จำนวนเครื่องตรวจ วิเคราะห์คลื่นความถี่วิทยุ (๒ ชุด ในปี ๒๕๖๖ และ ๑๖ ชุด ในปี ๒๕๖๗) ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๕	เนื่องจากในขั้นตอนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่พบว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๒ ราย แต่ถูกตัดตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวด ราคาฯ เพื่อยุติการพิจารณาฯ จึงต้องดำเนินการยกเลิกการประกวดราคาฯ และ ดำเนินการยื่นซองประกวดราคาใหม่อีกครั้ง (ครั้งที่ ๒) เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ส่งผลให้การ ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ เริ่มต้น	สิ้นสุด	วัตถุประสงค์ของการดำเนิน โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/ กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด เสนอผล ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ	
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด				
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามและ รายงานการตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้ ความถี่ด้วยเทคโนโลยี Video Streaming	กท.	๖.๒๔๗	๐.๑๗๗	ปี ๒๕๖๗ (๕.๓๑๐)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	เพื่อจัดทำอุปกรณ์ที่ติดตาม และรายงานการตรวจสอบและ กำกับดูแลการใช้ความถี่ด้วย เทคโนโลยี Video Streaming			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ดำเนินการตรวจรับรายงานงบงวดที่ ๒ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย การศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบติดตามและรายงานการตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้ความถี่ ด้วยเทคโนโลยี (Video Streaming) ที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีปัจจุบัน โดย ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามขอบเขตของงานงวดที่ ๓ ซึ่งจะครบกำหนด ส่งมอบงานในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ อาทิ จัดทำระบบติดตามและติดตั้งใน แม่ข่ายเสมือนที่สำนักงาน กสทช. จัดเตรียมไว้ให้ และออกแบบและพัฒนา ระบบและแอปพลิเคชันให้สามารถใช้งานได้ด้วย Browser ตามที่กำหนด เป็นต้น	๕๐.๐๐		✓	๑. จำนวนระบบ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากพิจารณา เอกสารข้อเสนอกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและเอกสารด้าน เทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอเบื้องต้นที่กำหนดการที่ซับซ้อน จำเป็นต้อง มีการตรวจพิสูจน์ให้เป็นที่ยอมรับก่อนดำเนินการประกวดราคา ราคา อีกทั้งในการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอ การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีไว้ในความถูกต้องครบถ้วนและเป็นธรรมแก่ ผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย	-	
๓	โครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับ การออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๔๘ ชุด	กท.	๒๒.๔๕๕	๓.๑๖๘	ปี ๒๕๖๗ (๑๕.๐๘๗)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	เพื่อจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล สำหรับออกอากาศของสถานี วิทยุกระจายเสียง จำนวน ๔๘ ชุด		✓			ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสารสนเทศดิจิทัล โทรคมนาคม หรือ หน่วยงานอื่น ๆ ในสังกัดกระทรวงสารสนเทศฯ ฯลฯ เพื่อร่วมจัดทำข้อตกลง (MOU) ร่วมกันเรื่องสิทธิ์ในการติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขขอบเขต ของงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และเป็นไปตามความเห็นของคณะทำงาน กลุ่มภารงานร่วมของหน่วยงานของสำนักงาน กสทช. ซึ่งคณะกรรมการจัดทำ ขอบเขตของงาน มีความเห็นว่า ให้ติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว จำนวน ๔๘ ชุด ในพื้นที่ร่วมกับติดตั้งของสำนักงาน กสทช. ภาค ๑-๕ และสำนักงาน กสทช. เขตในสังกัด โดยได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขขอบเขตของงาน (TOR) และได้รับอนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และได้รับอนุมัติราคากลาง เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามลำดับ โดยประกาศ ประกวดราคา วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ได้กำหนดให้ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ซึ่งในประกาศประกวดราคา พบว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอจำนวน ๒ ราย แต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา โดย เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการพิจารณาฯ จึงได้รายงานผลการ พิจารณา โดยเห็นควรให้ยกเลิกการจัดซื้อครั้งนี้ โดยสำนักงาน กสทช. ได้มี ประกาศยกเลิกการประกวดราคาโครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับ การออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๔๘ ชุด แล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ จึงจะดำเนินการจัดซื้อใหม่อีกครั้งในปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๐.๐๐		✓	๑. จำนวนอุปกรณ์ฯ (๕ ชุด ในปี ๒๕๖๖ และ ๑๕ ชุด ในปี ๒๕๖๗) ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากโครงการมีความ จำเป็นต้องมีการทบทวนว่าขอบเขตของงานในเรื่องความชัดเจนเรื่อง สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ให้คำติดตั้งตรงครอบคลุมพื้นที่การใช้งานและมี กระบวนการในการสำรวจและประเมินงานก่อนเพื่อขอขออนุญาตใน การติดตั้งเบื้องต้น ไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน เพื่อให้การจัดทำ รายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเป็นไปตาม คู่มือแนวทางในการพิจารณาซื้อข้อมูลราคากลางและการคำนวณ ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ซึ่ง กรมบัญชีกลางจัดทำให้การดำเนินการประกวดราคา เกิดความล่าช้า ประกอบ กับข้อมูลปฏิบัติงานเป็นอุปกรณ์เฉพาะด้าน ที่ต้องใช้เวลาในการศึกษา ข้อมูลของตัวอุปกรณ์ เพื่อนำมาคำนวณและกำหนดราคากลาง ประกอบกับ ในขั้นตอนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า มีผู้ยื่น ข้อเสนอ จำนวน ๒ ราย แต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดใน เอกสารประกวดราคา จึงต้องดำเนินการยกเลิกการประกวดราคา และดำเนินการขั้นตอนประกวดราคาใหม่อีกครั้ง (ครั้งที่ ๒) เพื่อให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ส่งผลให้ไม่ สามารถจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ในปี ๒๕๖๖	-		
๓	โครงการเครื่องมือตรวจสอบการใช้ความถี่ วิทยุในการตรวจสอบข่ายสื่อสารการจัดงาน พระราชพิธีของสำนักงาน กสทช. ภาค ๑ จำนวน ๕ สถานี	กท.๑	๓๐.๔๕๒	๒๒.๓๘๐	ปี ๒๕๖๕ (๗.๑๗๒)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อจัดหาเครื่องมือตรวจสอบ การใช้ความถี่วิทยุประเภท Cellular Technology แบบ ประจำที่ และแบบเคลื่อนที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้ ความถี่ของผู้นประกอบการ ข่ายสื่อสารของหน่วยงานต่างๆ ที่ มีการใช้งานประเภท Cellular Technology			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ตรวจรับส่งมอบงานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ และวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตามลำดับ ประกอบด้วย การจัดหาชุดควบคุม สิ่งการและการแสดงผล และชุดเครื่องมือตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุสายสื่อสารในระบบโครงข่ายของ สถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเคลื่อนที่จำนวน ๕ สถานี และแบบ เคลื่อนที่ จำนวน ๑ สถานี พร้อมอุปกรณ์เสริม และ Software จำนวน ๑ ชุด เครื่องมือตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุข่ายสื่อสารในระบบโครงข่ายของสถานี ฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบติดตั้งที่งาว จำนวน ๑ สถานี พร้อมทั้งจัดฝึก อบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่นักงานสำนักงาน กสทช. ณ สำนักงาน กสทช. ภาค ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ซึ่งผลสัมฤทธิ์จากการ ดำเนินการส่งผลให้สำนักงาน กสทช. ภาค ๑ มีเครื่องมือตรวจสอบการใช้ ความถี่วิทยุในการตรวจสอบข่ายสื่อสารการจัดงานพระราชพิธีจำนวน ๕ สถานี สำหรับตรวจสอบความผิดปกติและการรบกวนการติดต่อสื่อสารในการจัดงาน พระราชพิธีที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถดำเนินการตามขั้นตอน โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ส่งได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาตได้อย่างอัตโนมัติแบบ real time ทำให้สามารถนำข้อมูลตรวจสอบมาประกอบการตัดสินใจในการ ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว	๑๐๐.๐๐		✓	๑. จำนวนคู่มือที่โครงการฯ ๕ สถานี ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐	-	มีการปรับแผนงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๑๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕		
๓	โครงการจัดทำต้นแบบชุดตรวจสอบ คลื่นความถี่ของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค	กท.๑	๔.๗๑๒	๓.๔๐๖	ปี ๒๕๖๕ (๑.๓๐๖)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อจัดทำระบบวิดีโอวอลล์ (Video Wall) และระบบ ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการ ใช้ความถี่วิทยุ สำหรับการจัดทำ ชุดตรวจสอบคลื่นความถี่ใน พื้นที่สำนักงาน กสทช. ภาค ๑ (ต้นแบบ)			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานประจำงวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ประกอบด้วย การติดตั้ง เว็บทำข้อมูลคลื่นความถี่บน VM ของสำนักงาน กสทช. ภาค ๑ พร้อมทั้งจัด ฝึกอบรมระบบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ ณ สำนักงาน กสทช. ภาค ๑ เมื่อ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ซึ่งผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินการส่งผลให้สำนักงาน กสทช. ภาค ๑ มีระบบต้นแบบชุดตรวจสอบคลื่นความถี่ของสำนักงาน กสทช. ภาค ๑ และเขตในสังกัด เพื่อให้ใช้ในการตรวจสอบ รวมรวม วิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารความถี่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงาน กสทช. ภาค ๑ อีกทั้งมีอุปกรณ์สำหรับการแสดงผลข้อมูลการตรวจสอบการใช้ความถี่เพื่อ รองรับการตั้งศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่แห่งชาติสำนักงาน กสทช. ที่จะช่วยให้ สำนักงาน กสทช. ภาค ๑ สามารถนำข้อมูลในการตรวจสอบคลื่นความถี่มา ประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ ทันต่อเหตุการณ์ยิ่งขึ้น	๑๐๐.๐๐		✓	๑. จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐	-			

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีผูกพัน ต่อเมือง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ เริ่มต้น	สิ้นสุด	วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
๓	โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๒ พร้อมอาคารประกอบ	ภ.ภ.๒	๖๙.๐๒๗	๔๔.๓๑๙	ปี ๒๕๖๕ (๒๐.๗๐๘)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อให้ได้เป็นศูนย์บริหารงานในการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมในพื้นที่รับผิดชอบสามารถรองรับหน่วยงานภายในสังกัดอย่างเพียงพอ สดวก และเกิดความสะดวกสบายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และผู้ให้บริการ			✓				๑๐.๐๐		✓	๑. จำนวนอาคารที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๒ ๑ หลัง ๒. จำนวนอาคารบ้านพัก ๕ หลัง ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐	เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ตามแผนในปี ๒๕๖๕ รวมถึงยังไม่ได้รับการอนุมัติสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี ๒๕๖๖ และในการดำเนินงานระหว่างกระบวนการเพิ่มแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๖ ทำให้ราคากลางที่ได้รับการอนุมัติครั้งที่ ๑ ขณะออกงบจัดซื้อดำเนินการทรวราภาคกลางเหนืออีกครั้ง (ครั้งที่ ๒) ประกอบกับกรณีขีตกลางได้ประกาศเปลี่ยนเป็นสัญญาออกเบย์เป็นสัญญาให้ใช้เป็นแผนในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงราคา Factor F ใหม่ทำให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อกำหนดราคากลางและเสนอขออนุมัติใหม่ (ครั้งที่ ๓) ซึ่งแต่ละครั้งใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเป็นจำนวนมาก รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างในภาคก่อสร้างมีขั้นตอนในการดำเนินการหลายขั้นตอน และการดำเนินการแต่ละขั้นตอนต้องใช้เอกสารตัวจึงไม่สามารถใช้เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทำให้แต่ละขั้นตอนต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการจำนวนมากจนทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด	-
๓	โครงการบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒	ภ.ภ.๒	๖.๖๓๖	๑.๑๗๑	ปี ๒๕๖๕ (๔.๖๔๕)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ ให้ความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ปลอดภัยต่อทรัพย์สินของสำนักงาน กสทช. ตลอดจนประชาชนที่เข้ารับบริการ				✓			-	✓	๑. จำนวนระบบ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐	เนื่องจากเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงาน กสทช. เพื่อชี้แจงรายละเอียดข้อสรุปงบประมาณโครงการ ประกอบกับ ขอบเขตของงานและราคากลาง และแผนการดำเนินงานโครงการบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ พบว่า ยังขาดความชัดเจน ดังนั้น คณะทำงานกลุ่มรองฯของเขตงานในการจัดทำพัสดุของสำนักงาน กสทช. ได้มีความเห็นให้ปรับกรอบวงเงินของงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตของรายการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อนเสนอคณะทำงานกลุ่มรองฯของเขตงานในการจัดทำพัสดุของสำนักงาน กสทช. เพื่อพิจารณาอีกครั้งต่อไป ซึ่งต่อมาคณะกรรการรองฯของเขตของงานในการจัดทำพัสดุของสำนักงาน กสทช. ได้พิจารณาขอขบของงานที่ได้ปรับปรุง (ครั้งที่ ๒) แล้วมีความเห็นว่า การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้มีรายการที่หลากหลาย ซึ่งส่งผลต่อการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอว่า เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง จึงขอให้กลับไปปรับวงเงินและปรับปรุงแก้ไขร่างของเขตงาน ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตของรายการจัดซื้อจัดจ้างใหม่อีกครั้ง ประกอบกับ ขอขบเขตงานดังกล่าว ยังมีครุภัณฑ์รายการที่หลากหลาย ทั้งงานลักษณะการก่อสร้าง การปรับปรุงการจัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน การปรับปรุงการจัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน กสทช. ภาค ๒ (ภ.ภ.๒) จึงพิจารณาและเห็นควรขอปรับแผนงบประมาณรายจ่ายโครงการบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน กสทช.ภาค ๒ เพื่อขอคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ หมวดโครงการ รายการโครงการบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด โดยปัจจุบันสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ (ภ.ภ.๒) ได้ดำเนินการปรับแผนงบประมาณดังกล่าวไปยังสำนักกิจการภูมิภาค และอยู่ระหว่างสำนักกิจการภูมิภาค (ภ.ภ.) ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ เริ่มต้น	สิ้นสุด	วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
๓	โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของ สำนักงาน กสทช. ภาค ๒	ภ.๒	๑๒.๑๐๒	๑๒.๑๐๒	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อก่อสร้างอาคารบ้านพัก พนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ก่อสร้าง จำนวน ๕ หลัง (๕ อนุมัติ)			✓			๑๐.๐๐	✓		๑. จำนวนบ้านพักพนักงาน เสร็จสมบูรณ์พร้อมเข้าอยู่ ๕ หลัง ๒. ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินการตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๘ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายเงิน ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐	เนื่องจากในข้อประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอ เพื่อรับราคา ๖ จัดตั้งดำเนินการยกเลิกการประกวดราคา และดำเนิน ขั้นตอนประกวดราคาใหม่อีกครั้ง (ครั้งที่ ๒) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ทำให้ราคากลางที่ได้รับ จากอนุมัติครั้งที่ ๑ ขณะออกอยู่ จัดตั้งดำเนินการทบทวนราคากลาง ใหม่อีกครั้ง (ครั้งที่ ๒) ประกอบกับการอนุมัติกลางได้ประกาศ เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยสำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ราคากลางจากอัตราเงินกู้ยืมไปตรงจาก Factor F ใหม่ทำให้ คณะกรรมการกำหนดราคาของจัดตั้งสำนักงานราคากลางและเสนอ อนุมัติใหม่ (ครั้งที่ ๓) ส่งผลให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	-	
๓	โครงการก่อสร้างภูมิสถาปัตย์ พร้อม สิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงาน กสทช. เขต ๓๔	ภ.๓	๑๐.๕๐๐	๙.๗๖๐	ปี ๒๕๖๕ (๒๐.๗๕๐)	ม.ค.-๖๔	ธ.ค.-๖๖	เพื่อให้ภูมิสถาปัตย์ของ สำนักงาน กสทช. เขต ๓๔ เกิดความสวยงาม สดวก ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ การทำงานรองรับการก่อสร้าง สำนักงาน กสทช. เขต ๓๔			✓		๑๐.๐๐	✓	๑. จำนวนสิ่งก่อสร้างและ/หรือ ระบบสาธารณูปโภคโดยรอบ อาคารสำนักงานมีความสวยงาม พร้อมใช้งาน ๑ หลัง/ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายเงิน ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ ๓. ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้ให้บริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากโครงการก่อสร้าง ภูมิสถาปัตย์พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงาน กสทช. เขต ๓๔ พบ ปัญหาพบในบางก่อสร้างซึ่งมีระยะเวลาการ จัดส่งยังไม่สามารถ ดำเนินการก่อสร้างในส่วนได้ ทำให้ต้องดำเนินการขออนุมัติขยาย ระยะเวลาการก่อสร้างออกไป และแก้ไขสัญญาจ้าง รวมทั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาการเปรียบเทียบราคา ค่าวัสดุและแรงงานที่แพงเกิน จึงมีมติให้ผู้รับจ้างทบทวน ปริมาณงานและราคา ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อ พิจารณา ประกอบกับผู้รับจ้างผูกขาดดำเนินการโดยไม่ทราบสาเหตุ เบื้องต้นคาดว่าผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงิน ประกอบกับช่วงที่ ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการเป็นช่วงฤดูฝน ส่งผลให้พื้นดินรอบ ๆ โครงการ ก่อสร้างมีความอ่อนตัวและเปียกแฉะและ ยากต่อการนำเครื่องจักร เข้าดำเนินการก่อสร้าง จึงทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการตาม แผนการทำงาน และไม่สามารถส่งมอบงานตามกำหนดได้ ทั้งนี้ สัญญา การก่อสร้างฯ ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ สำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือแจ้งเจ้าพนักงานเงินโอนโอนสัญญาฯ เรียบร้อยแล้ว	มีการปรับแผนงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔			

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ เริ่มต้น	สิ้นสุด	วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
๓	โครงการสถานีแม่พระวังการแพ่งระยองขึ้น เพื่อการค้ากับศูนย์ของสำนักงาน กสทช. ภาค ๔	ภ.๔	๑.๑๔๐	๕.๔๔๐	ปี ๒๕๖๕ (๔.๕๐๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อจัดตั้งสถานีแม่พระวังการแพ่ง กระจายพื้นที่แม่เหล็กไฟฟ้าแบบ คอลดเทรค เช่น โรงเรียนบาล โรงเรียนเล็ก และแม่พระวังการ รวมทางสัญญาณเคเบิลหรือสื่อ ทางการแพทย์ที่อาจส่งผลกระทบต่อ ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและ ผลกระทบต่อกันแม่เหล็กไฟฟ้าที่ ของสำนักงาน กสทช. ภาค ๔			✓				๑๐.๐๐		✓	๑. จำนวนสถานีแม่พระวังการ แพ่งระยองที่ ๑ สถานี ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากโครงการสถานี แม่พระวังการแพ่งระยองขึ้นเพื่อการค้ากับศูนย์ของสำนักงาน กสทช. ภาค ๔ ต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาตรวจสอบเอกสารให้ละเอียด รวมทั้งเอกสารมีปริมาณมากที่ต้องพิจารณาเอกสารก่อนอนุมัติ/ รับทราบในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการ เบิกจ่ายเงิน อย่างไรก็ตามสำนักงาน กสทช. โดยสำนักงาน กสทช. ภาค ๔ (ภ.๔) ได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ และดำเนินการอนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการ เสนอ สทช. (ภ.) รก. สทช. เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เบียร์เรียบร้อยแล้ว ส่งผลการ เบิกจ่ายงบประมาณแล้วข้ากว่าแผนที่กำหนด	-
๓	โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๓๔ (เชียงราย)	ภ.๓	๑๔.๔๑๔	๑๔.๔๑๔*	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. ภาค ๓ ให้มีสถานที่ สำหรับปฏิบัติงานของพนักงาน กสทช. รองรับภารกิจของ สำนักงาน กสทช. เขต ๓๔			✓				๘๐.๐๐		✓	๑. จำนวนที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๓๔ จำนวน ๑ หลัง ๒. ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ๓. ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ๔. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตาม แผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๕	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากพบปัญหาแบบ จัดซื้อ จากการออกแบบและทางเทคนิค/การติดตั้ง/แบบรายการ ปรับแก้แบบรายการปริมาณงานและราคา จึงต้องดำเนินการ ปรับแก้แบบรายการและอนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง ครีทีที ๕ และ ครีทีที ๖ ทำให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่สามารถตรวจรับงาน วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๕ และ ๑๔ (วันสุดท้าย) ตามที่ผู้รับจ้างเสนอได้ ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนและไม่สามารถเบิกจ่ายให้ เสร็จสิ้นได้ภายในงบประมาณ ๒๕๖๖	มีการปรับแผนงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครีทีที ๑๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ เริ่มต้น	สิ้นสุด	วัตถุประสงค์ของงานดำเนิน โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/ กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ			
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด						
๓	โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. ภาค ๓	ภ.๓	๑๑.๒๕๘	๑๑.๒๕๘*	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. ภาค ๓ โดยมีสถานที่สำหรับปฏิบัติงานของสำนักงานและรองรับภารกิจของสำนักงาน กสทช. ภาค ๓			✓				๗๕.๐๐	✓		๑. จำนวนที่ทำการสำนักงาน กสทช. ภาค ๓ จำนวน ๑ หลัง ๒. ร้อยละความแล้วเสร็จของงานดำเนินการตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๓. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ๔. ร้อยละการเบิกจ่ายเงินตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากปัญหาหลังบริเวณติดกับพื้นที่ซึ่งทำให้ไม่สามารถก่อสร้างได้ตามแบบรูปรายการ จึงต้องขยายระยะเวลาสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑) ออกไปจำนวน ๓๓๑ วัน และต่อมาในภาคก่อสร้าง พบปัญหาแบบรูปไม่ชัดเจนและไม่ครบถ้วนไม่เอื้ออำนวยต่อการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก และไม่สะดวกเกี่ยวกับการขนานน้ำหนัก ซึ่งต้องหารือร่วมกับผู้ออกแบบโครงการแก้ไขแบบรูปรายการ ซึ่งต่อมาผู้รับจ้างมีความเห็นว่า การปรับแก้ไขของผู้ออกแบบส่งผลกระทบต่อวงเงินที่ดำเนินการไปแล้วบางส่วน รวมทั้งงานส่วนอื่นไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ผู้รับจ้างจึงขอหยุดการดำเนินงานก่อสร้างทั้งหมดเพื่อขอสรุปเรื่องระบบระบายน้ำบนหลังคาก่อนเริ่มดำเนินงานต่อ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๘๑ วัน สำนักงานฯ จึงขยายระยะเวลาสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. ภาค ๓ ออกไป โดย ผทช. รก. ลสทช. ได้มีอนุมัติเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ ให้ออกขยายเวลาสัญญาจ้างก่อสร้าง ออกไปจำนวน ๘๑ วัน ซึ่งได้ครบกำหนดสิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ตามแนวทางปฏิบัติของหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ วันที่ ๓๓ (ทวจ) ๐๔๐๕.๒/๖๔๕๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้กำหนดแนวทางการปรับแผนงานใหม่ โดยมีอยู่สัญญาดำเนินการแก้ไขสัญญาให้วิศวกรดำเนินรับร้อยละ ๐ และดำเนินการรับแผนการทำงานใหม่ตามหน่วยงานของรัฐได้มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการปรับแผนการทำงานใหม่ กรณีสัญญาที่ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา ให้กำหนดให้แผนงานดังกล่าวเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างต่อไป โดยในการจัดทำแผนการทำงานหรือการรับแผนการทำงานใหม่ ให้กำหนดวันที่จะให้สัญญาเริ่มปฏิบัติงานตามแผนการทำงาน สำหรับกรณีสัญญาได้มีการกำหนดวงเงินและวงเงินไม่สัมพันธ์กัน ในการแก้ไขสัญญาเพื่อดำเนินการปรับแผนการทำงานใหม่ ให้แก่โครงการงานและวงเงินให้เหมาะสม และมีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ สำนักงาน กสทช. ๓ จึงได้รายงานแผนการทำงานโครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. ภาค ๓ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยฯ เลขที่ ลสทช. รับทราบแผนการทำงานที่ผู้รับจ้างส่งแผนการทำงานใหม่ โดยแผนการทำงานใหม่ของโครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. ภาค ๓ กำหนดให้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๗ ซึ่งสำนักงาน กสทช. ภาค ๓ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างฯ ได้ร่วมกันติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้างรายเดือนและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการทำงาน ตามมาตรการของ กวช. อย่างเคร่งครัด และนำส่งรายงานประเมินผลการดำเนินงานประจำเดือนให้แก่สำนักกิจการภูมิภาค ขณะนี้งานก่อสร้างมีความคืบหน้าร้อยละ ๗๕ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้มีความเห็นให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างต่อไป พร้อมทั้งอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้าง เพื่อยังส่งงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วตามแผนการทำงานที่กำหนด				มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖
๔	แผนงานบริหารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	สท.	๓๑๑.๗๕๔	๓๑๑.๗๕๔	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาศักยภาพในการกำกับดูแลและส่งเสริมกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ และพัฒนากลไกในการกำกับดูแลด้านเนื้อหา การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน และคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์			✓			๘๘.๗๒	✓		ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	-				
๔	แผนงานบริหารกิจการโทรคมนาคม	ทค.	๔๘๗.๖๐๑	๔๘๗.๖๐๑	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาศักยภาพในการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมและเสริมสร้างความเข้มแข็งและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม			✓				๗๘.๗๗	✓		ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	-			
๔	แผนงานสนับสนุนการกิจการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียมสื่อสาร	ยท.	๑๔๙.๘๘๗	๑๔๙.๘๘๗*	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของ กสทช. ที่มีความเร่งด่วนที่ขอต่อดำเนินการ สามารถแก้ไขปัญหาด้านสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์			✓				๑๐.๑๕	✓		ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตามลำดับ			

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ เริ่มต้น	สิ้นสุด	วัตถุประสงค์ของงานดำเนิน โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/ กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
๔	งานสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เพื่อดำเนินการเกี่ยวเนื่องทางด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ โทรคมนาคม หรือด้านวิทยุคมนาคมที่จัดขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสาธารณูปโภค	อบ.	๑๑๑.๑๖๐	๑๑๑.๑๖๐	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เพื่อดำเนินการเกี่ยวเนื่องทางด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ โทรคมนาคม หรือด้านวิทยุคมนาคมที่จัดขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสาธารณูปโภค				✓		๑๑๑.๑๖๐	✓		๑. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	-	
๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์	นบ.	๑๙.๓๒๖	๙.๓๒๖	ปี ๒๕๖๕ (๑๐.๐๐๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวม วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลที่อยู่ในเครือข่ายเว็บและโซเชียลมีเดียประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเท่าเทียมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รองรับการทำงานจากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาใช้งานพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มขึ้น และมีจำนวนสิทธิ์การใช้งานเพียงรองรับกับความต้องการใช้งาน				✓		๑๐๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐	-	-	
๔	โครงการศึกษาแนวทางในการพัฒนาหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียงและกิจการสื่อสารเคลื่อนที่เคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงไป	วส.	๔.๘๓๒	๐.๘๓๒	ปี ๒๕๖๕ (๓.๘๓๕)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ในปัจจุบันครอบคลุมมิติที่สมควรปรับเปลี่ยน ตลอดจนรวบรวมความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ไทยและจัดทำชุดฯ หลักเกณฑ์สำหรับกำกับดูแลการให้บริการแพร่ภาพและเสียงผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งมีประโยชน์ที่จะช่วยให้สอดรับกับบริบทของอุตสาหกรรมและงานแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป				✓		๑๐๐.๐๐	✓		๑. จำนวนรายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ ๑ ฉบับ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐	-	-	
๔	โครงการติดตามประเมินผลงานมิติเชิงสังคมโดยใช้ปีแอด (CIP Model) สำหรับสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	วส.	๔.๘๐๐	๐.๖๕๐	ปี ๒๕๖๕ (๓.๓๕๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อศึกษาวิเคราะห์และติดตามประเมินผลโครงการในมิติทางสังคมของสายงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เสนอต่อระดับนโยบาย				✓		๑๐๐.๐๐	✓		๑. จำนวนรายงานและข้อเสนอแนะฯ ๑ ฉบับ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐	-	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเมือง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ เริ่มต้น	สิ้นสุด	วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
๔	โครงการจัดพิมพ์ฐานข้อมูลเพื่อยกระดับข้อมูลในรูปแบบ Data Visualization สำหรับรายงานกิจกรรมกระจายเสียงและโทรทัศน์	ศว.	๑.๕๐๐	๑.๕๐๐	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลของรายงานกิจกรรมกระจายเสียงและโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่ผ่านศูนย์ข้อมูลออนไลน์ และเพื่อยกระดับข้อมูลของรายงานกิจกรรมกระจายเสียงและโทรทัศน์ไปสู่การเป็นสารสนเทศ (Information) ในรูปแบบ Data Visualization โดยครอบคลุมเนื้อหา อย่าง ครบถ้วน และนำเสนอต่อสาธารณะผ่านศูนย์ข้อมูลออนไลน์ของรายงานกิจกรรมกระจายเสียงและโทรทัศน์						✓			๑. จำนวนระบบ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อยกระดับข้อมูลในรูปแบบ Data Visualization สำหรับรายงานกิจกรรมกระจายเสียงและโทรทัศน์ เมื่อ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ เนื่องจากสำนักวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจดิจิทัล (ศว.) ได้พิจารณาบททวนชุดข้อมูล (ร่าง) ของแผนของงานโครงการจัดพิมพ์ฐานข้อมูลเพื่อยกระดับข้อมูลในรูปแบบ Data Visualization สำหรับรายงานกิจกรรมกระจายเสียงและโทรทัศน์ ร่วมกับฝ่ายเลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนการวิจัยทุนการให้บริกาฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของแผนแม่บทกิจกรรมกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๒ (สำนักรับผิดชอบและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์) และผู้รับผิดชอบระบบ Data Center และการจัดทำ Data Visualization ของสำนักงาน กสทช. (สำนักบริหารข้อมูลกลาง (บย.)) ตามความเห็นชอบคณะกรรมการจัดทำของของงานฯ เพื่อพิจารณาบททวนชุดข้อมูลและขอเบรคการดำเนินงานใน (ร่าง) ของแผนของงานโครงการดังกล่าว ซึ่งสำนักบริหารข้อมูลกลาง (บย.) อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการเพื่อประเมินผลกระทบระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อช่วยวิเคราะห์และแสดงผลในลักษณะ Data Visualization ภายใต้งบประมาณปี ๒๕๖๕ และพร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงานที่สำนัก ทร. เสนอ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณของสำนักงาน กสทช. จึงเห็นควรยกเลิกการดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว	-	
๔	โครงการปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอดสดและรายงานข่าวการแข่งขันทีนาฬิกากีฬาที่ สหทัยของประเทศไทย	ปส.	๗๖.๐๗๗	๗๘.๐๘๘	ปี ๒๕๖๕ (๗๘.๐๘๘)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอดสดและรายงานข่าวการแข่งขันทีนาฬิกากีฬาที่ สหทัยของประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางในการจัดการถ่ายทอดสด และรายงานข่าวการแข่งขันทีนาฬิกากีฬาที่ สหทัยของประเทศไทย ได้อย่างสมบูรณ์ และทันสมัยรองรับเทคโนโลยี 4K และเตรียมความพร้อมในการดำเนินการถ่ายทอดสดและรายงานข่าวการแข่งขันทีนาฬิกาเอเชียนเกมส์ ๒๐๒๒				✓		๑๐๐.๐๐	✓		๑. จำนวนศูนย์ถ่ายทอดสด ๑ ศูนย์ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐		-	
๔	โครงการพัฒนาระบบรองรับการเปลี่ยนผ่านการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	ปส.	๙.๗๗๗	๒.๗๗๗	ปี ๒๕๖๕ (๓.๐๐๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาระบบรองรับการเปลี่ยนผ่านการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำหรับรองรับกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้ฐานคลื่นความถี่และประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพื่อรองรับการบริการด้านการอนุญาตและการกำกับดูแลเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ที่มีผู้ความเป็นดิจิทัล				✓		๑๐๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบรองรับการเปลี่ยนผ่านการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐		-	
๔	โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และตรวจสอบเนื้อหารายการด้านการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารและยา และเพื่อให้มีเครื่องมือติดตามและกำกับดูแลผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับอนุญาตที่ให้บริการแพร่ภาพกระจายเสียง ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญาตในด้าน การโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารและยา	ปส.	๑๕.๗๗๗	๑๒.๕๘๒	ปี ๒๕๖๗ (๓.๑๙๕)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	เพื่อพัฒนาระบบวิเคราะห์และตรวจสอบเนื้อหารายการด้านการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารและยา และเพื่อให้มีเครื่องมือติดตามและกำกับดูแลผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับอนุญาตที่ให้บริการแพร่ภาพกระจายเสียง ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญาตในด้าน การโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารและยา				✓		๗๕.๐๐	✓		๑. ร้อยละของจำนวนสำนักที่เข้าใช้ฐานข้อมูลในระบบ ร้อยละ ๘๐ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕		-	

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ เริ่มต้น	สิ้นสุด	วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ	
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด				
๔	โครงการความร่วมมือการผลิตข่าวในพระราชสำนัก และการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธี และวีดิทัศน์ สำหรับบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	ปส.	๑๕.๐๐๐	๑๕.๐๐๐	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	๑. เพื่อให้ผู้รับอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สามารถแพร่ข่าวในพระราชสำนักโดยมีเนื้อหาและรูปแบบเดียวกับอย่างเหมาะสม และสอดคล้องตามประกาศ กสทช. ๒. จัดให้มีหน่วยงานที่มีความเหมาะสมในการผลิตข่าวในพระราชสำนักที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนำเอ ข่าวในพระราชสำนักไปเผยแพร่ได้อย่างทั่วถึง				✓			๑๐๐.๐๐	✓		๑. จำนวนการแพร่ข่าวข่าวในพระราชสำนัก ๕ ครั้ง ๒. ระยะเวลาเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕			
๔	โครงการสำรวจพฤติกรรมและวิเคราะห์ข้อมูลความนิยมของผู้ใช้วิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย	สส.	๖.๖๗๘	๖.๖๗๘	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อสำรวจพฤติกรรมและวิเคราะห์ข้อมูลความนิยมของผู้ใช้วิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย จากกรณีศึกษาต่าง ๆ อาทิ เครื่องรับวิทยุ ซอฟต์แวร์ออนไลน์ และนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลความนิยมของผู้ใช้วิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย			✓				๗๐.๐๐		✓	๑. จำนวนรายงานผลการศึกษาค่า ๑ ฉบับ ๒. ระยะเวลาเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๓. ระยะเวลาเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากใช้ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการจากเดิมด้วยวิธีคัดเลือก เป็นวิธีประกาศเชิญชวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากคณะทำงานการร่างขอบเขตของงาน ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเนื่องจากลักษณะในการดำเนินการสำรวจไม่มีความการที่ซับซ้อน จึงเห็นควรให้ปรับปรุงร่างขอบเขตของงาน (TOR) ใหม่ โดยให้เก็บค่าการประกวดราคาคือเปอร์เซ็นต์ (e-bidding) โดยใช้เกณฑ์ราคาเพื่อประกอบการเดิน ซึ่งต้องดำเนินการปรับปรุงตามความเห็นของคณะทำงาน ส่งผลให้การลงนามในสัญญาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด และไม่สามารถเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นได้ตามปีงบประมาณ ๒๕๖๖		
๔	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการตรวจราชการทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง	รท.	๕.๑๐๐	๕.๑๐๐	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการการตรวจราชการทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุกระจายเสียงตามแผนความถี่วิทยุจากกระจายเสียงระบบเอชพีเอ็ม สถานีวิทยุกระจายเสียงตามความถี่วิทยุจากกระจายเสียงระบบเอชพีเอ็มกำลังส่งต่ำ และสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตให้ทดลองออกอากาศตามหลักเกณฑ์ ให้เชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (BCS) ปัจจุบันอยู่สำนักงาน กสทช.			✓			๘๐.๐๐		✓	๑. จำนวนระบบ ๑ ระบบ ๒. ระยะเวลาเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากในการจัดทำและโทรทัศน์ระดับภูมิภาค ระยะที่ ๒ เป็นโครงการที่มีลักษณะการตรวจระบบเอชพีเอ็ม กำลังส่งต่ำ ซึ่งต้องส่งต่อไปยังระบบบริหารจัดการการตรวจราชการทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงนี้แต่ภายหลัง การดำเนินการไปประกาศฯ ค่าความถี่ไม่สามารถดำเนินการได้เสร็จสิ้นไป ๒๕๖๖ อีกทั้งการแก้ไขประกาศฯ ดังกล่าวพบว่า ไม่มีผลกระทบต่อการใช้งานระบบฯ นี้ สำนักกรมมาตรฐานวิศวกรรมในการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (รศ.) จึงได้เริ่มดำเนินการในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างต่อไป โดยเดือนในสัญญาเป็นในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ไม่สามารถเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นได้ตามปีงบประมาณ ๒๕๖๖			
๔	โครงการระบบตรวจสอบเชิงลึกกฎหมายจากการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ระดับภูมิภาค ระยะที่ ๒	ปส.	๑๑๐.๐๐๐	๒๐.๐๐๐	ปี ๒๕๖๕ (๖๕.๐๐๐) ปี ๒๕๖๗ (๔๕.๐๐๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๗	เพื่อเข้าระบบตรวจสอบเชิงลึกกฎหมายจากการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ระดับภูมิภาคเพิ่มเติม เพื่อให้มีเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบเนื้อหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายที่มีการออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศน์					✓			-	✓	๑. จำนวนระบบ ๑ ระบบ ๒. ระยะเวลาเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	โครงการระบบตรวจสอบเชิงลึกกฎหมายจากการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ระดับภูมิภาค ระยะที่ ๒ เป็นโครงการที่มีลักษณะการตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง เพื่อให้การใช้ข้อมูลปริมาณเก็บประมวลผลสูง จึงเห็นควรให้ยกเลิกการดำเนินการโครงการดังกล่าว โดย สทช. ได้อนุมัติให้ยกเลิกการดำเนินการโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ พร้อมทั้งเห็นชอบให้ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕		
๔	โครงการจัดตั้งพื้นฐานข้อมูลกิจการโทรคมนาคม และระบบรายงานเชิงวิเคราะห์เพื่อการบริหารงานข้อมูลกิจการโทรคมนาคม	ทท.	๑๐.๐๐๐	๑.๐๐๐	ปี ๒๕๖๕ (๗.๐๐๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลกิจการโทรคมนาคมและระบบรายงานเชิงวิเคราะห์เพื่อการบริหารงานข้อมูลกิจการ และปรับปรุงฐานข้อมูลการกำกับดูแล เพื่อจัดทำรายงานสภาอัยการและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการติดตามและกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบบูรณาการ (Single Profile) เดิมที่กำกับใช้บริการส่งข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการโทรทัศน์เคลื่อนที่อย่างเหมาะสม				✓			๑๐๐.๐๐	✓		๑. จำนวนฐานข้อมูล (ระบบ) ๑ ระบบ ๒. จำนวนระบบรายงานเชิงวิเคราะห์เพื่อการบริหารงานข้อมูลตามแผน ๑ ระบบ ๓. ระยะเวลาเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐			

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ เริ่มต้น	สิ้นสุด	วัตถุประสงค์ของงานดำเนิน โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/ กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
๔	โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยแอปพลิเคชัน (ปีที่ ๑)	ทท.	๔.๘๘๓	๔.๘๘๗	ปี ๒๕๖๕ (๓.๙๖๖)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อศึกษาและสำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องสำหรับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างเหมาะสม และกำหนดนโยบายแผนและมาตรการกับคู่ค้าให้มีประสิทธิภาพ			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ดำเนินการตรวจรับงานครั้งที่ ๒ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ผลการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรม การใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้านแอปพลิเคชันจากผู้ใช้งาน โดยเป็นข้อมูลในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการของผู้บริโภคการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผลการดำเนินการประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน "พุดมีคาเร" ตามแนวทางที่ได้จัดทำไว้ ผลการสำรวจ ศึกษา และวิเคราะห์ ข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการศึกษาคู่มือการใช้งานจากผู้ใช้งานในแอปพลิเคชัน "NetCare" ของสำนักงาน กสทช. โดยดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน API หรือ View Table และจัดเก็บในฐานข้อมูลของโครงการเพื่อแสดงผลลัพธ์ควบคู่กับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแอปพลิเคชันพุดมีคาเร ผลการออกแบบปรับปรุงแอปพลิเคชัน "พุดมีคาเร" ให้รองรับการพัฒนาเวอร์ชันใหม่ในอนาคต และสามารถเชื่อมต่อไปยังแอปพลิเคชัน หรือ เว็บไซต์ ของสำนักงาน กสทช. รายงานการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยแอปพลิเคชันอย่างย่อ ๑๐ วันต่อเนื่อง และ ๔ เดือนต่อเนื่อง รายงานการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยแอปพลิเคชันในเดือนที่ ๑ ถึง เดือนที่ ๔ รายงานการวิเคราะห์และจัดทำรายงานสรุปเชิงนโยบาย (Policy Brief) ประจำเดือนสำหรับประเด็นที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อื่นจะนำไปสู่การผลักดันนโยบายต่าง ๆ ของสำนักงาน กสทช. ฯลฯ โดยได้นำข้อมูลที่ได้จากการดำเนินงานครั้งที่ ๒ มาดำเนินการตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง อาทิ การนำส่งข้อมูลให้กับสายงานวิชาการ ได้แก่ ปริมาณการใช้งาน อินเทอร์เน็ตเพื่อนำมากำหนดอัตราค่าบริการที่เหมาะสม และการนำข้อมูลบริการแอปพลิเคชันประเภท OTT ที่เอไปปรับปรุงนิยามตลาดและศึกษาแนวโน้มการทดแทนบริการที่เดิม นอกจากนี้ยังมีการใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันดังกล่าวเพื่อจัดทำและนำส่งแบบสอบถามไปยังภาคประชาชนเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจเรื่องบริการโทรคมนาคม การตระหนักถึงความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น เพื่อนำผลสำรวจที่ได้จากแบบสอบถามดังกล่าวมากำหนดนโยบายที่สอดคล้องต่อไป	๖๐.๐๐		✓	๑. จำนวนรายงานผลการสำรวจฯ ๑ ฉบับ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	เนื่องจากใช้ขั้นตอนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พบว่าโครงการดังกล่าวมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแจ้งถึงความจำเป็นและเหตุผลในการดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งการดำเนินการเชื่อมต่อข้อมูลที่มาจากแอปพลิเคชัน NetCare มีขั้นตอนที่ค่อนข้างประณีตและซับซ้อน และอื่นๆ เชื่อมให้สอดคล้องตามขั้นตอนการเชื่อมต่อข้อมูลส่วนบุคคล จึงต้องทำการประเมินวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูล การประเมินผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างรอบคอบก่อนการเชื่อมต่อข้อมูล เพื่อให้ไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนและไม่สามารถเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖	
๔	โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	ทท.	๒๐.๔๗๗	๑๐.๒๓๙	ปี ๒๕๖๗ (๑๐.๒๓๘)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๗	เพื่อสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสายสื่อสารและไฟฟ้าที่ห้อยเส้นทางในพื้นที่เพื่อจัดทำเส้นทางการมีความสำคัญหรือมีความจำเป็นในการดำเนินการนำระบบสายสื่อสารใต้ดินหรือจัดระเบียบสายสื่อสาร และนำข้อมูลที่ได้ลงระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศของสำนักงาน กสทช. เพื่อทำข้อมูลเส้นทางที่อนุญาตและไม่อนุญาตให้พาดสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ดำเนินการตรวจรับงานงวดงานครั้งที่ ๑ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ประกอบด้วย รายงานแผนการดำเนินงานโครงการ (Project Plan) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดงานครั้งที่ ๒ ประกอบด้วย ตัวอย่างโปรแกรมประยุกต์ (Prototype) ซึ่งแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ โดยจะดำเนินการออกแบบฐานข้อมูลและโครงสร้างข้อมูลโครงข่ายสายพร้อมรายละเอียดเชิงอธิบาย (attribute) เพื่อรองรับการใช้งานร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่จัดทำในโครงการ และการออกแบบตัวอย่างโปรแกรมประยุกต์ (Prototype) ซึ่งจะได้ prototype ต้นแบบสำหรับพัฒนาระบบในการนำข้อมูลที่ได้ลงระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศของสำนักงาน กสทช. มาเพื่อวิเคราะห์การอนุญาตพาดสายสื่อสารต่อไป	๖๐.๐๐		✓	๑. จำนวนระบบฯ และรายงานการสำรวจฯ ๑ ฉบับ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	เนื่องจากใช้ขั้นตอนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พบว่าผู้ยื่นเสนอราคาไม่ตรงตามแผนที่กำหนด จึงต้องดำเนินการยกเลิกการประกวดราคา และดำเนินการยื่นขอประกวดราคาใหม่อีกครั้ง (ครั้งที่ ๒) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕	
๔	โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยของประชาชน (p-safe)	ทท.	๔.๖๐๗	๒.๕๓๔	ปี ๒๕๖๗ (๒.๐๗๓)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๗	เพื่อจัดทำระบบบริหารจัดการแก้ไขสายสื่อสารเพื่อความปลอดภัยของประชาชน (P-safe) ให้สามารถรับส่งคำร้องขอประชาชนไปยังผู้ประกอบกิจการได้โดยผ่านระบบบริหารจัดการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และตอบกลับการแก้ไขผ่านระบบฯ ให้ผู้ร้องรับทราบผลการดำเนินการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รองรับนโยบายการพัฒนาสำนักงาน กสทช. ให้เป็นสำนักงานดิจิทัล		✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ดำเนินการตรวจรับงานงวดงานครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๔ (งวดสุดท้าย) แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตามลำดับ ประกอบด้วย ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ หน้าจอ Interface Web-Application ระบบ P-safe และ Mobile Application ผลงาน Source Code ของโปรแกรมประยุกต์ระบบ P-safe และการจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ P-safe ซึ่งสัมฤทธิ์ผลจากการดำเนินโครงการส่งผลให้สำนักงาน กสทช. สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนและติดตามการดำเนินการของผู้ประกอบกิจการได้อย่างรวดเร็ว ลดโอกาสในการเกิดอันตรายต่อประชาชน ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากสายสื่อสารได้อย่างรวดเร็วผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	๑๐๐.๐๐		✓	๑. จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕		มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕		

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเมือง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ เริ่มต้น	สิ้นสุด	วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการมีความก้าวหน้าร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ		
									ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผน	ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด					
๔	โครงการพัฒนาระบบการตรวจค้นและจับกุมตามกฎหมาย	ศท.	๑๔.๑๐๗๗	๑๑.๒๗๔๘	ปี ๒๕๖๕ (๕.๖๑๙๔)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการในภาคตรวจค้นและจับกุม ผู้กระทำผิดตามกฎหมาย และพัฒนาฐานข้อมูลการใช้การตรวจค้นและจับกุมตามกฎหมายของสำนักงาน กสทช. เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บริหารสำนักงาน กสทช. โดยมี การเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบต่าง ๆ ของสำนักงาน กสทช. ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับสายงานและในระดับสำนักงาน กสทช. ตรวจสอบ และควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามความเหมาะสม สอดคล้องกับแผนงานและสถานการณ์ปัจจุบัน				✓				๑๐๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕			
๔	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลบริการค้าส่งกิจการโทรคมนาคม (Telecom Wholesale Roadmap)	ศท.	๘.๘๖๓	๒.๖๕๙๙	ปี ๒๕๖๗ (๖.๒๐๔)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	เพื่อจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลบริการค้าส่งกิจการโทรคมนาคม (Telecom Wholesale Roadmap)			✓						๕๒.๐๐	✓	๑. จำนวนแผนพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแล ๑ แผน ๒. จำนวนคู่มือการส่งข้อมูลการใช้และเชื่อมต่อเครือข่ายโทรคมนาคม ๑ ฉบับ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ บริษัทที่ไม่ได้รับการคัดเลือกด้วยคะแนนสูงสุด ได้มีหนังสือขออุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เกี่ยวกับการแจ้งรายละเอียดในการพิจารณาเลือก โดยเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ สำนักงาน กสทช. โดย สำนักข้าราชการใช้แผนการใช้และเชื่อมต่อเครือข่าย (ชท.) ได้มีหนังสือแจ้งความเห็นต่ออุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ แก่ผู้ประมูลรายอื่น ซึ่งต่อมาผู้ยื่นอุทธรณ์ได้มีหนังสือแจ้งขออุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ แล้วเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖		
๔	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม	ศท.	๑๔๔.๖๓๑๑	๒๑.๖๗๔๔	ปี ๒๕๖๕ (๔.๓๓๙๔) ปี ๒๕๖๖ (๒๔.๘๘๗) ปี ๒๕๖๘ (๒๔.๙๒๖) ปี ๒๕๖๙ (๓๑.๘๘๗) ปี ๒๕๗๐ (๓๑.๒๖๕)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๗๐	เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ในการจัดทำรายละเอียดประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม และเพื่อให้คำปรึกษาและนำในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและบริหารแผนงาน/โครงการภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม			✓							๑๐.๐๐	✓	๑. จำนวน (ร่าง) แผนปฏิบัติการ/แผนงาน/โครงการ ๑ ฉบับ ๒. จำนวนรายงานตรวจสอบความคุ้มค่าความก้าวหน้า ปีละ ๑ ฉบับ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕		
๔	โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อภาพยนต์โฆษณาภายใต้แผนการจัดให้มีบริการ USO ประจำปี ๒๕๖๖	ศท.	๘.๐๐๐	๘.๐๐๐	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อจ้างผลิตสื่อภาพยนต์โฆษณาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการกักและโครงการภายใต้แผนการจัดให้มีบริการ USO เพื่อส่งเสริมการรับรู้ ความเข้าใจ หรือสร้างการตระหนักรู้ในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ของสำนักงาน กสทช. ในเชิงบวกต่อสาธารณชน โดยใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์			✓							๑๐.๐๐	✓	๑. จำนวนสื่อภาพยนต์โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า ๑ เรื่อง ๒. จำนวนการผลิตสื่อภาพยนต์โฆษณาต่อช่องทางออนไลน์ ไม่น้อยกว่า ๑ เรื่อง ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	เนื่องจากในขั้นตอนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว จึงต้องดำเนินการยกเลิกการประกวดราคา และดำเนินการประกวดราคาใหม่อีกครั้ง (ครั้งที่ ๒) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนและไม่สามารถเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นได้ตามใบ	

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีรายการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ เริ่มต้น	สิ้นสุด	วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด เสนอผล ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
๔	โครงการปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพของทาง ติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนในด้าน กิจการโทรคมนาคมร่วมกับผู้รับใบอนุญาต ประกอบกิจการโทรคมนาคม	ทท.	๐.๖๕๑	๐.๖๕๑	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาช่องทาง การติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่อง ร้องเรียนในด้านกิจการ โทรคมนาคมร่วมกับผู้รับ ใบอนุญาต โดยมีช่องทาง Web Portal ในการส่งเรื่อง ร้องเรียนพร้อมเอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงการแจ้งเตือน ผู้รับใบอนุญาตในการแก้ไขปัญหา เรื่องร้องเรียนและรายงานสถานะ ความคืบหน้าผลการแก้ไขปัญหา เรื่องร้องเรียนให้สำนักงาน กสทช. ทราบ			✓			๘๐.๐๐		✓	๑. จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	เนื่องจากในขั้นตอนการจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก พบว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอ เพียงรายเดียว โดยคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนเนื้อหา ซึ่งต้อง ดำเนินการยกเลิกและเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่อีกครั้ง (ครั้งที่ ๒) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง รวมไปถึงระยะเวลาจนกระทั่งได้ผู้รับจ้าง จำนวน ๑๕๓ วัน ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนและไม่สามารถเบิกจ่าย ให้เสร็จสิ้นได้ภายในงบประมาณ ๒๕๖๖	-	
๔	โครงการจัดพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ ระบบ Any Registration	ทท.๑	๘.๘๘๐	๗.๕๘๘	ปี ๒๕๖๕ (๑.๑๑๒)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาระบบงานที่มีส่วน เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาต ในกิจการวิทยุคมนาคมเพิ่มเติม และเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทำงานแบบออนไลน์ผ่านระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ หน่วยงานของรัฐ พัฒนาหรือ ปรับปรุงบริการของหน่วยงาน ให้ประชาชนสามารถขอรับ บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพจากจุด ให้บริการเดียว โดยมุ่งเน้น ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centric)			✓		๑๐๐.๐๐	✓	๑. จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่าย ของ ผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐		-			
๔	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการใช้และ เชื่อมต่อเครือข่ายโทรคมนาคม	ทท.	๔.๒๐๐	๖.๒๔๐	ปี ๒๕๖๕ (๒.๙๑๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการใช้ และเชื่อมต่อเครือข่ายโทรคมนาคม ของสำนักโทรข่ายพื้นฐาน การไว้ และเชื่อมโยงโครงข่าย โดยให้ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ ต่างๆ ของสำนักที่เกี่ยวข้องทั้งใน ระดับสายงาน และในระดับ สำนักงาน กสทช. และเพื่อเป็น ช่องทางในการประสานและ กำกับดูแลระหว่างสำนักงาน กสทช. กับผู้รับใบอนุญาต ประกอบ กิจการโทรคมนาคมให้เป็นไปตาม กฎหมายและประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง			✓		๑๐๐.๐๐	✓	๑. จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐		-			
