




สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

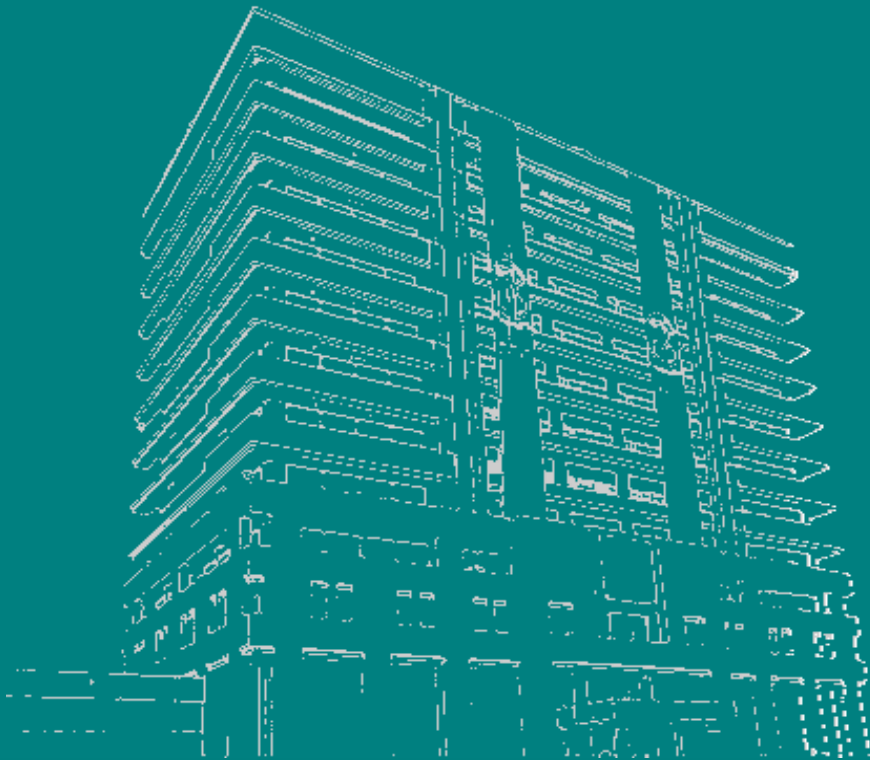

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช.
ประจำปี ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ (ยย.)


รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๕
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
ไตรมาสที่ ๓ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕)

สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๒^๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจำปี ไตรมาสที่ ๓ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕) สรุปสาระสำคัญดังนี้

๑. แผนและผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการในภาพรวมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๕

แผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๕ กำหนดงบประมาณรายจ่ายรองรับจำนวนทั้งสิ้น ๖,๗๖๕.๗๘๑ ล้านบาท แบ่งเป็น งบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. จำนวน ๕,๗๕๕.๗๘๑ ล้านบาท^๒ และเงินจัดสรรเข้ากองทุนฯ จำนวน ๑,๐๑๐.๐๐๐ ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ ๑

แผนภูมิที่ ๑ : งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ จำแนกตามยุทธศาสตร์

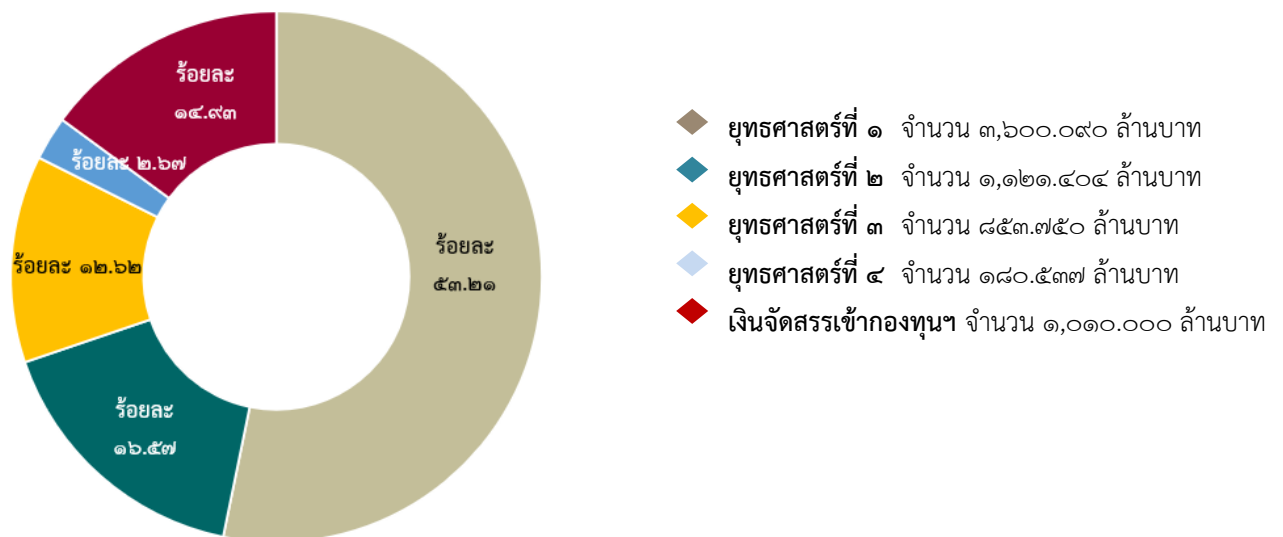


^๑ สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินการและการถ่ายทอดนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ เลขาธิการ กสทช. ได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ออกไปจนกว่าแผนยุทธศาสตร์สำนักงานฯ ฉบับใหม่จะประกาศและมีผลใช้บังคับ

^๒ มีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยดำเนินการตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการงบประมาณของสำนักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และปรับแผนงบประมาณรายจ่ายกลางปี ประจำปี ๒๕๖๕ ตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ณ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๕ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕) สำนักงาน กสทช. มีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ในภาพรวมภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ จำแนกรายยุทธศาสตร์ โดยมีแผนงาน (งานประจำ) /โครงการสำคัญรองรับการดำเนินการและเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของ กสทช. และขับเคลื่อนการ ดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ ๔ ยุทธศาสตร์ ๑๙ กลยุทธ์ จำนวน ๙๕ แผนงาน (งานประจำ)/โครงการ/งาน ดัง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๑ และแผนภูมิที่ ๒ - แผนภูมิที่ ๔

แผนภูมิที่ ๒ : ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๕

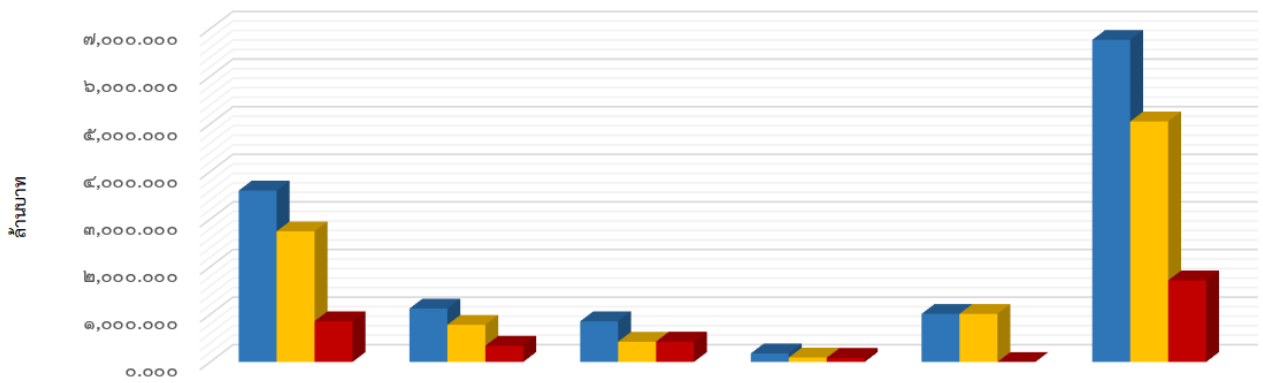


	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๔	เงินจัดสรรเข้ากองทุนฯ	รวมทั้งสิ้น
งบประมาณที่ได้	๓,๖๐๐.๐๙๐	๑,๑๒๑.๔๐๔	๘๕๓.๗๕๐	๑๘๐.๕๓๗	๑,๐๑๐.๐๐๐	๖,๗๖๕.๗๘๑
ผลการใช้จ่าย	๒,๗๔๓.๗๒๘	๗๘๐.๑๘๙	๔๒๕.๐๘๙	๙๓.๘๖๒	๑,๐๑๐.๐๐๐	๕,๐๕๒.๘๖๘
คงเหลือ	๘๕๖.๓๖๒	๓๔๑.๒๑๕	๔๒๘.๖๖๑	๘๖.๖๗๕	๐.๐๐๐	๑,๗๑๒.๙๑๓

ตารางที่ ๑ : ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๕
(ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๕)


ยุทธศาสตร์	จำนวนแผนงาน/โครงการ/งานที่ติดตาม							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ/กระบวนการทางพัสดุฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ
	แผนงาน (๑)	คิดเป็นร้อยละของแผนงานทั้งหมด	โครงการ (๒)	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	งาน (๓)	คิดเป็นร้อยละของงานทั้งหมด	รวมแผนงาน/โครงการ/งาน (๑)-(๓)					
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน	๒	๔๐.๐๐	๒๕	๓๑.๖๕	๑	๙.๑๐	๒๘	๕	๑๔	๙	๐	๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ผลักดันการขับเคลื่อนแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทิศทางที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ	๓	๖๐.๐๐	๓๕	๔๔.๓๐	๒	๑๘.๑๘	๔๐	๕	๑๙	๑๔	๐	๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน	-	-	๑๗	๒๑.๕๒	๔	๓๖.๓๖	๒๑	๒	๑๐	๘	๐	๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยกระดับการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์	-	-	๒	๒.๕๓	๔	๓๖.๓๖	๖	๐	๕	๐	๐	๑
รวมทั้งสิ้น	๕	๑๐๐.๐๐	๗๙	๑๐๐.๐๐	๑๑	๑๐๐	๙๕	๑๒	๔๘	๓๑^ม	๐	๔

^ม ในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงาน เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ

แผนภูมิที่ ๓ : แผนงาน/โครงการแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๕
(ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๕)

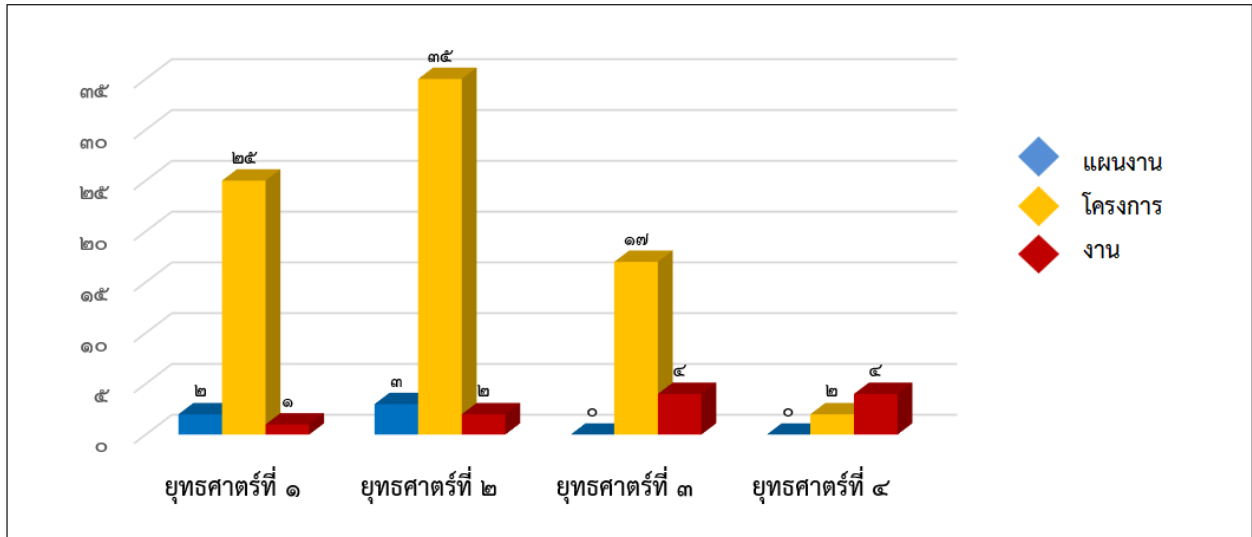

แผนภูมิที่ ๔ : สถานะการดำเนินตามแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๕
(ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๕)

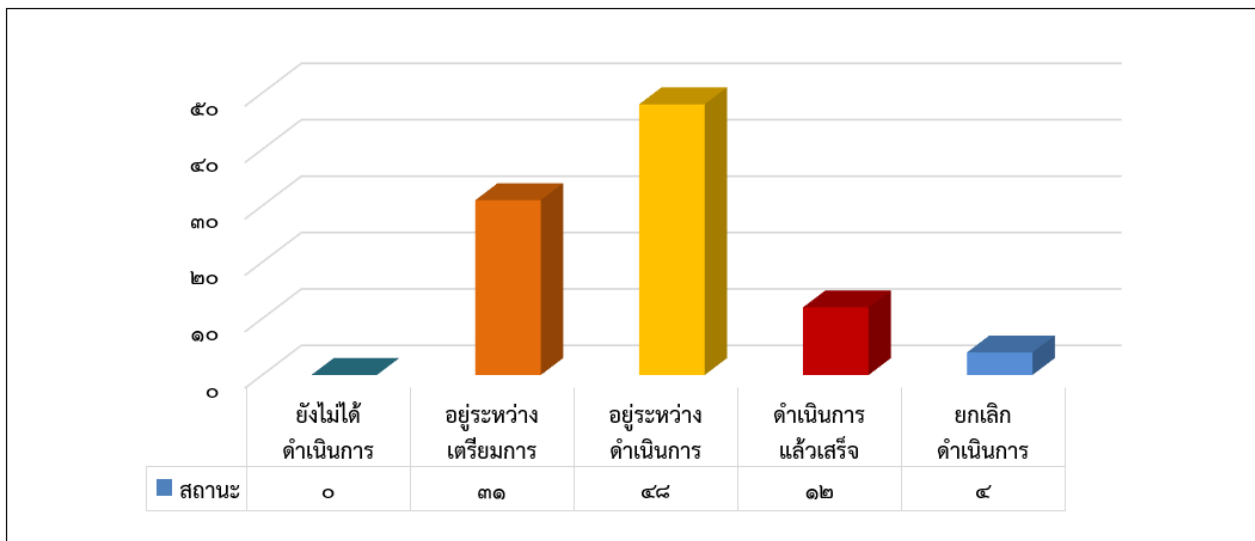

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน เดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๕

(๑) แผนงาน จำนวน ๕ แผนงาน ในภาพรวมสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด โดยสามารถเบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๗๕.๑๔

(๒) โครงการ จำนวน ๗๙ โครงการ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด จำนวน ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑๙ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๓๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๕๑ อยู่ระหว่างเตรียมการ/กระบวนการทางพัสดุฯ จำนวน ๓๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๒๔ และยกเลิกโครงการ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๖

(๓) งาน/กิจกรรม จำนวน ๑๑ รายการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๑๑ งาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

๒. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ จำแนกตามยุทธศาสตร์

ณ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๕ สำนักงาน กสทช. มีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ จำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

๒.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาการให้มีธรรมาภิบาล และสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน

มีการกิจกรรมรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๒๘ แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนกเป็น ๒ แผนงาน ๒๕ โครงการ ๑ งาน/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๖๐๐.๐๙๐ ล้านบาท เพื่อการขับเคลื่อนให้สำนักงาน กสทช. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล และสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน มีความยืดหยุ่น ในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทั้งที่เป็น การเกิดขึ้นใหม่ การหลอมรวม และนวัตกรรม การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการให้เป็นมาตรฐานสากล พัฒนาระบบการทำงานให้เป็นสำนักงานดิจิทัล ตลอดจนมีการบริหารจัดการบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศ โดยได้มีการดำเนินงานที่สำคัญๆ อาทิ

- ดำเนินการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. เพื่อสนับสนุนนโยบายสำคัญในปี ๒๕๖๕ ในการรักษามาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของสำนักงาน กสทช. ระดับ AA และพัฒนาให้ยั่งยืนต่อไป โดยในปี ๒๕๖๕ ได้ดำเนินงานตามแผน โดยจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้บุคลากรถือปฏิบัติ และจัดให้มีการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีแก่ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงาน โดยสำนักงาน กสทช. ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ และได้รับผลการประเมินระดับ AA ด้วยคะแนน ๙๙.๕๘ ถือเป็นอันดับที่ ๑ ของประเภทหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ที่เข้ารับการประเมิน และเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำนักงาน กสทช. ได้รับรางวัล ITA Awards 2022 และรางวัลประกาศเกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีความโดดเด่นในแต่ละประเภทรางวัล และเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำนักงาน กสทช. ได้รับโล่รางวัลหน่วยงานดีเด่นที่มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ตามมาตรฐานสากลดีเด่นสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) และเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ สำนักงาน กสทช. ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม จัดโดยสำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) นับเป็นปีแรกที่สำนักงาน กสทช. ได้ส่งผลงานประกวด และได้รับรางวัลเลิศรัฐ จากหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมเสนอรับรางวัลทั้งสิ้น ๑,๖๓๑ รางวัล

ตลอดจนได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางด้านธรรมาภิบาล อาทิ กิจกรรม The Best of NBTC เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่โดยยึดคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลัก การจัดทำร่างประกาศ กสทช. เรื่อง ประมวลจริยธรรมของสำนักงาน กสทช. เพื่อให้ธรรมาภิบาลเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร และบุคลากรได้รับการยอมรับในด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนางานให้เป็นที่ประจักษ์ในวงกว้าง โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการส่งเสริมการยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางด้านธรรมาภิบาลให้แล้วเสร็จตามแผนต่อไป

- ดำเนินการยกระดับสำนักงาน กสทช. สู่การเป็นสำนักงานดิจิทัล "NBTC Digitalization" ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ๑) ได้ดำเนินโครงการจัดทำระบบสารสนเทศสำหรับการบริการประชาชน และผู้รับบริการทุกภาคส่วน (NBTC Service Portal) แล้วเสร็จ ส่งผลให้สำนักงาน กสทช. มีระบบบริการข้อมูลข่าวสาร การอนุมัติ/อนุญาต การรับเรื่องร้องเรียน สำหรับบริการประชาชนและผู้รับบริการทุกภาคส่วนที่ครอบคลุมทุกภารกิจหลักของสำนักงาน กสทช. และให้บริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service) พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ใช้งานฯ และผู้ดูแลระบบของสำนักงาน กสทช. และอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการทดสอบการใช้ระบบงานจริง เรียบร้อยแล้ว ๒) ได้ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช. และการติดตั้งระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช. และโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Application) รวมถึงระบบรับ - ส่งเอกสาร ติดตามงานเอกสารสำนักงาน กสทช. กับหน่วยงานภายนอก/ผู้ประกอบการ แล้วเสร็จ ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถเพิ่มขีดความสามารถของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช. ปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดรับรูปแบบการทำงานในยุคดิจิทัล และ ๓) การดำเนินโครงการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลจุดเดียว (Single Point Data Searching System) แล้วเสร็จ ส่งผลให้สำนักงานฯ สามารถลดขั้นตอนในการสืบค้นข้อมูลและสามารถจัดเรียงการนำเสนอข้อมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงนำระบบ Artificial Intelligence (AI) และ Robotic Process Automatic (RPA) มาร่วมใช้ในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งมีความสัมพันธ์กัน ให้สามารถสืบค้นและนำมาใช้ร่วมกันได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ และปัจจุบันสำนักงานฯ อยู่ระหว่างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับผู้ใช้งานภายในฯ (NBTC Employee Portal) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการทำงานของสำนักงาน กสทช. แบบรวมศูนย์ต่อไป

- ดำเนินการพัฒนากระบวนการทำงานของสำนักงาน กสทช. ให้ลดเวลาและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นในการดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร กำหนดโครงสร้างข้อมูลพื้นฐานด้านระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานและมีรูปแบบเดียวกันในการเรียกใช้ข้อมูลรวมถึงการปรับแก้และโอนข้อมูล และจัดเตรียมระบบให้มีความพร้อมในการเข้าตรวจสอบและสอบทานข้อมูล อาทิ การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบบริหารการเงินการบัญชี ระบบการจัดการรายได้ และระบบการบริหารสินทรัพย์และการพัสดุ เป็นต้น ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

- ดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาและพัฒนาระบบ/กระบวนการเพื่อรองรับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (Personal Data Protection Act: PDPA Compliance) แล้วเสร็จ ส่งผลให้ปัจจุบันสำนักงานฯ มีระบบบริหารจัดการการแจ้งและการขอความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรองรับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ โดยได้มีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงความพร้อมการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว และจัดอบรมหลักสูตร Personal Data Protection Act : PDPA Compliance ให้แก่บุคลากรสำนักงาน กสทช. จำนวน

๓ หลักสูตร เรียบร้อยแล้ว โดยสำนักงาน กสทช. จะจัดให้มี Clinic for PDPA Consultation ขึ้นเพื่อเป็นเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้และตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องต่อไป

- ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญตามภารกิจ อันนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กร สามารถรองรับภารกิจต่างๆ และสามารถต่อยอดให้ การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้มีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียมสื่อสาร ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยปัจจุบันได้ ดำเนินการฝึกนักเรียนทุนเพื่อศึกษาต่อไว้ในความดูแลของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ฝึกนักเรียนทุนไว้ในความดูแลเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้ดำเนินการสนับสนุนบุคลากรของ สำนักงาน กสทช. ในการจัดทำผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่สนับสนุนภารกิจของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ในด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

ณ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๕ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๑๔ แผนงาน/โครงการ/งาน และอยู่ระหว่างเตรียมการก่อนเข้าสู่กระบวนการ ทางพัสดุ จำนวน ๙ โครงการ โดยสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ จำนวน ๗๘๘.๕๙๔ ล้านบาท และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๙๕๕.๑๓๔ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๒,๗๔๓.๗๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๒๑ คงเหลือจำนวน ๘๕๖.๓๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗๙

๒.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ผลักดันการขับเคลื่อนแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทิศทางที่สอดคล้อง กับการพัฒนาประเทศ

มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๔๐ แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนกเป็น ๓ แผนงาน ๓๕ โครงการ ๒ งาน/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๑๒๑.๔๐๔ ล้านบาท เพื่อสนับสนุนและเป็นกลไกให้ กสทช. ในการบริหารจัดการทรัพยากรสื่อสารของชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรม สนับสนุน เนื้อหารายการในเชิงสร้างสรรค์สังคม เพื่อเอื้อต่อการพัฒนาประเทศผ่านการขับเคลื่อนแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และมุ่งเน้นให้สำนักงาน กสทช. เป็นองค์กรด้านการบริหารคลื่นความถี่ และกำกับดูแลกิจการฯ ที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยได้ดำเนินงานสำคัญๆ อาทิ

- ดำเนินการสนับสนุนการบริหารคลื่นความถี่ โดยได้จัดทำประกาศ กสทช. ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนภารกิจในการบริหารคลื่นความถี่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจำที่ย่านความถี่ 57 - 66 GHz และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุ คอมมunicationในกิจการประจำที่ ย่านความถี่วิทยุ 57 - 66 GHz ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ สิงหาคม - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ และได้จัดทำและจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้ คลื่นความถี่ 5.925 - 6.425 GHz ในลักษณะอนุญาตให้ใช้เป็นการทั่วไปและมาตรฐานทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓ ฉบับ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ สิงหาคม - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

- ดำเนินการสนับสนุนภารกิจบริหารกิจการดาวเทียม ในการสนับสนุนภารกิจ ด้านกิจการดาวเทียมสื่อสาร โดย ณ ไตรมาส ๓ สำนักงาน กสทช. ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเชิง ปฏิบัติการฯ อาทิ การจัดประชุมคณะกรรมการด้านกิจการดาวเทียม ปี ๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๔ ครั้ง dkioyf อบรมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจการดาวเทียม ซึ่งจัดขึ้นในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เป็นต้น รวมทั้ง ได้จัดรับฟังความคิดเห็นเป็นการทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิใน การเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ระหว่างวันที่ ๑๑ สิงหาคม - ๑๒

กันยายน ๒๕๖๕ รวมทั้งได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ที่ประชุม กสทช. ในคราวการประชุมครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบหลักการแนวทางการแก้ไขปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศ ตามที่สำนักงานฯ เสนอ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศ

- ดำเนินโครงการศึกษาทิศทาง รูปแบบการให้บริการดาวเทียมในอนาคตและแนวทางในการกำกับดูแลการให้บริการดาวเทียมในประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์สภาพอุตสาหกรรมของดาวเทียมเทคโนโลยี ทิศทาง แนวโน้ม รูปแบบการให้บริการดาวเทียมสื่อสารในอนาคต แนวนโยบายและกรอบการกำกับดูแลการให้บริการดาวเทียมที่เหมาะสมในอนาคต ฯลฯ แล้วเสร็จ ส่งผลให้สำนักงาน กสทช. มีรายงานการวิเคราะห์สภาพอุตสาหกรรมดาวเทียมในปัจจุบันและอนาคต สรุปผลการศึกษาเทคโนโลยี ทิศทาง แนวโน้ม รูปแบบการให้บริการดาวเทียมในอนาคต แนวนโยบาย การอนุญาตและกรอบการกำกับดูแลการให้บริการดาวเทียม (รวมกรณีศึกษาของต่างประเทศ ๖ ประเทศ และสรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับประเทศไทย) และรายงานการประเมินผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของการให้บริการดาวเทียมในประเทศไทย เพื่อใช้สนับสนุนข้อมูลแก่คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ในการพิจารณาความคุ้มค่าในการลงทุนของรัฐบาล และการประเมินผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ด้านการให้บริการดาวเทียมในอนาคตและการกำกับดูแลการให้บริการดาวเทียมในประเทศไทย

- ดำเนินโครงการระบบตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายจากการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ระดับภูมิภาค แล้วเสร็จ ส่งผลให้ปัจจุบันสำนักงานฯ มีระบบตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายจากการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ระดับภูมิภาค โดยสำนักงานฯ จะมีการรายงานผลการดำเนินการประจำเดือน อาทิ รายงานการปรับปรุงฐานข้อมูลโฆษณา รายงานการเผยแพร่เนื้อหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายฯ และรายงานการออกอากาศเกินเวลาตามกฎหมายกำหนด เป็นต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลรายงานการตรวจสอบเนื้อหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายฯ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับสื่อโฆษณาที่มีข้อมูลอันเป็นเท็จ โฆษณาเกินจริง โดยสำนักงาน กสทช. จะประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเร่งตรวจสอบและดำเนินการกับผู้กระทำความผิดร่วมกันภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ที่กำหนดต่อไป

- ดำเนินโครงการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ในประเทศไทย แล้วเสร็จ โดยมีรายงานผลการศึกษาการสำรวจข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของบริการดิจิทัลแพลตฟอร์มในประเทศไทย ซึ่งนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ประเทศไทย เชื่อมโยงร่วมกับข้อมูลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ผ่านระบบรายงานสารสนเทศเชิงวิเคราะห์ Microsoft Power BI ของสำนักงาน กสทช. เพื่อให้บุคลากรสำนักงาน กสทช. ที่เกี่ยวข้องค้นหาข้อมูลฯ โดยสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะนำไปใช้เชื่อมโยงฐานข้อมูลของบริการดิจิทัลแพลตฟอร์มร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากรต่อไปในอนาคต

ณ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๕ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๑๙ แผนงาน/โครงการ/งาน อยู่ระหว่างเตรียมการก่อนเข้าสู่กระบวนการทางพัสดุฯ จำนวน ๑๔ โครงการ และยกเลิกดำเนินการ จำนวน ๒ แผนงาน/โครงการ/งาน โดยสามารถก่อกำหนดผู้ถือหุ้นได้ จำนวน ๔๔๕.๖๑๗ ล้านบาท และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๓๔.๕๗๒ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๗๘๐.๑๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๕๗ คงเหลือจำนวน ๓๔๑.๖๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๔๓

๒.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน

มีการกิจกรรมรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๒๑ โครงการ/งาน จำแนกเป็น ๑๗ โครงการ ๔ งาน/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณ ๘๕๓.๗๕๐ ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศให้เกิดความยั่งยืน ด้วยการยกระดับขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อลดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำ ในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากดิจิทัล การสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ให้กับประชาชน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ ในการกำกับดูแลเพื่อปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชน โดยได้ดำเนินงานสำคัญๆ อาทิ

- ดำเนินการสร้างการรับรู้และความเข้าใจของสาธารณะในภารกิจด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ อันได้แก่ การประชาสัมพันธ์ สื่อสาร ภารกิจในการกำกับดูแลกิจการสื่อสาร การสร้างความเข้าใจอันดีและถูกต้องทั้งภายในและภายนอกสำนักงานฯ ตลอดจนการประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ เป็นต้น

- ดำเนินการสนับสนุนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยสำนักงาน กสทช. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศ และส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม การเข้าร่วมการประชุมเต็มคณะ (Plenary meeting) ระหว่างการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอำนาจเต็ม ปี ค.ศ. ๒๐๒๒ ในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เพื่อร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสภาบริหารสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ณ กรุงบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย โดยผลการเลือกตั้งดังกล่าว ประเทศไทยได้รับการเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภาบริหารของ ITU สำหรับวาระปี ค.ศ. ๒๐๒๓ - ๒๐๒๖ ลำดับที่ ๔ ในภูมิภาคเอเชียและออสเตรเลียตะวันออกเฉียง ๑๕๒ คะแนน และถือเป็นลำดับที่ ๑๖ จากประเทศสมาชิกทั้งหมดจำนวน ๑๙๓ ประเทศทั่วโลก

- ดำเนินโครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการ USO เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ในการพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (ค่าธรรมเนียม USO) ในรูปแบบ Web application ที่สามารถทำงานสอดคล้องตามประกาศจัดเก็บรายได้ เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมในปัจจุบัน รวมถึงสามารถบูรณาการฐานข้อมูลที่สามารถใช้งานร่วมกับระบบสารสนเทศอื่นๆ ของสำนักงาน กสทช. ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

ณ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๕ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๑๐ โครงการ/งาน อยู่ระหว่างเตรียมการก่อนเข้าสู่กระบวนการทางพัสดุฯ จำนวน ๘ โครงการ/งาน และยกเลิกดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ โดยสามารถก่องหนผู้กักพันได้ จำนวน ๑๒๐.๖๕๔ ล้านบาท และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๐๔.๔๓๕ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๔๒๕.๐๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๗๙ คงเหลือจำนวน ๔๒๘.๖๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๒๑

๒.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยกระดับการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์

มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๖ โครงการ/งาน จำแนกเป็น ๒ โครงการ ๔ งาน/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณ ๑๘๐.๕๓๗ ล้านบาท เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้ร่วมกันถึงปัจจัยความสำเร็จในการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อให้ทุกองค์การฯ ได้บูรณาการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่เป้าหมายการพัฒนาการอย่างเป็นระบบอันจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศ การพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการสร้างวัฒนธรรมการทำงานเชิงยุทธศาสตร์ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ให้เกิดความเชี่ยวชาญ โดยได้มีการดำเนินการสำคัญๆ อาทิ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ การดำเนินการเพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนภารกิจพัฒนากระบวนการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ของสำนักงาน กสทช. การจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ประจำปี เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สำนักงานฯ และการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนฯ รวมทั้ง การจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีเสนอ กสทช. เป็นต้น

ณ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๕ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๕ โครงการ/งาน และยกเลิกดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ โดยสามารถกักหนี้ยุทธศาสตร์ได้ จำนวน ๔๘.๘๘๘ ล้านบาท และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๔.๙๗๔ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๙๓.๘๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๙๙ คงเหลือจำนวน ๘๖.๖๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐๑

๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการดำเนินงาน

๓.๑ ในไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๕ สถานการณ์การแพร่กระจายของโรคระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) คลี่คลายและศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) ได้ประกาศยกเลิกมาตรการต่างๆ จึงไม่มีข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน ดังนั้น ควรเร่งรัดการดำเนินการต่างๆ ให้เร็วยิ่งขึ้นเพื่อไม่ให้กระทบแผนการดำเนินงานในภาพรวม

๓.๒ ควรศึกษาแนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. เป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และควรศึกษาข้อมูลก่อนเริ่มดำเนินการจัดทำโครงการ รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดจ้างตามกระบวนการพัสดุ และแนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ เพื่อลดจำนวนการล่าช้าของการดำเนินงาน และการยกเลิกโครงการที่อาจเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากความซ้ำซ้อนของรายละเอียดตามขอบเขตงาน (TOR) โครงการ โดยในกรณีการยกเลิกการดำเนินโครงการ หรือเกิดความขัดข้องระหว่างดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้องใหม่โดยเร็วให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

๓.๓ หน่วยงานผู้รับผิดชอบการดำเนินโครงการควรให้ความสำคัญกับการกำกับ ติดตาม และบริหารโครงการให้เป็นไปตามแผน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการที่ต้องดำเนินการตามสัญญาต่อเนื่องตามระยะการดำเนินงานของโครงการ กรณีพบความเสี่ยงอันเกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรือเกิดความเป็นไปได้ที่อาจส่งผลให้การดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด ควรมีการวิเคราะห์และประเมินโครงการเป็นระยะ ได้แก่

- ๑) มีการกำหนดแนวทางในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ก่อนดำเนินโครงการ
- ๒) ติดตามความก้าวหน้าระหว่างดำเนินโครงการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด
- ๓) สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และประโยชน์ที่ได้จากการภายหลังการดำเนินโครงการดังกล่าว

๓.๔ สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) แล้วเสร็จ โดยได้อนุมัติให้ใช้แผนดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรทบทวนผลการดำเนินงานในที่ผ่านมา และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยกำหนดแผนงาน/โครงการและแผนงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ รองรับแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) ต่อไป และควรดำเนินการต่างๆ เช่น

- ๑) กำหนดวิธีการ แนวทางการดำเนินการและเป้าหมายของการติดตามและประเมินผลตามแต่ละยุทธศาสตร์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์และแม่บทฯ ของสำนักงาน กสทช. ด้วยการกำหนดหน้าที่ให้ชัดเจน และมีการจัดเก็บข้อมูลในการประเมินผล และสื่อสารให้ทุกคนได้รับทราบอย่างทั่วถึง

- ๒) กำหนดตัววัดที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดในการสร้างขีดสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ รวมถึงระยะเวลาในการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

- ๓) สร้างการยอมรับและการมีส่วนร่วมในกลไก/แนวทางในการติดตามประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการที่สอดคล้องของแต่ละยุทธศาสตร์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช.

- ๔) กำหนดแผนหรือแนวทางการติดตามการดำเนินงานและประเมินผลอย่างต่อเนื่องด้วยกลยุทธการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยเน้นการบูรณาการการขับเคลื่อนแผนงานดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

- ๕) พัฒนาองค์ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ รวมถึงทัศนคติของบุคลากรต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเพิ่มคุณค่างาน และเพิ่มความรับผิดชอบในการทำงาน ด้วยการมอบหมายความรับผิดชอบและสร้างความเป็นมืออาชีพ ในการขับเคลื่อนแผนงานสู่เป้าหมายของการบรรลุยุทธศาสตร์ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร

สำนักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ
ส่วนวิชาการและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์

ภาคผนวก
ความก้าวหน้าของการดำเนินงานฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล และสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน จำแนกเป็น ๒ แผนงาน ๒๕ โครงการ ๑ งาน/กิจกรรม โดยสามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมาย จำนวน ๕ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๑๔ แผนงาน/โครงการ/งาน อยู่ระหว่างเตรียมการก่อนเข้าสู่กระบวนการทางพัสดุฯ จำนวน ๙ โครงการ

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	ร้อยละ ความก้าวหน้า ในการดำเนินการฯ	หมายเหตุ
๑	แผนงานการบริหารองค์กร	๘๙.๔๒	
๒	แผนงานการบริหารยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร	๗๕.๗๙	
๓	งานพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน	๙๐.๐๐	
๔	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่	๑๐๐.๐๐	
๕	โครงการสายใยสายลม (เกษียณก่อนกำหนด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๘๕.๒๓	
๖	โครงการออกแบบโครงสร้างทางเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าศูนย์ราชการนนทบุรีของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเข้าสู่สำนักงาน กสทช. แห่งใหม่	๐.๐๐	
๗	โครงการออกแบบรายละเอียดพื้นที่บริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค ๑ ถนนแจ้งวัฒนะ	๐.๐๐	
๘	โครงการระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและระบบประกอบอาคาร อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่	๐.๐๐	
๙	โครงการพัฒนาระบบเบิกจ่ายเงินตรงรือง ติดตามการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล สำหรับสำนักงาน กสทช.	๙๘.๐๐	
๑๐	โครงการระบบสารสนเทศสำหรับการบริการประชาชน และผู้รับบริการทุกภาคส่วน (NBTC Service Portal) ของสำนักงาน กสทช.	๑๐๐.๐๐	
๑๑	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช.	๑๐๐.๐๐	
๑๒	โครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับผู้ใช้งานภายในสำนักงาน กสทช. (NBTC Employee Portal)	๑๐.๐๐	
๑๓	โครงการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลจุดเดียว (Single Point Data Searching System)	๑๐๐.๐๐	
๑๔	โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศสำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๕	๕๐.๐๐	
๑๕	โครงการศึกษาวิจัยนอกเวลาปฏิบัติงานสำหรับพนักงานประจำปี ๒๕๖๕	๔๐.๐๐	
๑๖	โครงการป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ สำนักงาน กสทช. ในระดับเครือข่าย	๖๕.๐๐	
๑๗	โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบบริหารการเงินการบัญชี ระบบการจัดการรายได้ และระบบการบริหารสินทรัพย์และการพัสดุ	๙๐.๐๐	
๑๘	โครงการจ้างที่ปรึกษาและพัฒนาระบบ/กระบวนการเพื่อรองรับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (Personal Data Protection Act: PDPA Compliance)	๑๐๐.๐๐	
๑๙	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า สำนักงาน กสทช. จำนวน ๗ รายการ	๑๐.๐๐	
๒๐	โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กสทช. จำนวน ๑ ระบบ	๑๐.๐๐	
๒๑	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเข้าใช้งานแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On)	๑๐.๐๐	
๒๒	โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการแพลตฟอร์มหลากหลายแบบรวมศูนย์ พร้อมปรับปรุงห้องปฏิบัติการ	๐.๐๐	
๒๓	โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ พร้อมอาคารประกอบ	๐.๐๐	
๒๔	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งสำหรับอาคารหอประชุมสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ จำนวน ๓ รายการ	๐.๐๐	

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	ร้อยละ ความก้าวหน้า ในการดำเนินการฯ	หมายเหตุ
๒๕	โครงการบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒	๐.๐๐	
๒๖	โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. ภาค ๓	๓๕.๐๐	
๒๗	โครงการก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงาน กสทช. เขต ๓๔	๐.๐๐	
๒๘	โครงการปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	๑๕.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ผลักดันการขับเคลื่อนแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทิศทางที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
 จำแนกเป็น ๓ แผนงาน ๓๕ โครงการ ๒ งาน/กิจกรรม โดยสามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมาย จำนวน ๕ แผนงาน/โครงการ/งาน
 อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๑๙ แผนงาน/โครงการ/งาน อยู่ระหว่างเตรียมการก่อนเข้าสู่กระบวนการทางพัสดุฯ
 จำนวน ๑๔ แผนงาน/โครงการ/งาน และยกเลิกดำเนินการ จำนวน ๒ แผนงาน/โครงการ/งาน

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	ร้อยละ ความก้าวหน้า ในการดำเนินการฯ	หมายเหตุ
๑	แผนงานการบริหารกิจการภูมิภาค	๘๑.๕๘	
๒	แผนงานการบริหารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	๘๒.๗๘	
๓	แผนงานการบริหารกิจการโทรคมนาคม	๕๘.๙๗	
๔	งานสนับสนุนภารกิจบริหารคลื่นความถี่	๖๐.๐๐	
๕	งานสนับสนุนภารกิจบริหารกิจการดาวเทียม	๗๐.๖๐	
๖	โครงการศึกษาทิศทาง รูปแบบการให้บริการดาวเทียมในอนาคตและแนวทาง ในการกำกับดูแลการให้บริการดาวเทียมในประเทศไทย	๑๐๐.๐๐	
๗	โครงการระบบตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายจากการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ระดับ ภูมิภาค	๑๐๐.๐๐	
๘	โครงการจัดการตรวจสอบและหาที่ศรัทธา จำนวน ๒๖ คัน	๕๐.๐๐	
๙	โครงการจัดหาเครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นความถี่วิทยุ ชนิด Real Time Bandwidth 100 MHz แบบสะพานมือ ย่านความถี่ 10 MHz - 42 GHz พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔ ชุด	๑๐๐.๐๐	
๑๐	โครงการจัดหาเครื่องสแกนความถี่และค้นหาตำแหน่งสถานีส่งสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔ ชุด	๑๐.๐๐	
๑๑	โครงการจัดซื้อชุดสายอากาศสำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นความถี่วิทยุแบบสะพาน มือ ย่านความถี่ 5 kHz - 26.5 GHz จำนวน ๒๕ ชุด	๑๐๐.๐๐	
๑๒	โครงการจัดเก็บและบูรณาการระบบตรวจสอบและควบคุมสถานีตรวจสอบความถี่ ระยะไกล	๑๐.๐๐	
๑๓	โครงการศึกษาผลกระทบการแพร่กระจายคลื่นต่อระบบอัตโนมัติสัญญาณของการขนส่ง ระบบรางเพื่อการกำกับดูแลของสำนักงาน กสทช.	-	ยกเลิก ดำเนินการ
๑๔	โครงการจัดหาและพัฒนารถอกไบอโนญาตเคลื่อนที่ของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค จำนวน ๑ คัน	๒๕.๐๐	

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	ร้อยละ ความก้าวหน้า ในการดำเนินการฯ	หมายเหตุ
๑๕	โครงการพัฒนาระบบต้นแบบสำหรับการบริหารจัดการความถี่วิทยุและการตรวจสอบคลื่นความถี่ของศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่แห่งชาติ	๐.๐๐	
๑๖	โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์และถอดเสียงการออกอากาศวิทยุกระจายเสียง	๐.๐๐	
๑๗	โครงการเครื่องมือตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุในการตรวจสอบข่ายสื่อสารการจัดงานพระราชพิธีของสำนักงาน กสทช. ภาค ๑ จำนวน ๕ สถานี	๐.๐๐	
๑๘	โครงการจัดทำต้นแบบศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่ของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค	๐.๐๐	
๑๙	โครงการสถานีเฝ้าระวังการแพร่กระจายคลื่นเพื่อการกำกับดูแลของสำนักงาน กสทช. ภาค ๔	๐.๐๐	
๒๐	โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบและกำกับดูแลการออกอากาศด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	๗๐.๐๐	
๒๑	โครงการปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอดสดและรายงานข่าวการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมที่สำคัญของประเทศไทย	๐.๐๐	
๒๒	โครงการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ในประเทศไทย	๑๐๐.๐๐	
๒๓	โครงการต้นแบบพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	๘๐.๐๐	
๒๔	โครงการพัฒนาระบบการอนุญาตวิทยุคมนาคมในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RBS)	๘๐.๐๐	
๒๕	โครงการพัฒนาระบบรองรับการเปลี่ยนผ่านการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	๗๕.๐๐	
๒๖	โครงการศึกษาแนวทางในการพัฒนาหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ไทยให้สอดคล้องกับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป	๓๐.๐๐	
๒๗	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการวัดการแพร่แปลกลอดด้วยวิธี Real-time Monitoring	๒๐.๐๐	
๒๘	โครงการพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development)	๙๘.๐๐	
๒๙	โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มในสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค และเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการในส่วนกลาง	-	ยกเลิกดำเนินการ
๓๐	โครงการพัฒนาระบบช่วยปฏิบัติงานด้านสิทธิแห่งชาติเพื่อลงฐานข้อมูลแผนที่โครงข่ายสื่อสาร : การพาดสายสื่อสาร	๗๐.๐๐	
๓๑	โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยออนไลน์แอปพลิเคชัน (ปีที่ ๓)	๐.๐๐	
๓๒	โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	๐.๐๐	
๓๓	โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการแก้ไขสายสื่อสารเพื่อความปลอดภัยของประชาชน (P-safe)	๐.๐๐	
๓๔	โครงการพัฒนาระบบการตรวจค้นและจับกุมตามกฎหมาย	๐.๐๐	
๓๕	โครงการจัดทำสื่อออนไลน์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงาน กสทช. กับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕	๕๘.๓๓	

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	ร้อยละ ความก้าวหน้า ในการดำเนินการฯ	หมายเหตุ
๓๖	โครงการการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ Any Registration	๐.๐๐	
๓๗	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม	๔๐.๐๐	
๓๘	โครงการจ้างพัฒนาฐานข้อมูลกิจการโทรคมนาคมและระบบรายงานเชิงวิเคราะห์เพื่อการบริหารงานข้อมูลกิจการโทรคมนาคม	๐.๐๐	
๓๙	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจและประเมินระดับความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงในประเทศไทยของผู้ประกอบกิจการ	๐.๐๐	
๔๐	โครงการสำรวจอุปสงค์ของการให้บริการกระจายเสียงประเมินต้นทุนและจัดทำโมเดลการลงทุนโครงข่ายและการให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัลของประเทศไทย	๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน จำแนกเป็น ๑๗ โครงการ ๔ งาน/กิจกรรม โดยสามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมาย จำนวน ๒ โครงการ/งาน อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๑๐ โครงการ/งาน อยู่ระหว่างเตรียมการก่อนเข้าสู่กระบวนการทางพัสดุฯ จำนวน ๘ โครงการ/งาน และยกเลิกดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	ร้อยละ ความก้าวหน้า ในการดำเนินการฯ	หมายเหตุ
๑	งานการสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศให้เกิดความยั่งยืน	๖๓.๖๙	
๒	งานการสร้างการรับรู้และความเข้าใจของสาธารณะในการกิจด้านกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ	๖๕.๗๑	
๓	งานสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา ในการยกระดับความสามารถของประชาชนในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากบริการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และการวิจัยและพัฒนา	๙๑.๖๗	
๔	งานการสนับสนุนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม	๘๐.๐๐	
๕	โครงการการสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภาบริหารของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)	๙๐.๐๐	
๖	โครงการพัฒนาระบบจัดการโครงการกองทุนวิจัยและพัฒนา สำนักงาน กสทช. (ระยะที่ ๒)	๐.๐๐	
๗	โครงการจ้างตรวจสอบวิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑๐๐.๐๐	
๘	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์	๑๐.๐๐	
๙	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการข้อมูลกลางเพื่อช่วยวิเคราะห์ และแสดงผลในลักษณะ Data Visualization	๐.๐๐	
๑๐	โครงการระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์แบบสื่อสารหลากหลายช่องทาง Omni-Channel Contact Center	๐.๐๐	
๑๑	โครงการเตรียมความพร้อมไปสู่องค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization)	๐.๐๐	

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	ร้อยละ ความก้าวหน้า ในการดำเนินการฯ	หมายเหตุ
๑๒	โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบเนื้อหารายการและสิ่งผิดกฎหมายจากการออกอากาศทางโทรทัศน์ จำนวน ๑ ระบบ	-	ยกเลิก ดำเนินการ
๑๓	โครงการความร่วมมือการผลิตข่าวในพระราชสำนัก และการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีและรัฐพิธีสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	๕๕.๐๐	
๑๔	โครงการความร่วมมือการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดสด เพื่อดำเนินการถ่ายทอดสดและรายงานข่าวการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ๒๐๒๒	๙๐.๐๐	
๑๕	โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและจัดเก็บข้อมูลตามพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินสำหรับการส่งเสริมบริการอย่างทั่วถึง	๗๐.๐๐	
๑๖	โครงการศึกษาและพัฒนาบุคลากรสื่อด้าน “สื่อสังคมยุคใหม่กับการเคลื่อนไหวทางสังคมของประเทศไทย”	๘๐.๐๐	
๑๗	โครงการระบบตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายจากการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ระดับภูมิภาค ระยะที่ ๒	๐.๐๐	
๑๘	โครงการสร้างความตระหนักรู้ภัยคุกคามทางไซเบอร์	๑๐๐.๐๐	
๑๙	โครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการ USO	๐.๐๐	
๒๐	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม	๐.๐๐	
๒๑	โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (“แทนบัตร”) ระยะที่ ๓	๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ จำแนกเป็น ๒ โครงการ ๔ งาน/กิจกรรม โดยอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๕ โครงการ/งาน และยกเลิกดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	ร้อยละ ความก้าวหน้า ในการดำเนินการฯ	หมายเหตุ
๑	งานสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ กสทช.	๕๐.๐๐	
๒	งานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนโยบายและการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์	๕๗.๐๐	
๓	งานสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน	๗๕.๐๐	
๔	งานสนับสนุนภารกิจพัฒนากระบวนการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ของ สำนักงาน กสทช.	๔๑.๖๑	มีการปรับแผน การดำเนินการ และงบประมาณ
๕	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช.	-	ยกเลิก ดำเนินการ
๖	โครงการติดตามประเมินผลงานในมิติเชิงสังคมโดยใช้ซีบีเอ็มเดล (CIPP Model) สำหรับสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	๓๕.๐๐	

รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ (ล้านบาท)	งบประมาณที่มีการผูกพันต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)		วัตถุประสงค์ของ การดำเนินโครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ	การดำเนินงานมีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของงาน/กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกดำเนินการ			เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด				
๑	แผนงานการบริหารองค์กร	บก.	๓๖๕.๙๖๐	๓๖๕.๙๖๐	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อขับเคลื่อนแผนงานการบริหารองค์กร			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้	๘๙.๔๖	✓					
๑	แผนงานการบริหารยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร	ยก.	๒,๓๕๕.๖๗๑	๒,๓๕๕.๐๘๘	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อขับเคลื่อนแผนงานการบริหารยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้	๗๕.๗๙	✓					
๑	งานพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน <u>กิจกรรม</u> ๑) กิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาล ๒) กิจกรรมการประเมิน ITA	ตบ.	๑.๓๕๑	๑.๓๕๑	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	๑. เพื่อให้เกิดการพัฒนาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ๒. เพื่อรักษาระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ระดับ AA ในปี ๒๕๖๕ และพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภายในของสำนักงาน กสทช. ให้ยั่งยืนต่อไป ๓. เพื่อให้ธรรมาภิบาลเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงาน กสทช. ได้ โดยบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ได้รับการยอมรับในด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมถึง การส่งเสริมการพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด ดังนี้ ๑. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางด้านธรรมาภิบาล ได้แก่ (๑) กิจกรรม The Best of NBTC โดย รสทช. (กท.) รก ลสทช. ได้อนุมัติหลักการกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และได้จัดประชุมเพื่อแจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดกิจกรรม "The Best of NBTC ประจำปี ๒๕๖๕" เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการเชิญผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างร่วม ลงคะแนนให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือก The Best of NBTC ประจำปี ๒๕๖๕ ของแต่ละสายงาน (๒) กิจกรรมการจัดทำประมวลจริยธรรมของสำนักงาน กสทช. โดยได้จัดทำร่างประกาศ กสทช. เรื่องประมวลจริยธรรมของสำนักงาน กสทช. ตามมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการกำกับ ติดตาม และประเมินผลตามมาตรฐานทางจริยธรรม และต่อมาได้จัดทำวาระเสนอที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณา ซึ่งได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม กสทช. ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ต่อไป ๒. ได้พัฒนาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรแล้วเสร็จ โดยได้รับผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินกิจกรรม ได้แก่ (๑) ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยสำนักงาน กสทช. ได้คะแนน ๙๙.๕๘ ระดับ AA ถือเป็นลำดับที่ ๑ ประเภทหน่วยงานของรัฐอื่นๆ (๒) ได้รับรางวัล ITA Awards 2022 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยสำนักงาน กสทช. ได้รางวัลหน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุด และได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ AA ทั้งนี้ ได้เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณ ITA Awards 2022 เป็นรางวัลที่นายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการ ป.ป.ช. มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีความโดดเด่นในแต่ละประเภทรางวัล ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. จะแจ้งกำหนดการพิธีมอบให้แก่เกียรติยศจากนายกรัฐมนตรีให้ทราบในโอกาสต่อไป	๙๐.๐๐	✓		๑. ร้อยละการดำเนินการตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ร้อยละผลการประเมิน ITA ประจำปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ๓. จำนวนพนักงานที่ได้รับรางวัล "the best of NBTC" ของแต่ละสายงาน จำนวน ๕ คน ๔. ร้อยละการรับรู้และเข้าใจรายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลเลิศรัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๕. ร้อยละการรับรู้และเข้าใจคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐			
๑	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ <u>กิจกรรม</u> ๑) งานก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ ๒) งานจ้างผู้ควบคุมงาน และดำเนินงานอื่นๆ ๓) งานออกแบบเพิ่มเติม	พย.	๒,๗๔๓.๐๐๐	๔๒๐.๘๕๑	ปี ๒๕๖๒ (๖๘๘.๘๕๐) ปี ๒๕๖๓ (๕๓๙.๑๓๓) ปี ๒๕๖๔ (๖๘๘.๐๒๔) ปี ๒๕๖๕ (๕๐๐.๘๕๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด ดังนี้ ๑. งานก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ ผลงานปัจจุบัน มีความคืบหน้าโครงการก่อสร้างและตกแต่งภายใน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๓๖ และดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว ๒๘ ครั้ง ครีคิดเป็นร้อยละ ๔๔.๓๘ ๒. งานจ้างผู้ควบคุมงาน และตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาโดยแบ่งการดำเนินงานเป็น ๒ ระยะ ได้แก่ ระยะที่ ๑ การดำเนินการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ๓๓ เดือน โดยได้ปรับเพิ่มระยะเวลาการควบคุมงาน เพิ่มจำนวนอีก ๔ เดือน และระยะที่ ๒ การดำเนินการตลอดระยะเวลา รับประกันความชำรุดบกพร่องของงานก่อสร้าง ๒ ปี โดยได้มีการแก้ไขสัญญา ครั้งที่ ๑ ให้เพิ่มระยะเวลาการควบคุมงานก่อสร้าง และขอให้แก้ไขรายละเอียดการจ่ายค่าจ้างควบคุมงาน โดยได้ดำเนินการเบิกจ่ายงวดที่ ๓๗ แล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๓. งานออกแบบเพิ่มเติม ได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานและดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๘๕.๒๓	✓		๑. อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๘ อาคาร ๒. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕		การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากอยู่ระหว่างรูปแบบ IT ใหม่ ซึ่งกระทบกับงานระบบอาคาร รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้จำนวนแรงงานไม่เพียงพอต่อการเร่งรัดงาน ผู้รับจ้างไม่สามารถนำแรงงานเข้ามาเพิ่มได้ ทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด	
๑	โครงการสายใยสายลม (เกษียณก่อนกำหนด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	พย.	๘๗.๕๐๐	๘๗.๕๐๐	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อปรับอัตราค่าจ้างรองรับการผลักดันให้สำนักงาน กสทช. เป็นสำนักงานดิจิทัล อย่างเต็มรูปแบบ			✓			ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้รับสมัครพนักงานที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ และต่อมาได้นำเสนอรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติให้ ลสทช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสายใยสายลม (เกษียณก่อนกำหนด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และอนุมัติให้พนักงานออกจากงานตามโครงการสายใยสายลม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้วจำนวน ๒๕ คน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยได้ดำเนินการสรุปผลการประเมินผลโครงการฯ เพื่อรายงานผู้บริหารระดับสูงแล้วเสร็จ โดยการดำเนินโครงการฯ นั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในการผลักดันให้สำนักงาน กสทช. เป็นสำนักงานดิจิทัลตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงาน กสทช. ซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน ในองค์กร (Digital Transformation) โดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของพนักงานในองค์กร (People) กระบวนการทำงาน (Process) และเทคโนโลยี (Technology) เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ลงในช่วงระยะเวลา ๑ - ๓ ปี และปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างองค์กรให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงจุดสมดุลและเหมาะสมยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อให้พนักงานเป็นผู้ตัดสินใจทางเลือกในอนาคตของตนเองได้ ทำให้พนักงานและองค์กรได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย (win-win situation)	๑๐๐.๐๐	✓		๑. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๙ อัตรา ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐			

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับพื้นที่ (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)		วัตถุประสงค์ของ การดำเนินโครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ	การ ดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ			เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่ กำหนด			
๑	โครงการออกแบบโครงสร้างทางเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าศูนย์ราชการนนทบุรีหรือการรถไฟฯที่เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยเข้าสู่สำนักงาน กสทช. แห่งใหม่	พย.	๓.๖๐๐	๓.๖๐๐	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อศึกษาและออกแบบสร้างทางเดินเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีเข้าสู่สำนักงาน กสทช. แห่งใหม่		✓				ได้รับอนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง แล้วเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ และ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามลำดับ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคาจัดจ้างฯ ต่อไป ตามบันทึกที่ สทช ๒๑๐๔/๖๕๕๔ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕	๐.๐๐	✓		๑. แบบก่อสร้าง จำนวน ๑ แบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	
๑	โครงการออกแบบรายละเอียดพื้นที่บริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค ๑ ถนนแจ้งวัฒนะ	พย.	๑๔.๖๖๕	๑๔.๖๖๕	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อออกแบบรายละเอียด (Detail Design) และจัดทำเอกสารรายการประกอบแบบสำหรับงานก่อสร้าง รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่ใช้ประกอบในการก่อสร้างพื้นที่บริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค ๑ ถนนแจ้งวัฒนะ		✓			อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง เนื่องจากมีการปรับปรุงงานการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)	๐.๐๐	✓		๑. รายงานผลการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-		
๑	โครงการระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและระบบประกอบอาคารอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่	พย.	๕๘๒.๗๐๕	๑๔๕.๖๗๖	ปี ๒๕๖๖ (๔๗๗.๐๒๙)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อจัดหาอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานและระบบประกอบอาคารของสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ ให้รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Smart building)		✓			อยู่ระหว่างการค้าควมปริมาณงานและราคากลาง	๐.๐๐		✓	๑. จำนวนระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและระบบประกอบอาคารอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากได้พิจารณาเนื้อหาของโครงการระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและระบบประกอบอาคาร อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ แล้วพบว่า โครงการฯ มีความเกี่ยวข้องทางด้านเทคนิคในการจัดหาระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและระบบประกอบอาคาร ซึ่งต้องพิจารณาปรับแบบงานระบบฯ ร่วมกับแบบก่อสร้างอาคารสำนักงาน กสทช. เดิม ที่มีรายละเอียดค่อนข้างมาก ทั้งนี้ ได้พิจารณาให้ในปัจจุบันประมาณ ๒๕๖๖ ปรับเปลี่ยนหน่วยงานรับผิดชอบจากสำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.) เป็นสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (น.บ.) ส่งผลให้ต้องปรับแผนการดำเนินงาน โดยจะเริ่มดำเนินการในปี ๒๕๖๖ ต่อไป	ได้รับการปรับแผน โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณปี ๒๕๖๖ ให้เป็นความรับผิดชอบของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (น.บ.)	
	๑) งานระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ		๔๗๗.๐๐๐																	
	๒) งานปรับปรุงระบบประกอบอาคาร		๕๖.๐๐๐																	
	๓) งานจ้างผู้ควบคุมงานและดำเนินการอื่น ๆ		๑๔.๗๐๕																	
๑	โครงการพัฒนาระบบเบิกจ่ายเงินตรงติดตามการจ่ายคืนค่ารักษาพยาบาลสำหรับ สำนักงาน กสทช.	ธย.	๑๐.๗๐๗	๗.๔๗๕	ปี ๒๕๖๔ (๓.๒๓๒)	ธ.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อพัฒนาระบบการยื่นเงินตรง ระบบการติดตามการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล โดยจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับระบบ ERP ของสำนักงาน กสทช.			✓			ได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๒ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประกอบด้วย การพัฒนาระบบเบิกเงินตรงติดตามการจ่ายคืนค่ารักษาพยาบาลของสำนักงาน กสทช. ได้แก่ ระบบเบิกจ่ายเงินตรงตรง ระบบการติดตามการเบิกจ่ายเงินรักษาพยาบาล ระบบการเชื่อมโยงข้อมูล ERP และการติดตั้งและการทดสอบระบบงานที่ได้ทำการปรับปรุง โดยดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ และได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๓ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ประกอบด้วย การฝึกอบรมและจัดฝึกอบรม จำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ การจัดฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ กสทช. อย่างน้อยจำนวน ๒๐ คน และการจัดฝึกอบรมสำหรับผู้ดูแลระบบ อย่างน้อยจำนวน ๕ คน โดยดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อใช้งานระบบฯ	๕๕.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบเบิกจ่ายเงินตรงติดตามการจ่ายคืนค่ารักษา จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	-	
๑	โครงการระบบสารสนเทศสำหรับการบริการประชาชน และผู้รับบริการทุกภาคส่วน (NBTC Service Portal) ของสำนักงาน กสทช.	ดย.	๑๕.๓๑๖	๑๐.๗๒๑	ปี ๒๕๖๔ (๔.๕๙๕)	ธ.ค.-๖๔	ธ.ค.-๖๕	เพื่อจัดทำระบบสารสนเทศสำหรับการบริการประชาชน และผู้รับบริการทุกภาคส่วน (NBTC Service Portal) ของสำนักงาน กสทช. โดยสามารถเชื่อมต่อกับระบบงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ ๒ โดยครอบคลุมภารกิจหลัก ๖ ด้าน และให้บริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service)			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) แล้วเสร็จ และมีผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินการประกอบด้วย ระบบพร้อมทดสอบและติดตั้งใช้งาน ณ สำนักงาน กสทช. การดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทดสอบ (UAT) การใช้ระบบงานจริงที่ติดตั้งพร้อมปรับแต่งระบบให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การฝึกอบรมหรือคู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ใช้งานระบบ และผู้ดูแลระบบของสำนักงาน กสทช. หลักฐานการอบรมผู้ใช้งาน ผู้พัฒนาระบบ และผู้ดูแลระบบของสำนักงาน กสทช. รวมทั้งได้รับผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการหลังจากการให้บริการระบบสารสนเทศสำหรับการบริการประชาชนและผู้รับบริการทุกภาคส่วน (NBTC Service Portal) ที่ร้อยละ ๙๔ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก	๑๐๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบฯ และ/หรือ Application จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๓. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า ๘๕	-		
๑	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช.	ดย.	๑๗.๑๖๑	๑๒.๐๓๓	ปี ๒๕๖๔ (๕.๑๒๘)	ธ.ค.-๖๔	ธ.ค.-๖๕	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช. ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้สามารถทำงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้มากขึ้น รองรับการพัฒนาสำนักงาน กสทช. ให้เป็นสำนักงานดิจิทัล			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๒ แล้วเสร็จ ประกอบด้วย การดำเนินการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการทดสอบ และการติดตั้งระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช. และโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Application) รวมถึงระบบรับ - ส่งเอกสาร ติดตามงานเอกสารสำนักงาน กสทช. กับหน่วยงานภายนอก/ผู้ประกอบการ และดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) แล้วเสร็จ โดยได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช. ที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรสำหรับผู้บริหารและผู้ใช้งาน (เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง) โดยจัดฝึกอบรมที่สำนักงาน กสทช. ส่วนกลาง ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องฝึกอบรมสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (น.บ.) และหลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช. ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องฝึกอบรมสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (น.บ.) รวมถึงหลักสูตรสำหรับผู้บริหารและผู้ใช้งาน (เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผ่านระบบ Video Conference ของสำนักงาน กสทช.) ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ พร้อมคู่มือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามขอบเขตของงาน รวมทั้งได้รับผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช. ที่ร้อยละ ๙๕.๐๙ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก	๑๐๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๓. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า ๘๕	-		

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)		วัตถุประสงค์ของ การดำเนินโครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/ กิจกรรม/โครงการ	การ ดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับแผนที่ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ			เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่ กำหนด			
๑	โครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับผู้ใช้งานภายในสำนักงาน กสทช. (NBTC Employee Portal)	คย.	๑๔.๗๖๕	๔.๔๓๐	ปี ๒๕๖๖ (๑๐.๓๓๖)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	๑. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับผู้ใช้งานภายในสำนักงาน กสทช. (NBTC Employee Portal) ๒. สำนักงาน กสทช. มีระบบ Employee Portal ที่พัฒนาโดยเทคโนโลยี Low-Code เพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางในการเชื่อมโยงการทำงานของระบบต่างๆ ในสำนักงาน กสทช. และพัฒนาระบบการทำงานจากรูปแบบเดิมให้เป็นไปแบบประยุกต์ในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transformation) โดยสามารถเข้าใช้งานระบบสารสนเทศสำนักงาน กสทช. ได้จากจุดเดียว ๓. เพื่อมีเครื่องมือที่ช่วยบุคลากรในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ได้ด้วยตนเอง (Citizen Developer) ซึ่งจะเป็นการวางรากฐานการพัฒนาแบบนิเวศดิจิทัล (Digital Ecosystem) เพื่อการพัฒนาสำนักงาน กสทช. ไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Organization) ที่ยั่งยืนในอนาคต			✓			ได้ลงนามสัญญาจ้าง เลขที่ ๔๖๕๐๓๐๕ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการประชุมเริ่มงานโครงการ (Kickoff Project) เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดแผนงาน	๑๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบสารสนเทศเพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับผู้ใช้งานภายในสำนักงาน กสทช. (NBTC Employee Portal) จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	
๑	โครงการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลจุดเดียว (Single Point Data Searching System)	คย.	๒๐.๐๐๐	๑๓.๐๐๐	ปี ๒๕๖๔ (๗.๐๐๐)	ธ.ค.-๖๔	ธ.ค.-๖๕	๑. เพื่อพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลจุดเดียว (Single Point Data Searching System) สำหรับสืบค้นข้อมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสัมพันธ์กันซึ่งแยกจัดเก็บบนระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของสำนักงาน กสทช. ๒. เพื่อนำระบบ Artificial Intelligence (AI) และ Robotic Process Automatic (RPA) มาใช้ในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งมีความสัมพันธ์กัน ให้สามารถสืบค้นและนำมาใช้ร่วมกันได้ ๓. เพื่อนำระบบ Automatic มาช่วยลดขั้นตอนในการจัดการนำเสนอข้อมูลและการสืบค้นข้อมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งแยกจัดเก็บไว้บนระบบฐานข้อมูลที่แตกต่างกัน เพื่อนำไปสู่การเป็นสำนักงานดิจิทัล			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) แล้วเสร็จ ประกอบด้วย หลักฐานยืนยันการทำให้ Data Cleansing สำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนข้อมูลทั้งหมดของระบบระบบสืบค้นข้อมูลจุดเดียว (Single Point Data Searching System) และ API สำหรับเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นระบบระหว่างระบบสืบค้นข้อมูลจุดเดียว (Single Point Data Searching System) และฐานข้อมูลของระบบงานภายในสำนักงาน กสทช. รวมทั้ง Meta Data สำหรับระบบสืบค้นข้อมูลจุดเดียว (Single Point Data Searching System) ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ใช้งานระบบ และ ผู้ดูแลระบบของสำนักงาน กสทช. หลักฐานการอบรมผู้ใช้งาน ผู้พัฒนาระบบ และผู้ดูแลระบบของสำนักงาน กสทช. Source code ของระบบสืบค้นข้อมูลจุดเดียว (Single Point Data Searching System) และให้ถือว่าสำนักงาน กสทช. เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ระบบดังกล่าวโดยถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งเอกสารรับรองว่าสำนักงาน กสทช. มีสิทธิ์ในการใช้งานซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เสนออย่างถูกต้องตามกฎหมาย	๑๐๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบสืบค้นข้อมูลจุดเดียว (Single Point Data Searching System) จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-		
๑	โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศสำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๕	วย.	๗.๕๐๐	๓.๐๐๐	ปี ๒๕๖๖ (๓.๐๐๐) ปี ๒๕๖๗ (๔.๕๐๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๗	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงาน กสทช. ให้มีความเป็นเลิศในด้านการทำงาน ดูแลให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล			✓		ได้ดำเนินการจัดทำสัญญารับทุนและฝากนักเรียนทุนไว้ในความดูแลของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) แล้วเสร็จ ขณะนี้นักเรียนทุนได้ออกเดินทางไปศึกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ พร้อมทั้งได้ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวก่อนการเดินทางไปศึกษา และค่าใช้จ่ายทางการศึกษาให้กับสำนักงาน ก.พ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ฝากนักเรียนทุนไว้ในความดูแลแล้ว	๕๐.๐๐	✓		๑. จำนวนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศสำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒ ทุน ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	ผู้มีสิทธิรับทุนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครทุนมีจำนวน ๑ ราย ซึ่งน้อยกว่าจำนวนทุนที่กำหนดไว้ในประกาศทั้งสิ้น ๒ ทุน จึงส่งผลการบริหารจัดการงบประมาณ		
๑	โครงการศึกษาวิจัยนอกเวลาปฏิบัติงานสำหรับพนักงานประจำปี ๒๕๖๕	วย.	๐.๕๕๐	๐.๕๕๐*	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรของสำนักงาน กสทช. จัดทำผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่สนับสนุนภารกิจของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ในด้านต่างๆ และส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการไปพัฒนาระบบงาน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง			✓		ได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๒ แล้วเสร็จ ประกอบด้วย การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ครั้งที่ ๑ การทบทวนวรรณกรรม และการสรุปประเด็นคำแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ ๓ ในการจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ครั้งที่ ๒ รวบรวมผลการวิจัย	๕๐.๐๐	✓		๑. จำนวนผลการศึกษาริยะนอกเวลาปฏิบัติงานสำหรับพนักงานประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้พิจารณาอนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายกลางปี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยปรับลดงบประมาณรายจ่ายโครงการฯ จำนวน ๘๑,๓๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังปรับแผนที่สิ้น ๔๖๘,๗๐๐ บาท ตามบันทึกที่ สทช ๒๐๐๑/ว.๓๒๐.๐๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕	
๑	โครงการป้องกันการโจมตีเว็บไซต์สำนักงาน กสทช. ในระดับเครือข่าย	นบ.	๑๗.๘๖๗	๖.๐๐๐	ปี ๒๕๖๓ (๒.๘๖๗) ปี ๒๕๖๔ (๔.๖๐๑) ปี ๒๕๖๖ (๔.๓๓๙)	ธ.ค.-๖๓	ธ.ค.-๖๖	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ สำนักงาน กสทช. ในระดับเครือข่ายจากผู้ไม่หวังดี			✓		ได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๒๓ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๓๓ กันยายน ๒๕๖๕ ตามขอบเขตของงานที่กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องส่งมอบรายงานการป้องกัน Website จากการโจมตีในระดับเครือข่าย รายงานเดือน ตามระยะเวลาในการดำเนินการทั้งสิ้น ๓๔ เดือน ประกอบด้วย รายงานการให้บริการป้องกัน Website จากการโจมตีในระดับเครือข่าย (รายงานเดือน) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับงานประจำงวดรายเดือนต่อไป	๖๕.๐๐	✓		๑. ร้อยละของการป้องกันระบบจากการโจมตีจากระดับเครือข่าย ร้อยละ ๙๕ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-		
๑	โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการบัญชี ระบบการจัดการรายได้ และระบบการบริหารสินทรัพย์และการพัสดุ	นบ.	๒๙.๗๔๖	๗.๓๕๕	ปี ๒๕๖๓ (๑๑.๙๔๖) ปี ๒๕๖๔ (๑๐.๔๔๐)	ธ.ค.-๖๓	ธ.ค.-๖๕	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบ ERP ปรับปรุงเขียนกระบวนการทำงานให้ลดเวลาและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นในการดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร กำหนดโครงสร้างข้อมูลพื้นฐานด้านระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานและมีรูปแบบเดียวกันในการเรียกใช้ข้อมูลรวมถึงการปรับแก้และโยกข้อมูลและจัดเตรียมระบบให้มีความพร้อมในการเข้าตรวจสอบและสอบทานข้อมูล การเข้าใช้งานข้อมูลตลาดต่างๆ ได้			✓		ได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๕ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ ประกอบด้วย รายงานผลการใช้งานระบบงานของสำนักงาน กสทช. (Go-Live Report) และรายงานการเตรียมความพร้อมของระบบงานในการเข้าตรวจสอบและสอบทานข้อมูล การเข้าใช้งาน ข้อมูลตลาดต่างๆ (System Audit) ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่าย	๙๐.๐๐	✓		๑. ร้อยละความถูกต้องของรายงานตามแบบฟอร์มภาคีตามที่กรมสรรพากรกำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากผู้รับจ้างได้ส่งหนังสือขอเลื่อนการส่งมอบงาน ตามหนังสือที่ สป.๐๑๐๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕		

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)		วัตถุประสงค์ของ การดำเนินโครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนิน งาน/กิจกรรม/โครงการ	การ ดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการ เมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ			เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่ กำหนด				
๑	โครงการจ้างที่ปรึกษาและพัฒนาระบบ/ กระบวนการเพื่อรองรับการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (Personal Data Protection Act: PDPA Compliance)	นบ.	๘.๐๖๕	๔.๐๓๓	ปี ๒๕๖๔ (๔.๐๓๓)	ธ.ค.-๖๔	ธ.ค.-๖๕	เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ประเมินช่องว่าง สำนักงาน กสทช. จะต้องปฏิบัติให้ สอดคล้องพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒				✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย พนักงานสำนักงาน กสทช. ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ฝึกอบรม Personal Data Protection Act: PDPA Compliance ๓ หลักสูตร และมีระบบบริหารจัดการแจ้งและการขอความยินยอม ข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงาน กสทช. จำนวน ๑ ระบบ	๑๐๐.๐๐	✓		๑. จำนวนหลักสูตรฝึกอบรม Personal Data Protection Act: PDPA Compliance จำนวน ๓ หลักสูตร ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่ กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	-		
๑	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า สำนักงาน กสทช. จำนวน ๗ รายการ	นบ.	๓๓.๘๒๔	๓๓.๘๒๔	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันฟ้า ผ่าเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เครือข่ายไร้สาย (WiFi) และเครื่องมือตรวจสอบจาก ปรากฏการณ์ฟ้าผ่า					✓		ได้ลงนามในสัญญาจ้าง เลขที่ ๘๖๕๐๒๓๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ และนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามสัญญา ในวงงานที่ ๑ ในการส่งมอบติดตั้งชุดอุปกรณ์ฟ้าผ่ากระชอกให้กับสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค ๕ แห่ง ได้แก่ สำนักงาน กสทช. ภาค ๑ เขตหลักสี่ ภาค ๒ จังหวัดขอนแก่น เขต ๒๓ จังหวัดนครราชสีมา เขต ๒๔ จังหวัดอุตรธานี และ เขต ๑๔ จังหวัดปราจีนบุรี	๑๐.๐๐	✓		๑. จำนวนครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ อุปกรณ์ฯ จำนวน ๑๑ ชุด ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่ กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	
๑	โครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ สำนักงาน กสทช. จำนวน ๑ ระบบ	นบ.	๘.๔๗๑	๘.๔๗๑	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ สำนักงาน กสทช.					✓		ได้ลงนามในสัญญาจ้าง เลขที่ ๘๖๕๐๒๓๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ และนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานในวงงานที่ ๑ ในการส่งมอบ อุปกรณ์เชื่อมต่อกับระบบตามขอบเขตของงาน (TOR)	๑๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ สำนักงาน กสทช. จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่ กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	
๑	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการ เข้าใช้งานแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On)	นบ.	๓๓.๖๒๖	๒๑.๘๘๘	ปี ๒๕๖๖ (๑๑.๗๓๘)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการการเข้าใช้งาน แบบรวมศูนย์ (Single Sign-On) สำหรับเข้า ใช้งานระบบงานภายในของสำนักงาน กสทช. ให้สามารถเข้าใช้งานระบบงานผ่านการ log-in เข้าสู่ระบบเพียงครั้งเดียว และระบบ ยืนยันตัวตน ๒ ชั้น ด้วยตัวเลข หรือ QR-Code (Username -Password และ OTP/QR Code Scan) โดยได้รับความ สะดวกและความปลอดภัยที่มากขึ้น					✓		ได้ลงนามสัญญาจ้าง เลขที่ ๘๖๕๐๓๔๐ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามสัญญา ในวงงานที่ ๑ ใน การจัดทำแผนการดำเนินโครงการ โดยมีรายละเอียดระดับสถาปัตยกรรม และ แนวทางที่เหมาะสมแก่สำนักงาน กสทช. เพื่อรับความเห็นชอบก่อน ดำเนินการต่อไป	๑๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบบริหารจัดการการเข้า ใช้งานแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On) จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่ กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	
๑	โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการ แพลตฟอร์มหลากหลายแบบรวมศูนย์ พร้อมปรับปรุงห้องปฏิบัติการ	นบ.	๑๐.๒๒๐	๑๐.๒๒๐	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการแพลตฟอร์ม หลากหลายแบบรวมศูนย์ พร้อมปรับปรุง ห้องปฏิบัติการ ให้เชื่อมโยงระบบต่างๆ เข้า ด้วยกัน โดยการทำงานของระบบและ อุปกรณ์ต่างๆ ได้แบบรวมศูนย์ และเพิ่ม ประสิทธิภาพของการวิเคราะห์และ ประมวลผลโดยการใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ และประมวลผลในภาพรวมในการสนับสนุน งานของหน่วยงานต่างๆ ภายใน กสทช. เพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงาน		✓			ได้ดำเนินการตามกระบวนการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แล้วตามวันที่ ๓๗ ๒๐๑๐/๖๘๒๒ ลง วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ โดยในขั้นตอนการยื่นข้อเสนอประกวดราคาได้ มีผู้ยื่นเสนอราคา ๒ ราย แต่ผ่านคุณสมบัติเพียงรายเดียว จึงดำเนินการ ยกเลิกการประกวดราคาคงกล่าว เพื่อให้ผลการประกวดราคา เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ โดยได้ ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อีกครั้ง โดยคณะกรรมการฯ ได้จัดทำบันทึกขอความอนุเคราะห์บันทึกข้อมูลการจัดจ้างด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ตามบันทึกที่ สทช ๒๐๑๐/๑๔๖๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ และนี้อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดทำรายงานผลการพิจารณาการจัดจ้างระบบฯ	๐.๐๐		✓	๑. จำนวนระบบบริหารจัดการ แพลตฟอร์มหลากหลายแบบรวมศูนย์ พร้อมปรับปรุงห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่ กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากใน การประกาศประกวดราคาฯ ได้มีผู้ยื่นข้อเสนอ ๒ ราย แต่ ถูกต้องตามเงื่อนไขข้อกำหนดเพียงรายเดียว จึงต้องยกเลิก การประกวดราคาฯ ครั้งนี้ และดำเนินการประกวดราคา ใหม่			
๑	โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ พร้อมอาคารประกอบ	ภก.๒	๖๔.๐๒๗	๒๐.๓๐๘	ปี ๒๕๖๖ (๔๘.๓๑๙)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อใช้เป็นศูนย์บริหารงานในการกำกับดูแล กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมในพื้นที่รับผิดชอบ สามารถรองรับหน่วยงานภายในสังกัดอย่าง เพียงพอ สะดวก และเกิดความคล่องตัวใน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการ		✓			ได้รับอนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) แล้วเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ และได้ดำเนินการขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ แล้วตาม บันทึกที่ สทช ๒๐๑๓.๑/๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และนี้อยู่ ระหว่างการจัดทำราคากลาง	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนอาคารที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ จำนวน ๑ หลัง ๒. จำนวนอาคารบ้านพัก จำนวน ๕ หลัง ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่ กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-			
๑	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง สำหรับอาคารระดมประชุมสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ จำนวน ๓ รายการ	ภก.๒	๔.๐๕๔	๔.๐๕๔	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่ใช้ในหอประชุมสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ สำหรับเป็นสถานที่ประชุม อบรมและสัมมนาที่จัดร่วมกับหน่วยงาน ภายในหรือภายนอก และปฏิบัติตามตาม ภารกิจได้อย่างเหมาะสม		✓			ได้รับอนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) แล้วเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ ได้มีความเห็นให้ปรับแก้ไขชื่อโครงการเดิมชื่อ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งสำหรับอาคารระดมประชุมสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ "จำนวน ๓ รายการ" ให้ปรับแก้เป็น "จำนวน ๓ กลุ่ม รายการ" และนี้อยู่ระหว่างนำเสนอเข้ารายการประชุม กสทช. เพื่อ พิจารณาอนุมัติปรับชื่อโครงการ	๐.๐๐		✓	๑. จำนวนครุภัณฑ์โครงการฯ จำนวน ๓ รายการ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่ กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากที่ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ ได้มีความเห็นให้ปรับแก้ไขชื่อโครงการ จึงต้องดำเนินการเสนอเข้ารายการประชุม กสทช. เพื่อ พิจารณาอนุมัติปรับชื่อโครงการใหม่			
๑	โครงการบูรณาการระบบรักษาความ ปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒	ภก.๒	๖.๖๑๖	๔.๖๔๖	ปี ๒๕๖๖ (๑.๙๗๑)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัย ของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ ให้ความ ปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้ความ ปลอดภัยต่อทรัพย์สินของสำนักงาน พนักงาน ตลอดจนประชาชนที่เข้ารับบริการ		✓			ได้รับอนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) แล้วเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕ และนี้อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบรักษาความปลอดภัย ของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่ กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-			

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)		วัตถุประสงค์ของ การดำเนินโครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนิน งาน/กิจกรรม/โครงการ	การ ดำเนิน การ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ			เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่ กำหนด			
๑	โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. ภาค ๓	ภ.๓	๕๔.๖๐๐	๑๐.๒๓๐	ปี ๒๕๖๓ (๑๔.๘๐๐) ปี ๒๕๖๔ (๒๕.๕๙๐)	๕.๓.-๖๓	๕.๓.-๖๕	เพื่อก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. ภาค ๓ ให้มีสถานที่สำหรับปฏิบัติงานของพนักงาน กสทช. รองรับภารกิจของ สำนักงาน กสทช.ภาค ๓			✓				๓๕.๐๐		✓	๑. จำนวนที่ทำการสำนักงาน กสทช. ภาค ๓ จำนวน ๑ หลัง ๒. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๓. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า ๘๕ ๔. ร้อยละการเบิกจ่ายติดตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากพบปัญหาแบบขัดแย้ง จึงต้องดำเนินการปรับแก้แบบรูปรายการ และขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างฯ ทำให้การก่อสร้างล่าช้าออกไป โดยได้เร่งรัดการดำเนินการและการประสานงานของภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งตรวจสอบติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้างเป็นประจําอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การก่อสร้างเกิดความล่าช้ามากที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจากความเห็นที่ประชุมฯ ได้มีความเห็นให้ขอลงการส่งมอบงานงวดที่ ๕ และ ๖ ออกไป เพื่อดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินกับของปี ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามแผนที่เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๕๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท	
๑	โครงการก่อสร้างภูมิสถาปัตย์ พร้อม สิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงาน กสทช. เขต ๓๔	ภ.๓	๓๐.๕๐๐	๒๐.๓๔๐	ปี ๒๕๖๖ (๔.๓๖๐)	๓.๓.-๖๕	๕.๓.-๖๖	เพื่อให้ภูมิสถาปัตย์ของสำนักงาน กสทช. เขต ๓๔ เกิดความสวยงามและควบคุมภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินมีสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมกับการทำงานรองรับภารกิจของ สำนักงาน กสทช. เขต ๓๔		✓					๐.๐๐	✓	๑. จำนวนสิ่งก่อสร้างและ/หรือระบบ สาธารณูปโภคโดยรอบอาคาร สำนักงานมีความครบถ้วนพร้อมใช้ งาน จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้ให้บริการ ไม่น้อยกว่า ๘๕ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายติดตามแผนที่ กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ เมื่อ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้มีพิจารณาอนุมัติ ปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ โดยปรับแผนงบประมาณโครงการก่อสร้างภูมิ สถาปัตย์ พร้อมสิ่งก่อสร้าง ประกอบ สำนักงาน กสทช. เขต ๓๔ จากปี ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๙,๓๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท ไปผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๖ เนื่องจากเป็นโครงการที่มีความสำคัญ และจำเป็นต้องการใช้งานอาคารสำนักงานและ บ้านพักของสำนักงาน กสทช. เขต ๓๔ ที่ ดำเนินการมาก่อนเพื่อให้มีระบบสาธารณูปโภค มีสภาพแวดล้อมที่ดี เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปี ๒๕๖๔ จึง จำเป็นต้องขอปรับแผนเป็นผูกพันงบประมาณ ข้ามปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖	
๑	โครงการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ พร้อม สิ่งก่อสร้างประกอบ	ภ.๔	๑๒.๔๐๐	๕.๑๒๕	ปี ๒๕๖๔ (๗.๒๗๕)	๕.๓.-๖๔	๕.๓.-๖๕	เพื่อให้ภูมิสถาปัตย์ของสำนักงาน กสทช. ภาค ๔ เกิดความสวยงามและควบคุมภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ การทำงานรองรับภารกิจของ สำนักงาน กสทช. ภาค ๔		✓					๑๕.๐๐		✓	๑. จำนวนสิ่งก่อสร้างและ/หรือระบบ สาธารณูปโภคโดยรอบอาคาร สำนักงานมีความครบถ้วนพร้อมใช้ งาน จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้ให้บริการ ไม่น้อยกว่า ๘๕ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายติดตามแผนที่ กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากมีการ ปรับแก้ไขสัญญา ลดค่างานเสาเข็ม จากเดิมกำหนดความ ยาวเสาเข็มไว้ ๑๒ เมตร เป็น ๑๐ เมตร ตามผลการ ทดสอบจากสำนักงานโยธา ทำให้งานล่าช้ากว่าแผนการ ก่อสร้างที่กำหนดไว้	
๒	แผนงานการบริหารกิจการภูมิภาค	ภ.๓	๒๑๘.๕๐๐	๒๑๘.๕๐๐	-	๓.๓.-๖๕	๕.๓.-๖๕	เพื่อขับเคลื่อนแผนงานการบริหารกิจการ ภูมิภาค			✓				๘๑.๕๘	✓		-		
๒	แผนงานการบริหารกิจการกระจายเสียง และโทรทัศน์	สท.	๑๔๓.๖๗๘	๑๔๓.๖๗๘	-	๓.๓.-๖๕	๕.๓.-๖๕	เพื่อขับเคลื่อนแผนงานการบริหารกิจการ กระจายเสียงและโทรทัศน์			✓				๘๒.๗๘	✓		-		
๒	แผนงานการบริหารกิจการโทรคมนาคม	ทค.	๕๙๒.๕๙๘	๕๙๒.๕๙๘	-	๓.๓.-๖๕	๕.๓.-๖๕	เพื่อขับเคลื่อนแผนงานการบริหารกิจการ โทรคมนาคม			✓				๕๘.๙๗	✓		-		
๒	งานสนับสนุนการบริหารคลื่นความถี่ กิจกรรม ๑. การจัดทำประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้ กิจการ ประจำที่ ย่านความถี่ 57-66 GHz ๒. การจัดทำประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เป็นการทั่วไป	ค.บ.	๑.๘๗๔	๑.๘๗๔	-	๓.๓.-๖๕	๕.๓.-๖๕	สนับสนุนการกีดกันการบริหารคลื่นความถี่ เพื่อปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้ กิจการประจำที่ ย่านความถี่ 57-66 GHz เพื่อปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เป็น การทั่วไป รวมถึงจัดทำประกาศ กสทช. ที่ เกี่ยวข้อง			✓				๖๐.๐๐	✓	๑. จำนวนแผน กฎ ระเบียบ แนวทาง จำนวน ๒ ฉบับ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายติดตาม แผนที่ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-		

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)		วัตถุประสงค์ของ การดำเนินโครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					การ ดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ		เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่ กำหนด				
																				ความก้าวหน้าการดำเนิน งาน/กิจกรรม/โครงการ
๒	งานสนับสนุนการบริหารจัดการ ดาวเทียม	ตบ.	๐.๕๘๓	๐.๕๘๓*	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	สนับสนุนการดำเนินงานโครงการดาวเทียมสื่อสาร การดำเนินการตามแผนบริหารสิทธิในการ เข้าใช้โครงข่ายดาวเทียม การใช้อุปกรณ์ดาวเทียม ต่างชนิด การพิจารณาอนุญาต ติดตาม ตรวจสอบและกำกับดูแลการ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาวเทียม			✓				๓๐.๖๐	✓		๑. จำนวนแผน กฏ ระเบียบ แนวทาง จำนวน ๑ ฉบับ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจัดตาม แผนการใช้เงิน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	ได้รับการปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายสำหรับ การดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. จากเดิม จำนวน ๕๘๓,๐๐๐ บาท เป็น จำนวน ๑,๒๕๑,๐๐๐ บาท
๒	โครงการศึกษาทิศทาง รูปแบบการ ให้บริการดาวเทียมในภาคและแนวทาง ในการกำกับดูแลให้บริการดาวเทียม ในประเทศไทย	ตบ.	๔.๕๖๕	๒.๒๘๘	ปี ๒๕๖๔ (๒.๒๘๒)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อวิเคราะห์สภาพอุตสาหกรรมของ ดาวเทียม เทคโนโลยี ทิศทาง แนวโน้ม รูปแบบการให้บริการดาวเทียมสื่อสารใน อนาคต แนวโน้มและกรอบการกำกับ ดูแลการให้บริการดาวเทียมที่เหมาะสมใน อนาคต ประเมินผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ และสังคม ของการให้บริการดาวเทียมสื่อสาร ในประเทศไทย ทั้งในส่วนของการดาวเทียมไทย และดาวเทียมต่างชาติ รวมทั้งประเมิน นโยบายการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ดาวเทียม เพื่อให้บริการในประเทศไทยและ จัดทำข้อเสนอแนะในการกำหนดนโยบาย และแนวทางในการกำกับดูแลให้บริการ ดาวเทียมในประเทศไทย		✓					๑๐๐.๐๐	✓		๑. จำนวนรายงานผลการศึกษาและ ข้อเสนอแนะ จำนวน ๑ ฉบับ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจัดตามแผนที่ กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	-	
๒	โครงการระบบตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมาย จากทางอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ ระดับภูมิภาค	นบ.	๙๔.๙๕๐	๙.๔๙๕	ปี ๒๕๖๒ (๙๙.๐๐๒) ปี ๒๕๖๓ (๙๘.๐๐๕) ปี ๒๕๖๔ (๙๘.๘๘๙)	ม.ค.-๖๒	ธ.ค.-๖๕	เพื่อตรวจสอบเนื้อหาโฆษณาที่ผิดกฎหมาย ที่มีการออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุหรือ สถานีโทรทัศน์ เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชน ได้รับสื่อโฆษณาที่มีข้อมูลอันเป็นเท็จ โฆษณา เกินจริง โดยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเร่งตรวจสอบและดำเนินการ กับผู้กระทำผิดร่วมกัน			✓				๑๐๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบตรวจสอบสิ่งผิด กฎหมายจากการออกอากาศทางวิทยุ และโทรทัศน์ระดับภูมิภาค จำนวน ๑ ระบบ ๒. จำนวนรายงานการตรวจสอบ เนื้อหาโฆษณาที่ผิดกฎหมาย จำนวน ๓ ฉบับ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจัดตามแผนที่ กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	-	
๒	โครงการจัดหาเครื่องตรวจสอบและหาวิทยุ จำนวน ๒๖ คัน	กบ.	๒๒๖.๖๕๕	๓๘.๘๓๕	ปี ๒๕๖๔ (๑๙๙.๘๒๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อจัดหาเครื่องตรวจสอบและหาวิทยุสำหรับ การใช้งานประจำสำนักงาน กสทช. ภาค และสำนักงาน กสทช. เขต ในการตรวจสอบ และค้นหาตำแหน่งการแพร่คลื่นความถี่วิทยุ ตามภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ สำนักงาน กสทช. มีข้อมูลการตรวจสอบ ใช้งานคลื่นความถี่วิทยุสำหรับการเฝ้าระวัง การตรวจสอบ การค้นหาตำแหน่งสถานี แพร่คลื่น การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา ใช้คลื่นความถี่ที่มีการรบกวนซึ่งกันและกัน เพื่อให้การบูรณาการการบริหารคลื่นความถี่ ไม่การรวมครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ อย่าง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น			✓				๕๐.๐๐	✓		๑. จำนวนรถตรวจสอบและหาวิทยุ วิทยุ จำนวน ๒๖ คัน ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจัดตามแผนที่ กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจาก อุปกรณ์ตามข้อกำหนดของสัญญาชำรุด และไม่มีใบ การผลิต เช่น อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือ ตรวจสอบสถานีวิทยุคมนาคม เป็นต้น สำนักงาน กสทช. จึงได้มีบันทึกตกลงแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ปรับแก้ไขสัญญาฯ ดังกล่าวเพิ่มเติม โดย คู่สัญญาจะส่งมอบพัสดุ ทั้งหมดจำนวน ๒๖ คัน ในงวด สุดท้ายงวดเดียว	
๒	โครงการจัดหาเครื่องตรวจวัดความถี่และ ความถี่วิทยุ ชนิด Real Time Bandwidth 100 MHz แบบสะพานอ็อก ย่านความถี่ 10 MHz – 42 GHz พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔ ชุด	กบ.	๑๔๒.๒๕๕	๑๒.๑๑๕	ปี ๒๕๖๔ (๒.๑๓๗)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อจัดหาเครื่องตรวจวัดความถี่และค้นหา ตำแหน่งสถานีส่งสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบของ สำนักงาน กสทช. ภาค และสำนักงาน กสทช. เขต ในภาคสนามได้อย่างสะดวก คล่องตัว และเป็นมาตรฐานเดียวกัน			✓				๑๐๐.๐๐	✓		๑. จำนวนครุภัณฑ์โครงการ จำนวน ๔ ชุด ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจัดตามแผนที่ กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	
๒	โครงการจัดหาเครื่องสแกนความถี่และ ค้นหาตำแหน่งสถานีส่งสัญญาณ พร้อม อุปกรณ์ จำนวน ๔ ชุด	กบ.	๒๘.๐๐๐	๒๑.๐๐๐	ปี ๒๕๖๔ (๙.๐๐๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อจัดหาเครื่องสแกนความถี่และค้นหา ตำแหน่งสถานีส่งสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบของ สำนักงาน กสทช. ภาค สำนักงาน กสทช. เขต มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน			✓				๑๐.๐๐	✓		๑. จำนวนครุภัณฑ์โครงการ จำนวน ๔ ชุด ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจัดตามแผนที่ กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)		วัตถุประสงค์ของ การดำเนินโครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/ กิจกรรม/โครงการ	การ ดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ		
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ			เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่ กำหนด					
๒	โครงการจัดซื้อชุดสายอากาศสำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นความถี่วิทยุแบบสะพายถือ ย่านความถี่ 5 kHz – 26.5 GHz จำนวน ๒๕ ชุด	ภก.	๔๕.๐๑๐	๓๖.๐๐๘	ปี ๒๕๖๔ (๔.๐๐๒)	ม.ค.-๖๔	ธ.ค.-๖๔	เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นความถี่วิทยุแบบสะพายถือ ย่านความถี่ 5 kHz – 26.5 GHz เพื่อให้การตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่วิทยุครอบคลุม ย่านความถี่ 30 kHz – 26.5 GHz และการปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. ภาค สำนักงาน กสทช. เขต มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น					✓			๑๐๐.๐๐	✓		๑. จำนวนครุภัณฑ์โครงการ จำนวน ๒๕ ชุด ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-		
๒	โครงการจัดเก็บและบูรณาการระบบตรวจสอบและควบคุมสถานีตรวจสอบความถี่ระยะไกล	ภก.	๘.๙๒๕	๗.๕๘๖	ปี ๒๕๖๖ (๑.๓๓๘)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนา ปรับปรุงอุปกรณ์และระบบจัดเก็บฐานข้อมูลระบบตรวจสอบและควบคุมสถานีตรวจสอบความถี่วิทยุระยะไกลและการบำรุงรักษาเครื่องมือ สถานีตรวจสอบสามารถตรวจสอบเชิงป้องกันเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ					✓			๑๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบตรวจสอบและควบคุมสถานีตรวจสอบความถี่ระยะไกล จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-		
๒	โครงการศึกษาผลกระทบการแพร่กระจายคลื่นต่อระบบอัตโนมัติสัญญาณของทางขนส่งระบบรางเพื่อการกำกับดูแลของสำนักงาน กสทช.	ภก.	๔.๑๗๕	๓.๖๗๐	ปี ๒๕๖๖ (๕.๕๐๔)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อศึกษาการทำงาน ปัญหาการรบกวนระบบอัตโนมัติสัญญาณของทางขนส่งระบบรางทั้งในและต่างประเทศ การบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาการรบกวน และจัดทำโปรแกรมวิเคราะห์และอุปกรณ์ตรวจสอบการแพร่กระจายคลื่นเพื่อใช้เก็บข้อมูลข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนแม่บทในการกำกับดูแลการตรวจสอบการแพร่คลื่นเพื่อป้องกันการรบกวนสัญญาณต่อระบบอัตโนมัติสัญญาณของทางขนส่งระบบราง					✓			-	-		๑. รายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะฯ จำนวน ๑ ฉบับ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	ที่ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองร่างขอบเขตของงานร่างขอบเขตของงานในการจัดหาพัสดุของสำนักงาน กสทช. ได้มีความเห็นว่า ระบบอัตโนมัติสัญญาณที่ประสงค์จะทำการศึกษวิเคราะห์หรือตรวจวัดนั้นเป็นเส้นทางของรถไฟความเร็วสูง ซึ่งปัจจุบันยังไม่ทราบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วเพียงใด และมีกำหนดการเปิดให้บริการเมื่อใด และการดำเนินการตรวจวัดสัญญาณของสำนักงานฯ จะกระทำได้อย่างไรหรือไม่	ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้อนุมัติให้ยกเลิกดำเนินการโครงการฯ ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ และได้ดำเนินการส่งงบประมาณทั้งหมดแล้ว จำนวน ๕,๑๗๕,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย - งบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓,๖๖๔,๖๐๐ บาท - งบประมาณปี ๒๕๖๖ จำนวน ๕,๕๐๔,๕๐๐ บาท	
๒	โครงการจัดหาและพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์คอมพิวเตอร์ที่ของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค จำนวน ๑ คัน	ภก.	๑๕.๐๐๐	๑๒.๗๕๐	ปี ๒๕๖๖ (๒.๒๕๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อจัดหาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์แบบปรับปรุงและพัฒนาให้สามารถดำเนินการออกใบอนุญาตเคลื่อนที่ และใช้ภารกิจการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งมีรองรับของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาคเพื่อบริการประชาชนในการออกใบอนุญาตเคลื่อนที่					✓				๒๕.๐๐	✓		๑. จำนวนรถสำหรับใช้ในการออกใบอนุญาตเคลื่อนที่จำนวน ๑ คัน ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	
๒	โครงการพัฒนาระบบต้นแบบสำหรับการบริหารจัดการความถี่วิทยุและการตรวจสอบคลื่นความถี่ของศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่แห่งชาติ	ภก.	๔.๕๖๑	๔.๒๕๘	ปี ๒๕๖๖ (๕.๒๐๓)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาระบบต้นแบบสำหรับการบริหารจัดการความถี่วิทยุและการตรวจสอบคลื่นความถี่ของศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่แห่งชาติ					✓				๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบต้นแบบสำหรับการบริหารจัดการความถี่วิทยุและการตรวจสอบคลื่นความถี่ จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากในขั้นตอนการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้มีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย แต่ถูกต้องตามเงื่อนไขข้อกำหนดเพียงรายเดียว จึงยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าว และดำเนินการประกวดราคาใหม่เพื่อให้ผลการประกวดราคา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง	
๒	โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์และถอดเสียงการออกอากาศวิทยุกระจายเสียง	ภก.	๔.๕๐๒	๔.๒๗๖	ปี ๒๕๖๖ (๕.๒๒๖)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อจัดหาอุปกรณ์การถอดเสียงเพื่อใช้เป็นระบบต้นแบบ (Prototype) ในการพัฒนาระบบการถอดเสียงและวิเคราะห์การออกอากาศวิทยุกระจายเสียงให้มีประสิทธิภาพ และระบบสารสนเทศบริหารจัดการการตรวจสอบเนื้อหาการออกอากาศ					✓				๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบการวิเคราะห์และถอดเสียงการออกอากาศวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากในขั้นตอนการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้มีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย แต่ถูกต้องตามเงื่อนไขข้อกำหนดเพียงรายเดียว จึงยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าว และดำเนินการประกวดราคาใหม่เพื่อให้ผลการประกวดราคา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง	
๒	โครงการเครื่องมือตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุในการตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงานพระราชพิธีของสำนักงาน กสทช. ภาค ๑ จำนวน ๕ สถานี	ภก.๑	๓๐.๔๕๒	๗.๖๗๒	ปี ๒๕๖๔ (๐.๐๐) ปี ๒๕๖๖ (๒๒.๘๘๐)	ม.ค.-๖๔	ธ.ค.-๖๖	เพื่อจัดหาเครื่องมือตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุประเภท Cellular Technology แบบประจำที่และแบบเคลื่อนที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้งานความถี่ของผู้ประกอบการรายสื่อสารของหน่วยงานต่างๆ ที่มีการใช้งานประเภท Cellular Technology					✓				๐.๐๐	✓		๑. จำนวนครุภัณฑ์โครงการ จำนวน ๕ สถานี ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	
๒	โครงการจัดทำต้นแบบศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่ของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค	ภก. ๑	๔.๗๒๒	๖.๗๒๖	ปี ๒๕๖๖ (๑.๔๐๖)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อจัดหาระบบวิดีโอแอลอีดี และระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ความถี่วิทยุ สำหรับการจัดทำศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่ในพื้นที่สำนักงาน กสทช.ภาค ๑ (ต้นแบบ)					✓				๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ความถี่วิทยุ จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)		วัตถุประสงค์ของ การดำเนินโครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/ กิจกรรม/โครงการ	การ ดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ			
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ			เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่ กำหนด						
๒	โครงการสถานีเฝ้าระวังการแพร่กระจาย คลื่นเพื่อการกำกับดูแลของสำนักงาน กสทช. ภาค ๔	ภก.๔	๔.๔๙๐	๔.๕๐๐	ปี ๒๕๖๖ (๕.๔๔๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อจัดตั้งสถานีเฝ้าระวังการแพร่กระจาย คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบตลอดความถี่เช่น โรงพยาบาล โรงเรียนเด็ก และเฝ้าระวังการ รบกวนทางสัญญาณต่อเครื่องมือทาง การแพทย์ที่อาจส่งผลกระทบต่อ รักษาพยาบาลผู้ป่วยและผลกระทบต่อคลื่น แม่เหล็ก ในพื้นที่ของสำนักงาน กสทช.ภาค ๔		✓							ได้รับอนุมัติของเขตของงาน (TOR) และราคาจาก จาก รสทช. (ภค.) แล้วเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ และวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ตามลำดับ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง ด้วยวิธีคัดเลือก และ จัดทำรายงานผลการจ้าง เสนอต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	๐.๐๐		✓	๑. จำนวนสถานีเฝ้าระวังการ แพร่กระจายคลื่น จำนวน ๑ สถานี ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่ กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากมีการ ปรับและแก้ไขขอบเขตของงาน (TOR) จำนวน ๕ ครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง	
๒	โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบและกำกับ ดูแลการออกอากาศด้านกิจการกระจาย เสียงและกิจการโทรทัศน์	ปส.	๖.๒๔๘	๖.๒๔๘	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบและกำกับดูแล การออกอากาศด้านกิจการกระจายเสียงและ กิจการโทรทัศน์และรองรับการบริการและ การกำกับดูแลเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง และโทรทัศน์ที่มีผู้ควบคุมเป็นดิจิทัล				✓					ได้ลงนามในสัญญาจ้าง เลขที่ ๘๖๕๐๑๐๐ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้วเสร็จ ประกอบด้วย รายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบใน รูปแบบเอกสารข้อกำหนดความต้องการด้านซอฟต์แวร์ (System Requirement Specification : SRS) ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานงวด ที่ ๒ ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนในกิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (BCS Inform) และพัฒนาระบบ รองรับการจัดทำเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (BCS Digital Sign)	๗๐.๐๐		✓	๑. จำนวนระบบตรวจสอบและกำกับ ดูแลการออกอากาศ จำนวน ๑ สถานี ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่ กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	
๒	โครงการปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอดสดและ รายงานข่าวการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมที่ สำคัญของประเทศไทย	ปส.	๗๖.๐๘๘	๗๘.๐๔๙	ปี ๒๕๖๖ (๗๘.๐๔๙)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอดสดและรายงาน ข่าวการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมที่สำคัญของ ประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางในการจัดการ ถ่ายทอดสด และรายงานข่าวการแข่งขันกีฬา และกิจกรรมที่สำคัญของประเทศไทย ได้ อย่างสมบูรณ์และทันสมัยรองรับเทคโนโลยี 4K และเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ ถ่ายทอดสดและรายงานข่าวการแข่งขันกีฬา เอเชียนเกมส์ ๒๐๒๒		✓							ได้ดำเนินการตามกระบวนการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยยื่นข้อเสนอบริการเสนอประกวด ราคาได้มีผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว จึงดำเนินการยกเลิกการ ประกวดราคาดังกล่าว และดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างลงประกาศและเอกสารประกวดราคาใหม่ โดยได้ เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และสำนักงาน กสทช.	๐.๐๐		✓	๑. จำนวนศูนย์ถ่ายทอดสดและ รายงานข่าวการแข่งขันกีฬาและ กิจกรรมที่สำคัญของประเทศไทย จำนวน ๑ ศูนย์ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่ กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากใน ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้มีผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว จึงยกเลิก การประกวดราคาดังกล่าว และดำเนินการประกวดราคา ใหม่เพื่อให้ผลการประกวดราคา เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง	
๒	โครงการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ในประเทศไทย	สส.	๑๔.๑๒๘	๑๐.๐๒๙	ปี ๒๕๖๔ (๔.๑๒๙)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ให้บริการ ดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ให้บริการในประเทศไทย เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบและลักษณะของการ ดำเนินธุรกิจ รวมถึงแนวโน้มรายได้จากการ ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มและเผยแพร่ผล จากการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับใช้ ประโยชน์ในการสนับสนุนการจัดทำนโยบาย ในการกำกับดูแลของ กสทช. และหน่วยงาน ของรัฐที่เกี่ยวข้อง				✓					ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๓ แล้วเสร็จ ตามบันทึกที่ สทช ๒๐๐๗/๑๙๑ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย มีรายงานผลการศึกษารวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของ บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มในประเทศไทย ที่นำมาใช้เป็นฐานข้อมูล ผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ประเทศไทย เชื่อมโยงร่วมกับข้อมูลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์ภายในสำนักงาน กสทช. ผ่านระบบรายงานสารสนเทศเชิง วิเคราะห์ Microsoft Power BI เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเรียกหาข้อมูล ด้านการแข่งขันได้โดยสะดวกรวดเร็ว และทำให้การใช้งาน ข้อมูลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจะนำไปใช้บริหารจัดการและเชื่อมโยง ฐานข้อมูลของบริการดิจิทัลแพลตฟอร์มร่วมกับกับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร เป็นต้น ต่อไปในอนาคต	๑๐๐.๐๐		✓	๑. จำนวนรายงานการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่ กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	-	
๒	โครงการต้นแบบพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	ผส.	๑.๒๖๗	๑.๒๖๗	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ให้มีมาตรฐานและ คุณภาพในการประกอบวิชาชีพ มีความเป็น กลาง และมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม				✓					ได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ แล้วเสร็จ ประกอบด้วย รายงานผลการศึกษาค้น (Inception Report) และ สรุปผลการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะในการจัดอบรมโครงการต้นแบบ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ตามลำดับ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงาน งวดที่ ๓ อาทิ การจัดทำรายงานผลการวิจัยติดตามและประเมินผลการ จัดอบรม การนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรในการจัด อบรมฯ การจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฯ ฉบับสมบูรณ์ เป็นต้น	๘๐.๐๐		✓	๑. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ฝึกอบรมฯ จำนวน ๘๐ คน ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่ กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	
๒	โครงการพัฒนาระบบการอนุญาตวิทยุ คมนาคมในกิจการกระจายเสียงและ กิจการโทรทัศน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RBS)	ทส.	๓.๖๘๗	๓.๖๘๗	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อพัฒนาระบบการอนุญาตวิทยุคมนาคมใน กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RBS) โดยรองรับการ ยื่นยื่นคำขอผ่านระบบการยื่นคำขอรับ อนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-BCS) และ เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลกิจการกระจาย เสียงและกิจการโทรทัศน์ (BCS) และมี ฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันให้ผู้ใช้บริการ รวมก็สามารถเรียกดูสืบค้นการอนุญาตวิทยุ คมนาคมในกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทันสมัย				✓					ได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้วเสร็จ ประกอบด้วย แผนการบริหารจัดการโครงการทั้งหมด (Project Master Plan) และ รายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ และการออกแบบระบบการอนุญาต วิทยุคมนาคมในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (RBS) ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๒ อาทิ การ พัฒนาและปรับปรุงระบบการอนุญาตฯ ในรูปแบบ Web Application การพัฒนาระบบฯ ให้เชื่อมโยงกับระบบการยื่นคำขอรับใบอนุญาตทาง อิเล็กทรอนิกส์ (e-BCS) ระบบฐานข้อมูลกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์ (BCS) การพัฒนาระบบฯ ให้รองรับการใช้งานลงลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงาน กสทช. กำหนด เป็นต้น	๘๐.๐๐		✓	๑. จำนวนระบบการอนุญาตวิทยุ คมนาคมในกิจการกระจายเสียงและ กิจการโทรทัศน์ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (RBS) จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่ กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	
๒	โครงการพัฒนาระบบรองรับการเปลี่ยน ผ่านการอนุญาตประกอบกิจการกระจาย เสียงและโทรทัศน์	ปส.	๔.๔๙๔	๗.๐๐๐	ปี ๒๕๖๖ (๒.๕๐๔)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาระบบรองรับการเปลี่ยนผ่าน การอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและ โทรทัศน์ สำหรับรองรับกระบวนการเปลี่ยน ผ่านไปสู่การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการ อนุญาตให้ใช้งานคลื่นความถี่และประกอบ กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์เพื่อรองรับ การบริการด้านการอนุญาตและการกำกับ ดูแลเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและ โทรทัศน์ ที่มีผู้ควบคุมเป็นดิจิทัล				✓					ได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๒ แล้วเสร็จ ประกอบด้วย รายงานการพัฒนาและปรับปรุงระบบตรวจสอบและกำกับดูแลการ ออกอากาศด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ขณะนี้อยู่ ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๓ ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบตรวจสอบ และกำกับดูแลการออกอากาศด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์ และการรายงานผลการพัฒนาและปรับปรุงระบบตรวจสอบฯ ดังกล่าว	๗๕.๐๐		✓	๑. ระบบรองรับการเปลี่ยนผ่าน การอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง และโทรทัศน์ จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่ กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)		วัตถุประสงค์ของ การดำเนินโครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/ กิจกรรม/โครงการ	การ ดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ			เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่ กำหนด			
๒	โครงการศึกษาแนวทางในการพัฒนา หลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลกิจการ โทรทัศน์ไทยให้สอดคล้องกับระบบนิเวศ ของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป	วส.	๕.๕๐๐	๓.๘๓๕	ปี ๒๕๖๖ (๒.๐๖๕)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลกิจการ โทรทัศน์ในปัจจุบันครอบคลุมมิติที่สมควร ปรับเปลี่ยนเพื่อให้ได้แนวทางในการกำกับ ดูแลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบนิเวศ ของอุตสาหกรรมและการแข่งขันที่ เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนรวบรวมความ คิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมา พัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ ไทย			✓			ได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้วเสร็จ ประกอบด้วย รายงานผลการศึกษารายไตรมาส (Interception Report) ขณะนี้อยู่ ระหว่างดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๒ รายงานผล การศึกษารายไตรมาส (Interim Report) ครั้งที่ ๑ และดำเนินการงาน งวดที่ ๓ ในการจัดทำรายงานผลการศึกษารายไตรมาส (Interim Report) ครั้งที่ ๒ ตามขอบเขตของงาน (TOR)	๓๐.๐๐	✓		๑. จำนวนรายงานการศึกษาและ ข้อเสนอแนะ จำนวน ๑ ฉบับ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่ กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	
๒	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการวัด การแพร่และปลอมตัวด้วยวิธี Real-time Monitoring	วส.	๖.๓๓๓	๖.๓๓๓	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการการแพร่ และปลอมตัวด้วยวิธี Real-time Monitoring ด้วยการนำข้อมูลจากอุปกรณ์ตรวจวัดสถานี ผู้ทศโลงฯ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มาใช้ใน การกำกับทางเทคนิคอย่างเป็นระบบและ กระบวนการ สดการตรวจนำสถานี โดยให้ ผู้ดูแลสถานีและสำนักงาน กสทช. ส่วน ภูมิภาค ได้รับแจ้งเตือนจากอุปกรณ์ฯ เพื่อ ทราบเหตุผิดปกติ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาได้ทันเวลาที่			✓		ได้ลงนามในสัญญาเลขที่ ๘๖๕๕๐๓๓๓ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการงานงวดที่ ๑ ในการจัดทำ extension module หรือ API เชื่อมต่อโปรแกรมประยุกต์ของบริษัท วิทยุการบิน จำกัด	๒๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบบริหารจัดการวัดการ แพร่และปลอมตัวด้วยวิธี Real-time Monitoring จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่ กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-		
๒	โครงการพัฒนาระบบประเภทโปรแกรม ประยุกต์ (Application Software Development)	วส.	๐.๕๑๐	๐.๕๑๐	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการ หลักเกณฑ์การตรวจวัดการแพร่สัญญาณวิทยุ Web Application และ Mobile Application ให้รองรับสถานี วิทยุกระจายเสียงตามแผนความถี่วิทยุกิจการ กระจายเสียงระบบเอเอ็ม สถานี วิทยุกระจายเสียงตามแผนความถี่วิทยุกิจการ กระจายเสียงระบบเอเอ็มกำลังตั้ง และ สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตให้ ทดลองออกอากาศตามหลักเกณฑ์ว่าด้วย การทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง ระบบเอเอ็มกำลังตั้ง			✓		ได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ประกอบด้วย โปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development) ๑ ระบบ ที่ใช้สำหรับบริหาร จัดการหลักเกณฑ์การตรวจวัดการแพร่สัญญาณวิทยุ Web Application และ Mobile Application ให้รองรับสถานีวิทยุกระจายเสียงตามแผน ความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอเอ็ม สถานีวิทยุกระจายเสียง ตามแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอเอ็มกำลังตั้ง และ สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตให้ทดลองออกอากาศตาม หลักเกณฑ์ว่าด้วยการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงระบบเอเอ็ม เอเอ็มกำลังตั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ	๕๕.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบประเภทโปรแกรม ประยุกต์ (Application Software Development) จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่ กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-		
๒	โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบ มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่ง วิทยุกระจายเสียงระบบเอเอ็มใน สำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค และเพิ่ม ศักยภาพห้องปฏิบัติการในส่วนกลาง	วส.	๑.๑๓๙	๑.๑๓๙	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุ กระจายเสียงระบบเอเอ็มในสำนักงาน กสทช. ในส่วนกลาง จัดตั้งห้องปฏิบัติการ ทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุ กระจายเสียงระบบเอเอ็ม ในสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค โดยดำเนินการสอบเทียบ เครื่องมือ (Calibration) เครื่องวิเคราะห์ แถบความถี่ (Spectrum Analyzer) และ อุปกรณ์			✓		ยกเลิกดำเนินการ	-	-	-	๑. จำนวนห้องปฏิบัติการทดสอบ มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่ง วิทยุกระจายเสียงระบบเอเอ็ม จำนวน ๔ แห่ง ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่ กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	ที่ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองร่างขอบเขตของงานฯ ได้มี ความเห็นว่างขอบเขตของงานมีการเปลี่ยนแปลงใน ส่วนของเนื้อหา เนื่องจากเดิมที่คาดการณ์ไว้จะมีการ ปรับลดกำลังเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงของสถานี วิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศ ทำให้ต้องมีการเตรียม พร้อมในการทดสอบมาตรฐาน แต่ภายหลังมติ กสทช. ไม่ ปรับลดกำลังส่ง จึงทำให้ต้องปรับลดเนื้อหา และทำให้ วัตถุประสงค์ของโครงการเปลี่ยนไป ดังนั้น จึงเห็นควร จำเป็นต้องยกเลิกโครงการเพราะวัตถุประสงค์เปลี่ยนแปลง	ได้ดำเนินการส่งคืนงบประมาณปี ๒๕๖๕ ในการ ปรับแผนงบประมาณรายจ่ายกลางปี ตามบันทึก ที่ สชช ๒๒๑๑/๒๕๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๑๓๙,๐๐๐ บาท	
๒	โครงการพัฒนาระบบช่วยปฏิบัติงานด้าน สิทธิแห่งทางเพื่อลงฐานข้อมูลแผนที่ โครงข่ายสื่อสาร : การพาดสายสื่อสาร	วท.	๕.๕๑๓	๕.๕๑๓	ปี ๒๕๖๔ (๕.๕๑๓)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อปรับปรุง เพิ่มเติมโครงการพัฒนาระบบ ช่วยปฏิบัติงานด้านสิทธิแห่งทางที่มีอยู่เดิม ให้สามารถลงฐานข้อมูลแผนที่โครงข่าย สื่อสาร : การพาดสายสื่อสาร เพื่อให้สำนักงาน กสทช. สามารถนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ พาดสายสื่อสารมาใช้ในการวางแผนและ กำหนดยุทธศาสตร์โครงการขยายโครงข่าย สื่อสารของประเทศ			✓		ได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๔ แล้วเสร็จ ประกอบด้วย การนำเข้าข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ขยายได้ดินที่สำนักงาน กสทช. ในรูปแบบไฟล์ excel หรือไฟล์ข้อมูลแผนที่ จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐๐ กิโลเมตร การติดตั้งระบบ และการจัดทำรายงานผลการติดตั้ง ระบบฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๕ อาทิ รายงาน ผลการติดตั้งระบบทั้งหมดยุคแบบแผนผังการส่งกำลังของ ระบบทั้งหมด (System Diagram) คู่มือสำหรับการใช้งานระบบแยก ตามกลุ่มผู้ใช้งานทั้งหมด คู่มือการบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบ เบื้องต้น รายงานสรุปผลการออกแบบและพัฒนาระบบตามหลักการ ด้านวิศวกรรมสำหรับพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างมั่นคงปลอดภัย เป็นต้น	๓๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบและ/หรือ Web Application จำนวน ๑ ระบบ ๒. จำนวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน ๑ ครั้ง ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่ กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	-		
๒	โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยออนไลน์แอปพลิเคชัน (ปีที่ ๓)	วท.	๕.๕๑๓	๓.๙๖๖	ปี ๒๕๖๖ (๕.๕๑๓)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อศึกษาและสำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภค ในการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และนำ ข้อมูลใช้ในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการ เปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภค สำหรับการจัดทำข้อเสนอแนะในการพัฒนา ศักยภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่าง เหมาะสมรวมทั้งการเสนอแนะเพื่อกำหนด นโยบายแผนและมาตรการกำกับดูแลให้มี ประสิทธิภาพ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ สาธารณะได้รับทราบและเข้าใจถึงพฤติกรรม การใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งจะนำไปสู่ การร่วมใจมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและ พัฒนาบริการโทรคมนาคมของประเทศอย่าง ยั่งยืนบนพื้นฐานของกรมมีข้อเท็จจริงที่ปรากฏ			✓		ได้รับอนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง แล้วเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ตามลำดับ ขณะนี้อยู่ ระหว่างดำเนินการเสนอรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ ต่อ สทช. (ทค.) เพื่อพิจารณาเห็นชอบและ อนุมัติให้ลงนามในใบประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แบบแจ้งผลการ จัดซื้อจัดจ้าง และหนังสือแจ้งลงนามในสัญญาต่อไป	๐.๐๐	✓		๑. รายงานผลการสำรวจพฤติกรรม การใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วย ออนไลน์แอปพลิเคชัน (ปีที่ ๓) จำนวน ๑ ฉบับ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่ กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-		
๒	โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสาย สื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	วท.	๒๐.๕๓๗	๖.๕๕๓	ปี ๒๕๖๖ (๑๕.๑๓๔)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสายสื่อสารบน เสาไฟฟ้าหรือเสานางในพื้นที่จะจัดลำดับ เส้นทางการสำรวจหรือมีความสำคัญหรือมีความจำเป็นใน การดำเนินการนำระบบสื่อสารลงใต้ดินหรือ จัดระเบียบสายสื่อสาร และนำข้อมูลที่ได้ลง ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศของสำนักงาน กสทช. เพื่อทำข้อมูลเส้นทางการสำรวจและ ไม่อนุญาตให้พาดสายสื่อสารในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร			✓		ได้ดำเนินการเสนอร่างขอบเขตงาน (TOR) เข้าสู่ที่ประชุมคณะทำงาน กลั่นกรองร่างขอบเขตของงานฯ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยคณะทำงานฯ ได้พิจารณา และมีความเห็นให้ปรับปรุงแก้ไขร่าง ขอบเขตงานฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงานฯ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของที่ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาต่อไป	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบจัดเก็บสารสนเทศ ภูมิศาสตร์และ Application จำนวน ๑ ระบบ ๒. จำนวนรายงานการสำรวจและ จัดเก็บข้อมูลสายสื่อสาร จำนวน ๑ ฉบับ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่ กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากเป็น โครงการที่ใช้งบประมาณจำนวนมาก และมีเนื้อหาที่ ค่อนข้างยากและเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอกหลายประการ ทำให้การดำเนินการจึงต้องมีความระมัดระวัง และ ครบถ้วน รวมถึงไม่เข้าขั้นกับกิจการงานอื่นๆ เพื่อให้ได้ ประสิทธิภาพที่มีตรงตามวัตถุประสงค์มากที่สุด จึงทำให้การ จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) มีความล่าช้ากว่าระยะเวลา ที่กำหนด		

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)		วัตถุประสงค์ของ การดำเนินโครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนิน งาน/กิจกรรม/โครงการ	การ ดำเนิน การ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ			เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่ กำหนด			
๒	โครงการสำรวจอุปสงค์ของการให้บริการ กระจายเสียงประเมินต้นทุนและจัดทำ โมเดลการลงทุนโครงข่ายและการ ให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบ ดิจิทัลของประเทศไทย	นส.	๑๓.๘๒	๑๓.๘๑๕*	-	ก.ย.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	๑. เพื่อสำรวจอุปสงค์ ความพร้อมของ ผู้ประกอบการ และให้ข้อเสนอแนะต่อ แนวทางในการกำหนดคุณสมบัติ ของการให้บริการกระจายเสียงใน ระบบดิจิทัล ในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และ ระดับท้องถิ่น ๒. เพื่อออกแบบโครงข่ายวิทยุกระจายเสียง ในระบบดิจิทัล ในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น ภายใต้ทางเลือกต่างๆ และประเมินต้นทุนการดำเนินงานติดตั้งและ ขยายโครงข่ายวิทยุกระจายเสียงในระบบ ดิจิทัล DAB+ ๓. เพื่อประเมินต้นทุนหรือจัดทำโมเดลของ ทางการลงทุนโครงข่ายวิทยุกระจายเสียงใน ระบบดิจิทัล และการลงทุนสถานี วิทยุกระจายเสียง (ช่องรายการ) เพื่อ ให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล พร้อมทั้งต้นทุนของผู้ใช้ในส่วนเครื่องรับวิทยุ และจัดทำข้อเสนอแนะในการกำหนด นโยบาย แผนงานและแนวทางในการ ให้บริการกระจายเสียงในระบบดิจิทัล ในประเทศไทย ๔. เพื่อวิเคราะห์ประเมินมูลค่า ผลกระทบ ทางเศรษฐกิจและสังคมของการเริ่มรับส่ง สัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสรุปผล การวิเคราะห์ในแต่ละทางเลือก ๕. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสร้างความ เข้าใจถูกต้องที่เกี่ยวข้องกับการรับส่ง สัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละภูมิภาค รวมทั้ง ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ระหว่างสำนักงาน กสทช. ภาครัฐ และ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์และทักษะความรู้ในกิจการ กระจายเสียงในระบบดิจิทัล		✓				ได้รับอนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางจาก กสทช. แล้วเมื่อ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ตามลำดับ ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งเรื่องไปยังสำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.) เพื่อดำเนินการจัดจ้างฯ ต่อไป ตามบันทึกที่ ๒๓๐๗/๖๖๗ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕	๑.๐๐	✓		๑. มีข้อเสนอแนะในการกำหนด นโยบาย แผนงานและแนวทางในการ ให้บริการกระจายเสียงในระบบ ดิจิทัลในประเทศไทย ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจึงตามแผนที่ กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๕ เมื่อ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้พิจารณาอนุมัติ ปรับแผนงบประมาณรายจ่ายกลางปี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยได้จัดสรรงบประมาณกลางปี จำนวน ๑๓,๘๑๕,๒๐๐ บาท เพื่อจ้างที่ปรึกษา สำรวจอุปสงค์ของการให้บริการกระจายเสียง ประเมินต้นทุนและจัดทำโมเดลการลงทุน โครงข่ายและการให้บริการวิทยุกระจายเสียงใน ระบบดิจิทัลของประเทศไทย โดยมีระยะเวลา ดำเนินการ ๓๐๐ วัน เบิกจ่าย ๔ งวด ดังนี้ - งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน ร้อยละ ๑๐ - งวดที่ ๒ ภายใน ๘๐ วัน ร้อยละ ๔๐ - งวดที่ ๓ ภายใน ๒๕๐ วัน ร้อยละ ๓๐ - งวดที่ ๔ ภายใน ๓๐๐ วัน ร้อยละ ๒๐
๓	งานการสนับสนุนงบประมาณแก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนากิจการกระจาย เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมของประเทศให้เกิดความยั่งยืน	อบ.	๒๓๐.๐๖๖	๒๓๐.๐๖๖*	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของ ประเทศให้เกิดความยั่งยืน		✓			ได้ดำเนินการสนับสนุนภารกิจของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ตาม ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการสนับสนุนการจัดกรรมสิทธิ์สิ่งพิมพ์และ สนับสนุนการดำเนินงาน กสทช. และสำนักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แก่ (๑) สนับสนุนโครงการเกษตรกรรมอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน ในพื้นที่ อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย สมาคมเทคโนโลยีดิจิทัลไทย (๒) สนับสนุนโครงการขยายผลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบ ฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย (ทีมภัย) สภากาชาดไทย (๓) สนับสนุนการผลิตสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ กรมประชาสัมพันธ์ (๔) สนับสนุนการดำเนินงานของชมรมลูกเสือรัฐสภาไทย (๕) สนับสนุนการดำเนินโครงการจ้างงานเพื่อการส่งเสริมสิทธิของ คนหูหนวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร (๖) สนับสนุนงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนโครงการตามรอยคตินิก เกษตรเคลื่อนที่ร่วมสืบสาน รักษาและต่อยอด NBTC Young Smart (๗) ชูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชกุศลตามพระ ราชอัยยาศัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ในโอกาสต่างๆ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ สนับสนุนโครงการ "ต้นแบบระบบการ บริหารจัดการโรงพยาบาลและข้อมูลสุขภาพด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย 5G"	๖๓.๖๔	✓		๑.จำนวนแผนงานสนับสนุน งบประมาณแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมของประเทศให้เกิดความ ยั่งยืน ๒. ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๕ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจึงตาม แผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๕ เมื่อ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้พิจารณาอนุมัติ ปรับแผนงบประมาณรายจ่ายกลางปี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยปรับเพิ่มงบประมาณจำนวน ๘๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณหลังปรับ แผนทั้งสิ้น ๔๘๐,๐๖๖,๘๐๐ บาท ตามบันทึกที่ สทช ๒๓๐๗/๖๓๐๒ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕	
๓	งานการสร้างรับรู้และความเข้าใจของ สาธารณะในการกิจด้านกิจการกระจาย เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ กิจกรรม ๑) การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ ภายในองค์กร ๒) การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ ภายนอกองค์กร ๓) การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ๔) การสนับสนุนการดำเนินการตาม ภารกิจ การประชาสัมพันธ์ สื่อสาร และ เผยแพร่ข้อมูล การปฏิบัติงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช.	สพ.	๑๐๔.๒๗๔	๑๐๔.๒๗๔*	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจของ สาธารณะในการกิจด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ การดำเนินกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ สื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลการ ปฏิบัติงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและ ถูกต้องทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน กสทช.		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการสร้างการรับรู้และความเข้าใจของสาธารณะใน ภารกิจด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามแผนที่กำหนด ดังนี้ (๑) ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ภายในองค์กร (๒) ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ภายนอกองค์กร (๓) ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ (๔) ดำเนินการสนับสนุนตามภารกิจ การประชาสัมพันธ์ สื่อสาร และ เผยแพร่ข้อมูล การปฏิบัติงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช.	๖๕.๗๑	✓		๑. จำนวนแผนประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ แผน ๒. ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๕ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจึงตาม แผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ๔. ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้ให้บริการที่ภายในและภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๕ เมื่อ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้พิจารณาอนุมัติ ปรับแผนงบประมาณรายจ่ายกลางปี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยปรับเพิ่มงบประมาณรายจ่ายจำนวน ๒๑,๘๗๗,๒๐๐ บาท ตามบันทึกที่ สทช ๒๓๐๗/๖๓๐๒ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ และได้รับปรับเพิ่มงบประมาณรายจ่ายสำหรับ การดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. จำนวน ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท รวม งบประมาณหลังปรับแผนทั้งสิ้น ๑๒๔,๓๑๐,๘๐๐ บาท		

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)		วัตถุประสงค์ของ การดำเนินโครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนิน งาน/กิจกรรม/โครงการ	การ ดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ			เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่ กำหนด			
๓	งานสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการ บริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา ในการ ยกระดับความสามารถของประชาชนใน การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากบริการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคม และการวิจัยและ พัฒนา กิจกรรม ๑. การจัดทำแผนการจัดสรรทุนประเภท ต่างๆจากกองทุนวิจัย และพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๕ ๒. ติดตามผลของการนำผลงานการให้ทุน ไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบายวิชาการเชิงการ พัฒนาสังคม ชุมชน และเชิงเศรษฐกิจ/ พาณิชย์ ๓. การดำเนินงานด้านฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการบริหารกองทุนและ คณะกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหารกองทุน ๗ คณะ	ทบ.	๑๘.๗๓๘๘	๑๘.๗๓๘๘	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหาร กองทุนวิจัยและพัฒนา ในการบริหารและ จัดสรรทุนวิจัยและพัฒนา ตามที่กฎหมาย กำหนด			✓			๑๑.๖๗	✓		๑. จำนวนนโยบายและแผนการ จัดสรรทุนประเภทต่างๆ จากกองทุน วิจัยและพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ แผน ๒. ร้อยละความพึงพอใจของ คณะกรรมการบริหารกองทุนและ คณะกรรมการฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตาม แผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-		
๓	งานการสนับสนุนและสร้างเครือข่ายความ ร่วมมือระหว่างประเทศในการกำกับดูแล กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคม	ตย.	๑๑๑.๒๒๖๗	๑๑๑.๒๒๖๗*	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ประเทศในการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม			✓			๘๐.๐๐	✓		๑. จำนวนการประชุมระหว่าง ประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ ที่สำนักงาน กสทช. ส่วนงานเข้าร่วม จำนวน ๕๗ ครั้ง ๒. จำนวนเอกสารข้อเสนอของ สำนักงาน กสทช. ที่เสนอต่อที่ประชุม ระหว่างประเทศ จำนวน ๑ เรื่อง ๓. จำนวนการเป็นเจ้าภาพการ ประชุมระหว่างประเทศในระดับ ทวิภาคีประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔ ครั้ง ๔. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตาม แผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้บางการประชุมต้องเลื่อนหรือยกเลิกการประชุม ทั้งนี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นแบบ ออนไลน์ และรูปแบบ Hybrid แทน	ได้ปรับลดงบประมาณรายจ่ายสำหรับการ ดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. จำนวน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท และตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้พิจารณาอนุมัติปรับแผน งบประมาณรายจ่ายกลางปี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยปรับเพิ่มประมาณรายจ่าย จำนวน ๒๒,๓๓๒,๐๐๐ บาท ตามบันทึกที่ สทช ๒๑๐๑/ ว.๓๑๐.๐๒ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ เนื่องจากงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้รับจัดสรรคงเหลือไม่เพียงพอกับ แผนที่กำหนด และมีกิจกรรมการเข้าร่วมประชุม ระหว่างประเทศนอกเหนือจากแผนการ ดำเนินงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ รวมงบประมาณหลังปรับแผนที่สิ้น ๑๘๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท	
๓	โครงการการสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่ง สมาชิกสภาบริหารของสหภาพ โทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)	ตย.	๒๐.๕๔๘๘	๒๐.๕๔๘๘*	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภา บริหารของ ITU โดยดำเนินกลยุทธ์การหา เสียง ขอเสียง แลกเสียงอย่างเต็มที่ เพื่อให้ ประเทศไทยได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิก สภาบริหารอีกวาระหนึ่ง เพื่อสร้างความ ร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการพัฒนา และปรับปรุงการใช้ประโยชน์จากกิจการ โทรคมนาคม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน การให้ความช่วยเหลือด้านโทรคมนาคมแก่ ประเทศกำลังพัฒนา			✓			๙๐.๐๐	✓		๑. ผลการเลือกตั้ง (Vote) ๓ ใน ๑๓ ประเทศ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่ กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๕ เมื่อ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้พิจารณาอนุมัติ ปรับแผนงบประมาณรายจ่ายกลางปี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยปรับลดงบประมาณรายจ่าย โครงการฯ จำนวน ๒,๕๘๗,๕๐๐ บาท คงเหลือ งบประมาณหลังปรับแผนที่สิ้น ๘๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามบันทึกที่ สทช ๒๑๐๑/ว.๓๑๐.๐๒ ลง วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ เนื่องจากการปรับลด เงินสนับสนุนคณะทำงานคนนอก จากจำนวน ๑๐ คน คงเหลือจำนวน ๔ คน (จาก ๓ หน่วยงาน)	

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)		วัตถุประสงค์ของ การดำเนินโครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/ กิจกรรม/โครงการ	การ ดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ			เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่ กำหนด			
๓	โครงการพัฒนาระบบจัดการโครงการ กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ สำนักงาน กสทช. (ระยะที่ ๒)	ทบ.	๑.๙๙๘	๑.๙๙๘	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อพัฒนาระบบรายงานการติดตามสัญญา การให้ทุนวิจัยและพัฒนาฯ และรองรับการ บันทึกข้อมูลการขอทุนฯ จากช่องทางอื่นๆ และข้อมูลงบประมาณที่เปิดให้ทุนฯ ตาม วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ			✓						๑. จำนวนระบบจัดการโครงการ กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่ กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากใน ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้มีผู้ยื่นข้อเสนอยื่นราคาที่สูงกว่า ราคากลางที่ได้รับอนุมัติ จึงยกเลิกการประกวดราคา ดังกล่าว และดำเนินการประกวดราคาใหม่เพื่อให้ผลการ ประกวดราคาฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง		
๓	โครงการจ้างตรวจสอบวิเคราะห์ความ มั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ	นบ.	๒.๘๘๘	๑.๘๘๘	ปี ๒๕๖๔ (๒.๓๑๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อประเมินหาความเสี่ยงที่เกิดจากช่องโหว่ ที่ค้นพบของระบบสารสนเทศ และทดสอบ เพื่อหาช่องทางในการเจาะเข้าถึงเครือข่าย และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สำนักงาน กสทช.				✓					๑. จำนวนผลการศึกษาและ ข้อเสนอแนะฯ จำนวน ๑ ฉบับ ๒. จำนวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ จำนวน ๑ ครั้ง ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่ กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	-		
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์	นบ.	๒๐.๐๐๐	๑๐.๐๐๐	ปี ๒๕๖๖ (๑๐.๐๐๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวม วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลที่อยู่บนเครือข่าย เว็บและโซเชียลมีเดียให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เท่า ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงรองรับการทำงานจากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถ ในการรวบรวม วิเคราะห์ จัดเก็บข้อมูล พื้นที่ เก็บข้อมูล เพิ่มขึ้น และมีจำนวนสิทธิการใช้งาน เพียงพอรองรับกับความต้องการ				✓					๑. จำนวนระบบตรวจสอบและ วิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์ จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่ กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-		
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร จัดการข้อมูลกลางเพื่อช่วยวิเคราะห์ และ แสดงผลในลักษณะ Data Visualization	นบ.	๔.๙๙๖	๔.๙๙๖	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบฯ และจัดหา สิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับสร้างรายงาน เพิ่มเติม ให้สามารถนำเข้าสู่ข้อมูลและการ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติแบบรวมศูนย์ โดยมี เครื่องมือเพื่อเข้าถึงรายงาน ให้สามารถช่วย แสดงผลในลักษณะของ Data Visualization ในมุมมองภาพรวมของข้อมูลตามภารกิจ (Generalization) และข้อมูลเชิงลึกในแต่ละ มิติที่ต้องการวิเคราะห์และช่วยแสดงให้เห็น ถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลสำนักงาน กสทช.			✓						๑. จำนวนระบบบริหารจัดการข้อมูล กลางเพื่อช่วยวิเคราะห์ และแสดงผล ในลักษณะ Data Visualization จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่ กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-		
๓	โครงการระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์แบบ สื่อสารหลากหลายช่องทาง Omni-Channel Contact Center	นบ.	๑๗.๐๓๐	๖.๘๑๒	ปี ๒๕๖๖ (๑๐.๒๑๘)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อให้บริการติดต่อสื่อสารของ ประชาชนหรือหน่วยงานภายนอกจาก หลากหลายช่องทางให้เป็นหนึ่งเดียว (Omni-channel) ผ่านระบบของศูนย์ Call Center ๑๒๐๐ และเพิ่มประสิทธิภาพในการ ให้บริการแก่ประชาชนหรือหน่วยงาน ภายนอก ทั้งในด้านการค้นหาข้อมูล การ ตอบสนอง การติดตามเรื่องร้องเรียนต่างๆ สร้างความพึงพอใจและประสบการณ์ที่ดีของ ประชาชน (Customer Experience)			✓						๑. จำนวนระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ แบบสื่อสารหลากหลายช่องทาง Omni-Channel Contact Center จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่ กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-		
๓	โครงการเสริมความพร้อมไปสู่อองค์กร ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization)	นบ.	๑๐.๕๑๔	๕.๘๑๔	ปี ๒๕๖๖ (๔.๙๖๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อประเมินผลการบริหารจัดการข้อมูลตาม ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงาน กสทช. พร้อมทั้งยกระดับให้มีกระบวนการ ทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมี แผนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ข้อมูลที่ดีของสำนักงาน กสทช. เพื่อไปสู่อ องค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization)			✓						๑. จำนวนรายงานผลการบริหาร จัดการข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูล ภาครัฐของสำนักงาน กสทช. จำนวน ๑ ฉบับ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่ กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-		
๓	โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบ เนื้อหาการและสิ่งผิดกฎหมายจากการ ออกอากาศทางโทรทัศน์ จำนวน ๑ ระบบ	นบ.	๑๘.๕๐๐	๑๘.๕๐๐	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบเนื้อหา รายการและสิ่งผิดกฎหมายจากการ ออกอากาศทางโทรทัศน์			✓							๑. จำนวนระบบการตรวจสอบเนื้อหา รายการและสิ่งผิดกฎหมายจากการ ออกอากาศทางโทรทัศน์ จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่ กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	เนื่องจากได้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดโครงการตาม ขอบเขตของงาน (TOR) แล้วพบว่า โครงการพัฒนาระบบ การตรวจสอบเนื้อหาการและสิ่งผิดกฎหมายจากการ ออกอากาศทางโทรทัศน์ จำนวน ๑ ระบบ มีความซับซ้อน กับโครงการวิจัยและพัฒนาตรวจสอบและกำกับดูแล ผู้ประกอบการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ของ สำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา (ทบ.) จึงดำเนินการยกเลิก โครงการดังกล่าว โดยได้รับการอนุมัติให้ยกเลิกโครงการ จาก รสทช. (ยก.) ตามบันทึก ส่วนที่ ๘๓๒ ที่ สทช. ๒๐๑๐/๑๑๑๒ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕	ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๕ เมื่อ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้พิจารณาอนุมัติ การยกเลิกดำเนินการโครงการฯ และได้ ดำเนินการส่งคืนงบประมาณทั้งหมดแล้ว จำนวน ๑๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)		วัตถุประสงค์ของ การดำเนินโครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ	การ ดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ			เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่ กำหนด			
๓	โครงการความร่วมมือการผลิตข้าวในพระราชสำนัก และการถ่ายทอดผลงานพระราชพิธี และวีดิทัศน์สำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	ปส.	๑๕.๐๐๐	๑๕.๐๐๐	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อให้ผู้รับอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เผยแพร่ข่าวในพระราชสำนักโดยมีเนื้อหาและรูปแบบเดียวกันอย่างเหมาะสม และสอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีถือโอกาสให้ผู้รับอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์สามารถเชื่อมโยงหรือนำเอารายการข่าวในพระราชสำนักมาเผยแพร่ได้อย่างทั่วถึง			✓				สำนักงาน กสทช. และ สำนักงานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) เรื่อง ความร่วมมือการผลิตข่าวในพระราชสำนัก และการถ่ายทอดผลงานพระราชพิธี และวีดิทัศน์สำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ แล้วเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยระบุเนื้อหาสาระว่าดำเนินการจัดทำรายการจะยึดเงื่อนไขการจ่ายเงิน แบบรายวันที่ข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ให้ชัดเจน เสนอให้คณะทำงานลับกรรงร่างของงานการจัดหาพัสดุของสำนักงาน กสทช. ครั้งที่ ๑ พิจารณาเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายงบประมาณกรณีการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ตามข้อสังเกตข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	๕๕.๐๐	✓	๑. ร้อยละความสำเร็จการดำเนินโครงการความร่วมมือการผลิตข่าวในพระราชสำนัก และการถ่ายทอดผลงานพระราชพิธี และวีดิทัศน์สำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ตามข้อสังเกตข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๒. จำนวนการถ่ายทอดผลงานราชพิธีที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจฯ จำนวน ๕ งาน ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากต้องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงิน แบบรายวันที่ข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ให้ชัดเจนเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายงบประมาณกรณีการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	
๓	โครงการความร่วมมือการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดสด เพื่อดำเนินการถ่ายทอดสดและรายงานข่าวการแข่งขันทennis กีฬาเอเชียนเกมส์ ๒๐๒๒	ปส.	๑๗.๕๐๐	๑๗.๕๐๐	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อดำเนินการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดสดและรายงานข่าวการแข่งขันทennis และกิจกรรมที่สำคัญของประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางในการจัดการถ่ายทอดสด และรายงานข่าวการแข่งขันทennis และกิจกรรมที่สำคัญของประเทศไทย และรายงานข่าวการแข่งขันทennis เอเชียนเกมส์ ๒๐๒๒ ในประเทศไทยผ่านการบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทำไปหรือกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ ที่ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายในประเทศไทย			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการขอความอนุเคราะห์เพื่อดำเนินการตรวจสอบร่าง ข้อตกลงความร่วมมือเพิ่มเติม เรื่อง การบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดสด เพื่อดำเนินการถ่ายทอดสดและรายงานข่าวการแข่งขันทennis เอเชียนเกมส์ ๒๐๒๒ ตามบันทึกที่ สทช ๒๓๐๔/๒๒๗๓ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕	๙๐.๐๐	✓	๑. ร้อยละความสำเร็จของประชาชนสามารถรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแข่งขันทennis เอเชียนเกมส์ ๒๐๒๒ ได้อย่างทั่วถึง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ได้เลื่อนการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ๒๐๒๒ จากวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นระหว่างวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖ - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ ทำให้ต้องเลื่อนแผนการดำเนินงานออกไปตามกำหนดการแข่งขัน		
๓	โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและจัดเก็บข้อมูลตามพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินสำหรับการส่งเสริมบริการอย่างทั่วถึง	ขส.	๑๐.๐๐๐	๑๐.๐๐๐	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อสำรวจและจัดเก็บข้อมูล ตามพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดิน รวมถึงศึกษาวิเคราะห์ ข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการสื่อสัญญาณโทรทัศน์ในพื้นที่เป้าหมาย			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ประกอบด้วย รายงานผลการสำรวจ การวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการสื่อสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลตามพื้นที่เป้าหมาย จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ จุด	๗๐.๐๐	✓	๑. รายงานการสำรวจตามพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดิน จำนวน ๑ ฉบับ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-		
๓	โครงการศึกษาและพัฒนาบุคลากรสื่อด้าน "สื่อสังคมยุคใหม่กับการเคลื่อนไหวทางสังคมของประเทศไทย"	ขส.	๔.๗๖๖	๔.๗๖๖	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	๑. เพื่อศึกษารูปแบบ ลักษณะ และสื่อกลางของเครือข่ายทางสังคม ที่มีการเคลื่อนไหวในสื่อสังคมยุคใหม่ในประเทศไทย และสำรวจลักษณะการเคลื่อนไหวทางสังคม ในสื่อสังคมยุคใหม่ในประเทศไทย ๒. เพื่อศึกษาและออกแบบเนื้อหา สื่อสังคมยุคใหม่กับการเคลื่อนไหวทางสังคมที่มีความเหมาะสมสำหรับการพัฒนาผู้ประกอบการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตใบอนุญาตของสำนักงาน กสทช. และกลุ่มผู้ประกอบการสื่อใหม่ ๓. เพื่อจัดทำหลักสูตรด้าน "สื่อสังคมยุคใหม่กับการเคลื่อนไหวทางสังคม" ที่มีความเหมาะสมสำหรับการพัฒนาผู้ประกอบการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตใบอนุญาตของสำนักงาน กสทช. และกลุ่มผู้ประกอบการสื่อใหม่สำหรับใช้ในการพัฒนาบุคลากรในปีต่อไป			✓			ได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๒ แล้วเสร็จ ประกอบด้วย รายงานผลการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) แนวคิด ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับ "สื่อสังคมยุคใหม่กับการเคลื่อนไหวทางสังคม" รายงานรูปแบบลักษณะและสื่อกลางของเครือข่ายทางสังคมที่มีการเคลื่อนไหวในสื่อสังคมยุคใหม่ในประเทศไทย และรายงานผลการรวบรวมข้อมูลของสื่อกระแสหลักภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน กสทช. ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๓ อาทิ รายงานผลการสำรวจทัศนคติ และพฤติกรรมในการเคลื่อนไหวทางสังคม และการจัดทำและนำเสนอเนื้อหาสื่อสังคมยุคใหม่กับการเคลื่อนไหวทางสังคม เป็นต้น	๘๐.๐๐	✓	๑. รายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๑ ฉบับ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-		
๓	โครงการระบบตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายจากการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ระดับภูมิภาค ระยะที่ ๒	บส.	๑๓๐.๐๐๐	๖๕.๐๐๐*	ปี ๒๕๖๔ (๘๓.๓๓๔) ปี ๒๕๖๖ (๒๑.๖๖๖) (๒๑.๖๖๖)	ม.ค.-๖๔	ธ.ค.-๖๖	เพื่อชำระระบบตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายจากการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ระดับภูมิภาค เพิ่มเติม เพื่อให้มีเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบเนื้อหาโฆษณาที่ผิดกฎหมาย ที่มีการออกอากาศผ่านสถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศน์		✓				ได้รับอนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางจาก ลสทช. แล้วเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ และได้ดำเนินการส่งเรื่องไปยังสำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (บย.) ตามบันทึกที่ สทช ๒๓๑๒/๑๒๕๙๔ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการจัดจ้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๐.๐๐	✓	๑. จำนวนระบบตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายจากการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ระดับภูมิภาค ระยะที่ ๒ จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ ได้พิจารณาอนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยปรับแผนงบประมาณรายจ่ายโครงการฯ ให้สอดคล้องกับระยะเวลาดำเนินการจริง โดยไม่กระทบกับกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้รับอนุมัติจาก กสทช. แล้วจำนวน ๑๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยปรับแผนงบประมาณตามเอกสารที่สำนักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ ๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๖๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๒. ผู้กัณฑ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๓. ผู้กัณฑ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)		วัตถุประสงค์ของ การดำเนินโครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนิน งาน/กิจกรรม/โครงการ	การ ดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ		
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ			เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่ กำหนด					
๓	โครงการสร้างความตระหนักรู้ภัยคุกคามทางไซเบอร์	ตท.	๒.๐๐๐	๒.๐๐๐	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ในชาติประจำวันให้กับเยาวชน รวมทั้งสร้างลักษณะนิสัยในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในทางที่ถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น					✓			๑๐๐.๐๐	✓		๑. จำนวนการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ภัยคุกคามทางไซเบอร์ จำนวน ๑ หลักสูตร ๒. กิจกรรมให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ภัยคุกคามทางไซเบอร์ จำนวน ๑ งาน ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-		
๓	โครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้บริการ USO	ตท.	๓.๘๖๙	๓.๘๖๙	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (ค่าธรรมเนียม USO) ในรูปแบบ Web application ที่สามารถทำงานสอดคล้องตามประกาศจัดเก็บรายได้ เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมในปัจจุบัน รวมถึงสามารถบูรณาการฐานข้อมูลที่สามารถใช้ร่วมกับระบบสารสนเทศอื่นๆ ของสำนักงาน กสทช. ที่เกี่ยวข้อง		✓						๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดเก็บรายได้ เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้บริการ USO จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ผู้ยื่นข้อเสนอมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา และได้รับความเห็นชอบจาก พลท. ปก. ลสทช. ให้ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) จึงยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าว และดำเนินการประกวดราคาใหม่เพื่อให้ผลการประกวดราคา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ตามบันทึกที่ สทช.๒๔๐๒/๖๓๓ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕		
๓	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม	ตท.	๑๔๔.๖๓๐	๒๘.๙๒๖*	ปี ๒๕๖๖ (๒๘.๙๒๖) ปี ๒๕๖๗ (๒๘.๙๒๖) ปี ๒๕๖๘ (๒๘.๙๒๖) ปี ๒๕๖๙ (๒๘.๙๒๖) ปี ๒๕๖๖ (๒๘.๙๒๖)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ในการจัดทำรายละเอียดประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนการจัดให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม และเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและบริหารแผนงาน/โครงการภายใต้แผนการจัดให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม		✓							๐.๐๐	✓		๑. (ร่าง) แผนปฏิบัติการ/แผนงาน/โครงการฯ จำนวน ๑ แผน ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้เห็นชอบต่อแผนการจัดให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๕) ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี และตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้มีการปรับลดงบประมาณโครงการฯ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของงานฯ (TOR) จึงจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุง TOR ให้มีความสอดคล้องกับมติที่ประชุมดังกล่าว	ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้พิจารณาอนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายกลางปี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยปรับลดงบประมาณรายจ่ายโครงการฯ จำนวน ๒๕,๘๘๙,๑๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังปรับแก้ที่สิ้น ๔,๓๓๘,๘๐๐ บาท ตามบันทึกที่ สทช.๒๑๐๑/ว.๓๒๐.๐๒ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕
๓	โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ("แทนบัตร") ระยะที่ ๓	จท.	๕.๐๐๐	๕.๐๐๐	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ("แทนบัตร") ตามนโยบายส่งเสริมการกำหนดมาตรฐานและกระบวนการในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยระบบดิจิทัล โดยใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยระบบอัตลักษณ์ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม รวมถึงสามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ของประเทศได้		✓						๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบตรวจสอบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ("แทนบัตร") ระยะที่ ๓ ได้ดำเนินการตรวจรับมอบระบบเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามบันทึกที่ สทช.๒๔๐๔/๘๗๖ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยคณะทำงานพิจารณาการส่งโครงการทางเทคนิคในไลอ้อนสแตนด์และการสื่อสารของสำนักงาน กสทช. ได้มีข้อสังเกตให้โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ("แทนบัตร") ระยะที่ ๒ พัฒนาและส่งมอบงานเป็นที่แล้วเสร็จ จึงจะเริ่มดำเนินการสัญญาสำหรับงานระยะที่ ๓ ได้ต่อไป		
๔	งานการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ กสทช.	ตบ.	๑๐๓.๐๖๓	๑๐๓.๐๖๓*	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ภายใต้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย		✓						๕๐.๐๐	✓		๑. ร้อยละความพึงพอใจของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ต่อการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการฯ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	เนื่องจากมีการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายกลางปี ๒๕๖๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ต้องการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการฯ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้พิจารณาอนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายกลางปี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยปรับลดงบประมาณรายจ่ายโครงการฯ จำนวน ๕๕,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังปรับแก้ที่สิ้น ๔๗,๙๖๓,๒๐๐.๐๐ บาท ตามบันทึกที่ สทช.๒๑๐๑/ว.๓๒๐.๐๒ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕	
๔	งานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนโยบายและการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์	วช.	๓๑.๐๕๕๔	๓๑.๐๕๕๔*	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์		✓						๕๗.๐๐	✓		๑. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร หลักสูตรกลางโดยสถาบันวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้พิจารณาอนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายกลางปี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยปรับเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน กสทช. หลักสูตรเฉพาะทางตามข้อเสนอความจำเป็นของคณะสายงาน จำนวน ๑,๑๐๐,๘๐๐ บาท และปรับลดค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๗,๘๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายในการจัดงานสัมมนาวิชาการ กสทช. ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๖๒,๕๐๐ บาท รวมงบประมาณหลังปรับแก้ที่สิ้น ๔๐,๒๘๕,๑๐๐ บาท	

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)		วัตถุประสงค์ของ การดำเนินโครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ	การ ดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ			เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่ กำหนด			
๔	งานสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน	ตบ.	๖.๘๑๑๓	๖.๘๑๑๓	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการงานสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ดังนี้ ๑. ดำเนินการสนับสนุนงานเลขานุการและการประชุมให้กับคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ซึ่งมีการจัดประชุมแล้วเสร็จ จำนวน ๙ ครั้ง ๒. ดำเนินการสนับสนุนข้อมูลการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของสำนักงาน กสทช. จากหน่วยงานรับตรวจ ได้แก่ สำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา (ทบ.) สำนักการคลัง (อบ.) สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (ทอ.) และ สำนักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ (ยง.) และสำนักต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๓. ดำเนินการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของสำนักงาน กสทช. และสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค เขต ๓๔ (เชียงราย) เขต ๓๕ (ประจวบคีรีขันธ์) และเขต ๓๖ (พระนครศรีอยุธยา) ๔. สนับสนุนดำเนินการจ้างตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับแผนการดำเนินงานจ้างตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๕ จากวิธีคัดเลือกเป็นการเสนอราคาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้มีความเหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป	๗๕.๐๐	✓		๑. จำนวนงาน กิจกรรมการสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ งาน ๒. ร้อยละความพึงพอใจของคณะกรรมการตรวจสอบภายในต่อการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	
๔	งานสนับสนุนภารกิจพัฒนาระบบการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ ของสำนักงาน กสทช.	ยย	๒๗.๒๐๐๓	๒๗.๒๐๐๓*	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ ของสำนักงาน กสทช. การเสนอแนะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ และการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนของหน่วยงานฯ			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด อาทิ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ประจำปี การจัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ รายไตรมาส เสนอ ลสทช. เพื่อทราบ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจเงินไปจ่ายต่อไป และการดำเนินการด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน กสทช. โดยได้พัฒนาระบบงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน กสทช. และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ตลอดจนได้ดำเนินการจัดทำแผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	๔๑.๖๑	✓		๑. รายงานและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/แผนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ แผน ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้พิจารณาอนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายกลางปี ประจำปี ๒๕๖๕ จากจำนวน ๒๗,๒๐๐,๖๐๐ เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๓๗,๘๑๑,๓๐๐ บาท	
๔	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบงานการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช.	ยย	๔.๘๖๐	๑.๓๖๔*	ปี ๒๕๖๖ (๓.๘๕๖)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อศึกษานำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช. และพัฒนาระบบติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Monitoring)			✓		ยกเลิกดำเนินการ	-	-		๑. ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช. จำนวน ๑ ฉบับ ๒. จำนวนระบบติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Monitoring) จำนวน ๑ ระบบ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจึงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	รศทช. (ก.) ปก. ลสทช. ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตัดท้ายวันที่คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ โดยวิธีคัดเลือก ส่วนที่ ๒ สทช. ๒๕๐๑/๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยยกเลิกโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช. โดยวิธีคัดเลือก เนื่องจากเมื่อครบกำหนดการยื่นข้อเสนอในงานจ้างที่ปรึกษาฯ ดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ จึงเห็นควรยกเลิกโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๒๑ วรรคสอง และที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบตามให้ยกเลิกโครงการดังกล่าว	ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้พิจารณาอนุมัติการยกเลิกดำเนินการโครงการฯ พร้อมทั้งปรับลดงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๘๖๔,๐๐๐ บาท และงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๗,๘๕๕,๖๐๐ บาท และได้ส่งคืนงบประมาณทั้งหมดแล้ว จำนวน ๔,๘๑๑,๖๐๐ บาท	
๔	โครงการติดตามประเมินผลงานในมิติเชิงสังคมโดยใช้ซีพีโมเดล (CIPP Model) สำหรับรายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	วส.	๕.๐๐๐	๓.๗๕	ปี ๒๕๖๖ (๑.๒๕๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อศึกษาวิเคราะห์และติดตามประเมินผลโครงการในมิติทางสังคมของสายงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เสนอต่อระดับนโยบาย			✓		ได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๒ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประกอบด้วย รายงานผลการศึกษาชิ้นกลาง (Interim Report) ในส่วนการประเมินแผนงานและโครงการของปี ๒๕๖๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๓ การจัดทำรายงานผลการศึกษาชิ้นกลาง (Interim Report) ในส่วนการประเมินแผนงานและโครงการของปี ๒๕๖๕ สิ้นสุด ณ ไตรมาส ๑ และ ๒	๓๕.๐๐	✓		๑. จำนวนรายงานและข้อเสนอแนะฯ จำนวน ๑ ฉบับ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจึงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากโครงการฯ ต้องมีการสำรวจข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก ผ่านการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ซึ่งสำนักงาน กสทช. ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน สัมมนา งานฝึกอบรม และอื่นๆ ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล จึงมีข้อกังวลในประเด็นเรื่องการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยได้ดำเนินการสอบถามสำนักกฎหมายกระจายเสียง และโทรทัศน์ (มส.) ซึ่งได้รับความเห็นว่า สำนักงาน กสทช. สามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว (ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล) ไปยังมูลนิธิเพื่อสถาบันฯ เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้รับจ้างที่อยู่ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลได้ โดยต้องจัดทำข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Agreement)		
